




PPM — Портфель проєктів

Огляд системи: навіщо вона, з чого складається і як нею користуються РМ, керівники та РМО.

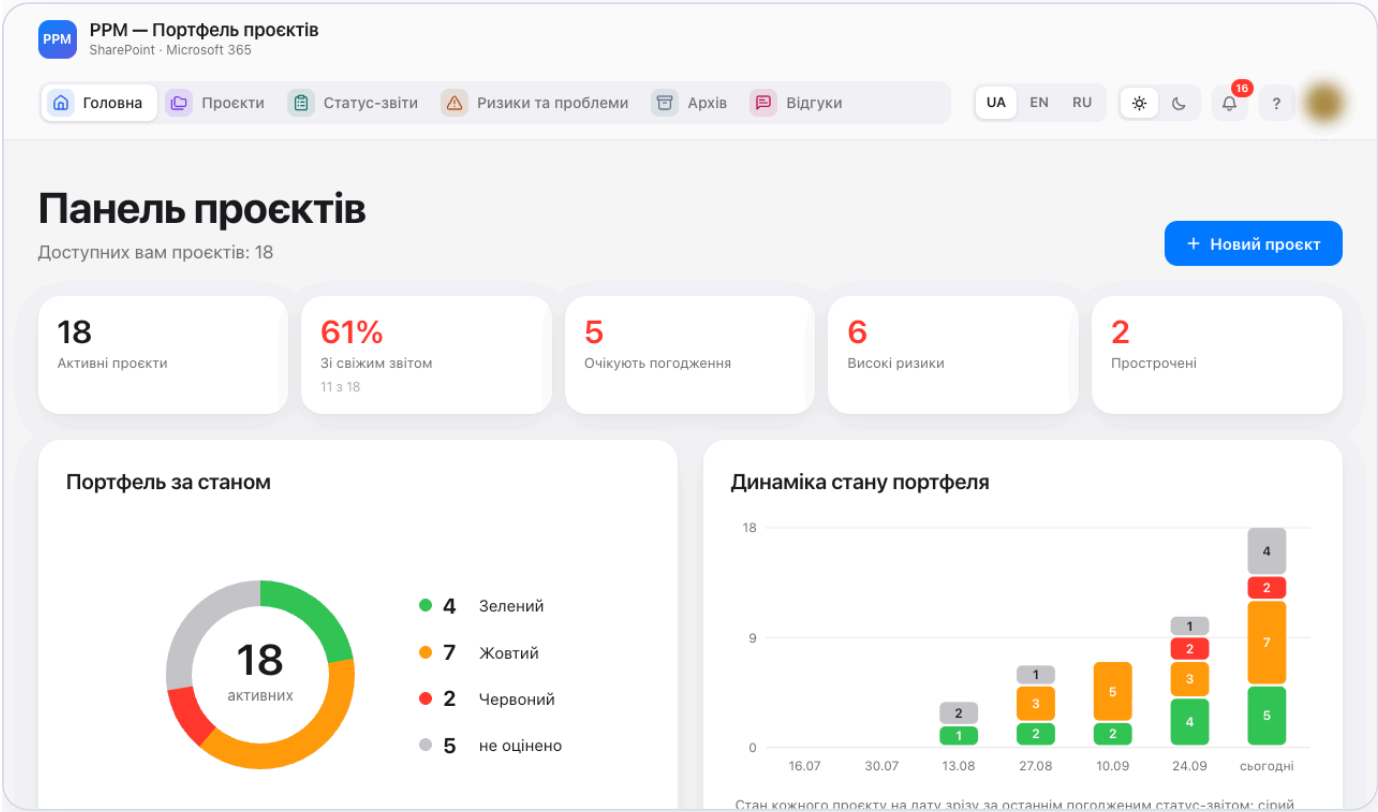

Навіщо

Портфель проєктів — єдине місце, де компанія веде всі проєкти: хто відповідає, у якому вони стані, що змінилося і де потрібне рішення керівництва. Замість таблиць, листів і нарад «що там з проєктом» — одна картка проєкту й регулярний статус-звіт РМ.

Один стан портфеля

Головна: ключові показники, звіти на погодженні (для РМО), проблемні проєкти й проєкти без свіжого звіту, запити на рішення, карта ризиків, зсуви термінів, найближчі запуски, портфель за напрямками.

Зміни — лише через погоджений звіт

Фаза, стан, % виконання, дати й витрати змінюються тільки статус-звітом РМ, який погодив РМО; причина обов'язкова, усе потрапляє в історію. Зміну ключового поля в обхід звіту система повертає назад і записує в історію.

Прозорість для керівництва

Керівник бачить проєкти своїх підлеглих автоматично — за оргструктурою Microsoft 365, без ручного налаштування доступу.

Контроль ризиків

Оцінка «ймовірність x вплив», стратегія реагування, заходи й план дій у разі настання, власник і термін.

Запити на рішення

РМ позначає у звіті «Потрібне рішення керівництва» — запит одразу видно на головній і в окремому поданні.

Сповіщення

Дзвіночок угорі показує, скільки нових подій у ваших проєктах: звіти, погодження, ризики, коментарі; РМО — подання звітів і переходи в архів. Відкрита подія стає прочитаною.

Там, де всі працюють

У браузері на комп'ютері, на телефоні й планшеті, згодом — у Microsoft Teams. Три мови: українська, англійська, російська.

Хто що бачить і що може

Роль	Бачить	Може
РМ проєкту	свій проєкт	редагувати картку (команда, посилання), здавати статус-звіти, вести ризики, коментувати
Керівники РМ (за оргструктурою)	проєкти підлеглих	переглядати й коментувати
Власник, команда проєкту та їхні керівники	проєкти, де роль мають вони або їхні підлеглі	переглядати й коментувати

РМО	усі проєкти	створювати нові проєкти й призначати РМ; погоджувати або повертати статус-звіти (змінює лише оцінки, з коментарем); решту — переглядати й коментувати
Інші співробітники	порожній портал	—

Завершений або скасований проєкт переходить в архів: лише перегляд для всіх, без нових коментарів. Керівника бачать за полем «Керівник» у Microsoft 365: CEO бачить усе, бо CIO — його підлеглий; фінансовий директор — лише проєкти, де роль має він або його підлеглі.

3 чого складається

Система побудована повністю на Microsoft 365 компанії: дані зберігаються в SharePoint, доступ і оргструктура — з Microsoft Entra ID. Зовнішніх сервісів і баз немає.

Користувачі

- браузер на комп'ютері
- телефон і планшет (iOS, Android)
- Microsoft Teams — наступний етап

Застосунок порталу

- головна сторінка сайту SharePoint на весь екран
- головна, проекти, статус-звіти, ризики, архів, картка й форми
- працює від імені користувача — показує лише дозволене

Списки SharePoint

- Проекти, Команда проекту
- Статус-звіти, Погодження звітів
- Ризики та проблеми
- Коментарі
- Зміни показників (журнал)
- Прочитане (сповіщення)
- Еталон показників (службовий)

Користувач → застосунок → списки SharePoint ← синхронізація за розкладом ← оргструктура Microsoft Entra ID

Компонент	Що робить
Застосунок (SharePoint Framework)	Інтерфейс порталу: сторінки, картка проекту, форми статус-звіту, ризику, проекту й коментаря. Перед кожним збереженням перевіряє свіжі дані (змінився РМ, проект в архіві, уже є звіт на погодженні, запис змінів інший користувач) і пояснює, чому збереження не відбулося. Збережене видно одразу; відкрита сторінка сама оновлює дані при поверненні на вкладку і кожні 5 хвилин.
Списки SharePoint	Усі дані порталу. Звичайні списки лишаються для адміністраторів, вивантаження в Excel і Power BI.
Синхронізація	Кожні 15 хвилин: застосовує лише звіти, погоджені рішенням РМО, і переносить їх у картку; повертає звіти на погодженні при зміні РМ або переході в архів; повертає ключові поля, змінені в обхід звіту; веде журнал змін, відправляє завершені й скасовані проекти в архів, видає права за оргструктурою, оновлює «Доступ до картки». Раз на тиждень — повний перерахунок прав. Працює в Azure Automation (з 04.10.2026); також веде рядки «Прочитане» для сповіщень.
Microsoft Entra ID	Облікові записи, керівники, посади — джерело прав за ієрархією.
Відгуки (лише тест)	Сторінка «Відгуки» з кнопкою «Залишити відгук» (текст, скриншоти, пристрій): усі бачать усі зауваження, статус розгляду й відповідь розробників.

Ключові правила


- Загальний стан звіту** — найгірша з трьох оцінок (терміни, бюджет, ресурси): хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений. Стан проекту — за останнім звітом.
- Ключові показники** (фаза, стан, тип, %, дати, витрати) змінюються лише статус-звітом; зміна фази, типу чи дат вимагає причини.
- Погодження РМО:** у картку потрапляє лише звіт, погоджений рішенням РМО; по проекту — лише один звіт на погодженні; при зміні РМ або переході в архів звіт на погодженні повертається

автоматично з коментарем. РМО може змінити лише оцінки або повернути звіт — в обох випадках з коментарем.


- **«Завершено» або «Скасовано»** у погодженому звіті → проєкт у «Архів», лише перегляд; що проєкт скасовано, видно у звіті.
- **Оцінка ризику** = ймовірність × вплив (1–25): 15–25 високий, 8–14 середній, 1–7 низький.
- **Свіжість звіту:** до 8 днів — зелений, 9–14 — жовтий, понад 14 — червоний (підказка — при наведенні на крапку).
- **Історія:** кожна зміна — «було → стало», хто, коли і чому.
- **Введення:** суми — у доларах США (\$) без перерахунку; дати — дд.мм.рррр (крапки ставляться самі) або календар; дата подання звіту — день збереження, період — з останнього погодженого звіту; % виконання — від 0 до 100; назва проєкту — унікальна.

Головна

Стан портфеля за видимими користувачу проектами (без архіву). Угорі — **смуга показників**: активні проекти, частка зі свіжим звітом, звіти на погодженні (для РМО), високі ризики, прострочені проекти; кожен показник відкриває відфільтрований список. Для РМО показник «Очікують погодження» відкриває «Статус-звіти → Відобразити: Очікують погодження» — чергу звітів.

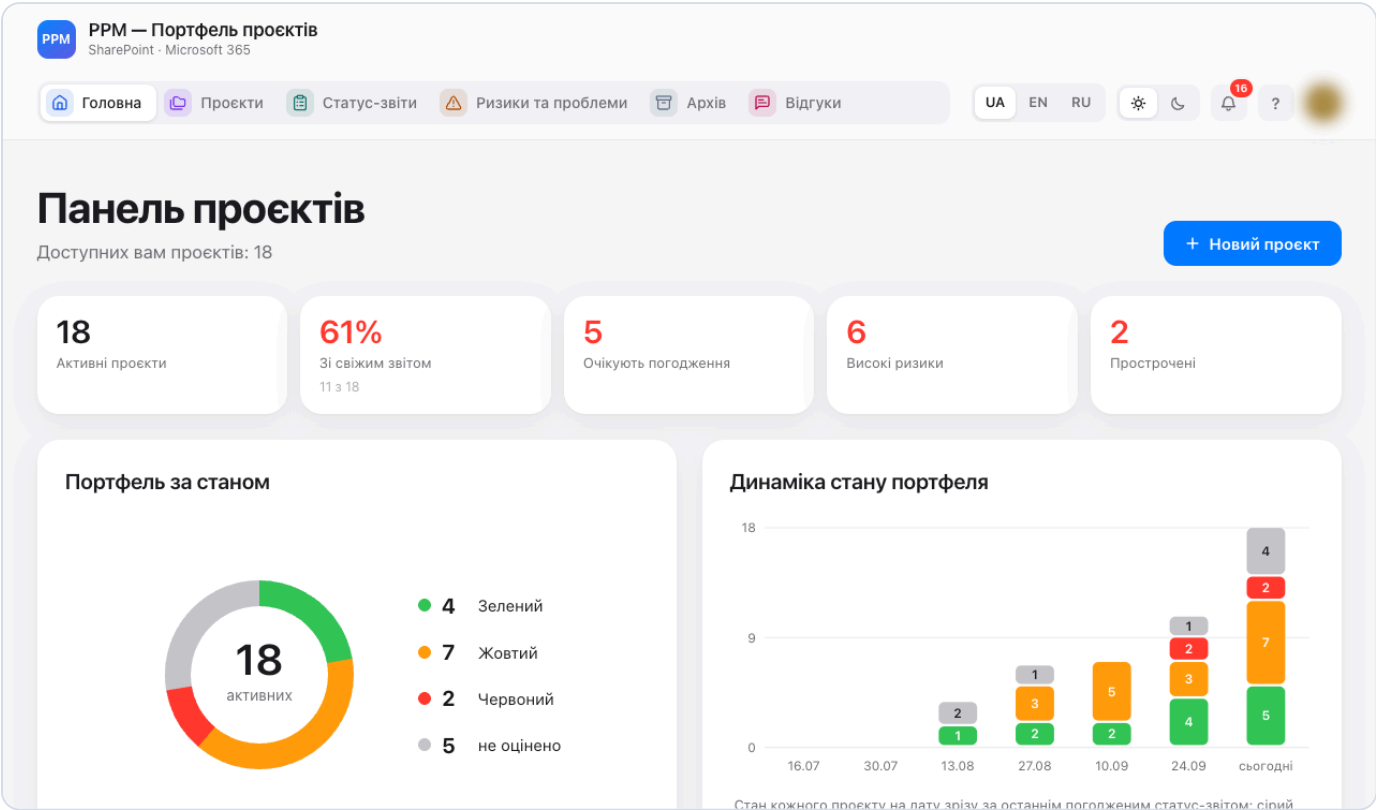

Показники, портфель за станом і динаміка за погодженими звітами: кожен проект від дати створення, сірий — ще без погодженого звіту, число — в кожній частині; стовпець «сьогодні» збігається з кільцем.

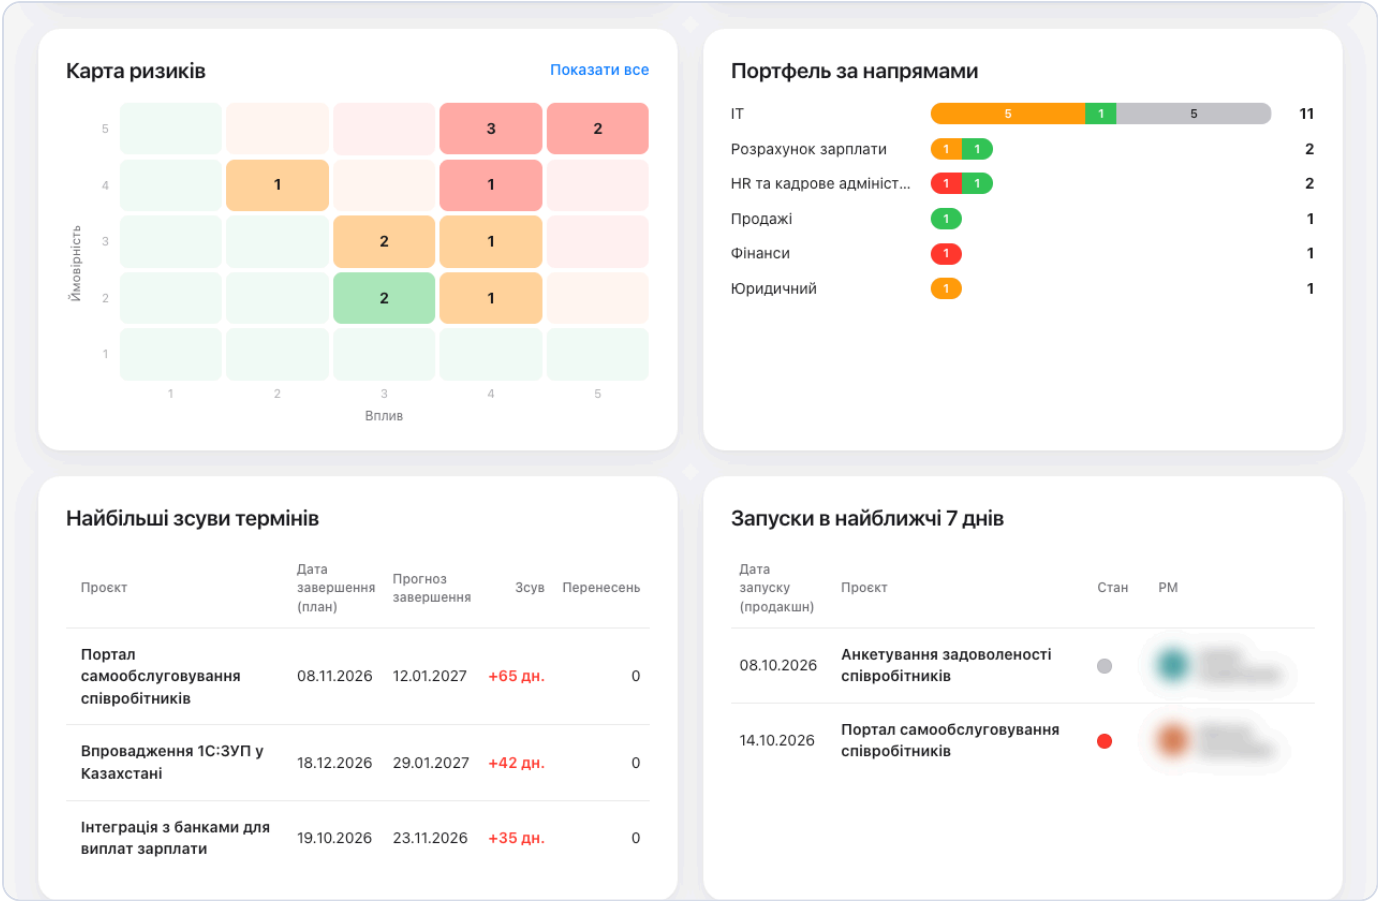

Проблемні проекти

[Показати все](#)

🔍	Р	Назва проекту	Стан	PM	Останній апдейт	Звіт
🔍	⬆️	Портал самообслуговування співробітників	🔴	👤	Інтеграція з ЗУП затримується, бюджет перевищено	19.09.2026 🟢 Погоджено
	⬆️	Автоматизація закриття місяця	🔴	👤	Звірка з контрагентами: підключено першого контрагента	08.10.2026 🟢 Погоджено
🔍	⬆️	Автоматизація заявок на відрядження	🟡	👤	Роботи за планом	06.10.2026 🟢 Погоджено
🔍	=	Модернізація серверної	🟡	👤	Залучено додаткове фінансування	02.10.2026 🟡 На погодженні 08.10.2026
	⬆️	Впровадження MDM-системи для пристроїв Apple	🟡	👤	Обрано постачальника MDM, підписано договір	01.10.2026 🟢 Погоджено
	⬆️	Інтеграція з банками для виплат зарплати	🟡	👤	Роботи призупинено: бракує ресурсів	25.09.2026 🟡 На погодженні 08.10.2026
	=	Електронний документообіг з клієнтами	🟡	👤	Роботи за планом: етап продовжується	26.09.2026 🟢 Погоджено
	=	Єдиний довідник клієнтів	🟡	👤	Уточнено вимоги до інтеграції	28.09.2026 🟢 Погоджено
	=	Кадровий облік у хмарі для Казахстану	🟡	👤	Перший модуль запущено в пілот	02.10.2026 🟢 Погоджено

Немає свіжого статус-звіту

[Показати все](#)

🔍	Р	Назва проекту	PM	Останній статус-звіт	Фаза проекту
---	---	---------------	----	----------------------	--------------

Нижня частина головної: проблемні проекти, проекти без свіжого звіту (зокрема ті, де звіт ще на погодженні), запити на рішення керівництва й відкриті ризики.

Проекти

Плитки для швидкого огляду або таблиця з сортуванням, фільтрами за значеннями й вибором колонок. «Відобразити»: Усі проекти, Стратегічні, Проблемні, Мої проекти (усі), Я РМ, Немає свіжого звіту, Прострочені. Ширину колонок можна змінити, перетягнувши межу заголовка, — вона запам'ятовується; на телефоні статус-звіти й ризики показуються картками; суми — з пробілами між розрядами. Нові записи — угорі. Колонка «Звіт» — дата останнього погодженого звіту з кольоровою крапкою свіжості (підказка при наведенні), під нею — погодження найновішого звіту; фільтр колонки — за свіжістю й за погодженням («На погодженні», «Повернуто», «Звіти не подавались»). Колонка «Фаза проекту» — етап життєвого циклу. Меню — значки розділів кольором розділу; у кожному бічному вікні — кольорова мітка, що відкрито (Проект, Статус-звіт, Ризик, Проблема, Призначення, Сповіщення, Відгук, Довідка). Фільтри й «Відобразити» скидаються при переході на іншу вкладку; ширина колонок на комп'ютері від фільтрів не змінюється.

PRM

PRM — Портфель проектів

SharePoint · Microsoft 365

Головна

Проекти

Статус-звіти

Ризики та проблеми

Архів

Відгуки

UA

EN

RU

16

?

Проекти

Доступних вам проектів: 18

+ Новий проект

Список

Плитки

Відобразити

Усі проекти

PRJ-023

не оцінено

Аналітика плинності кадрів

Ініціація

0%

Останній апдейт · немає звітів

Planner +1

PRJ-022

не оцінено

Мобільний застосунок для співробітників

Ініціація

0%

Останній апдейт · немає звітів

На погодженні 08.10.2026

Planner

PRJ-021

Жовтий

Автоматизація заявок на відрядження

Реалізація

44%

Останній апдейт · 06.10.2026

Погоджено

Роботи за планом

PRJ-020

не оцінено

Анкетування задоволеності співробітників

Ініціація

0%

Останній апдейт · немає звітів

PRJ-019

Жовтий

Модернізація серверної

Реалізація

10%

Останній апдейт · 02.10.2026

На погодженні 08.10.2026

Завдання додатково фінансування

PRJ-018

не оцінено

Імпорт карт лояльності ЕЛК2

Ініціація

0%

Останній апдейт · немає звітів

На погодженні 08.10.2026

Плитки: номер (PRJ-### — присвоюється автоматично, унікальний), стан, фаза (кольорова мітка) і % виконання, останній апдейт зі світлофором свіжості, РМ.

PPM

PPM — Портфель проектів
SharePoint · Microsoft 365

Головна

Проекти

Статус-звіти

Ризики та проблеми

Архів

Відгуки

UAENRU

16

?

Проекти

Доступних вам проектів: 18

+ Новий проект

СписокПлитки

ВідображатиУсі проектиCSV

Показано 18 з 18

	Назва проекту	PM	Фаза проекту	Стан	Звіт	% виконання	Завершення (план)	Останній апдейт
	Аналітика плинності кадрів		Ініціація		немає звітів	0%	—	—
	Мобільний застосунок для співробітників		Ініціація		немає звітів На погодженні 08.10.2026	0%	07.10.2026	—
	Автоматизація заявок на відрядження		Реалізація		06.10.2026 Погоджено	44%	22.10.2026	Роботи за планом
	Анкетування задоволеності співробітників		Ініціація		немає звітів	0%	30.10.2026	—
	Модернізація серверної		Реалізація		02.10.2026 На погодженні 08.10.2026	10%	03.10.2026	Залучено додаткове фінан
	Імпорт карт лояльності ЕЛК2		Ініціація		немає звітів На погодженні 08.10.2026	0%	—	—

Таблиця: фаза — кольорова мітка, стан — кружечок, «Звіт» — дата, крапка свіжості й мітка погодження; воронка — фільтр, шестерня — колонки, клік по заголовку — сортування.

Картка проекту

Усе про проєкт в одній панелі: посилання (Loop, документи), учасники й **команда проєкту** — хто, яка роль, з яких питань звертатися; терміни з відхиленням прогнозу, бюджет і виконання, історія змін, коментарі, історія станів, статус-звіти, ризики та «Доступ до картки». «Мета та опис» — до 10 рядків, далі «Показати повністю». Посиланням на картку можна поділитися; посилання з картки відкриваються в новій вкладці. Суми — у доларах США. Поки звіт на погодженні, нового звіту подати не можна: «Звіт від ... на погодженні РМО — новий можна подати після рішення». Новий проєкт кілька хвилин «готується», а новопризначений РМ бачить «права редагування з'являться протягом 15 хвилин».

ПРОЕКТ

PRJ-010 - список «Проекты»

×

Інтеграція з банками для виплат зарплати

Звичайний

Жовтий

Реалізація

1 — Високий

Посилання

Loop

Технічне завдання

План-графік

Редагувати проєкт

Звіт від 08.10.2026 на погодженні РМО — новий можна подати після рішення.

Змінити РМ / власника

Статус-звіт від 08.10.2026 на погодженні РМО — картка оновиться після погодження

Погодження звіту

Пряма передача зарплатних відомостей у банки через API замість файлів.

Учасники

РМ

Власник

Команда проєкту

Учасник	Роль	З яких питань звертатися
	Стейкхолдер	—
	Бізнес-замовник	Цілі, пріоритети, бюджет
	Ключовий користувач	Вимоги, тестування, навчання

Шапка картки, поки звіт на погодженні: позначка «на погодженні РМО», кнопки нового звіту немає; тип, стан, фаза, пріоритет, посилання, учасники.

Бюджет і виконання

% виконання

48%

Останній статус-звіт

25.09.2026

Бюджет (план)

Витрати (факт)

Напрямок

Розрахунок зарплати

Історія змін

08.10.2026 16:47

Подання звіту

Погодження

На погодженні

Підключено другий банк у тестовому режимі

Відкрити звіт

28.09.2026 18:45

Редагування картки

Код проєкту

TEST-10 → PRJ-010

Єдина автоматична нумерація проєктів

25.09.2026 12:43

Оновлено статус-звіт

% виконання

45% → 48%

Загальний стан

Червоний → Жовтий


Роботи призупинено: бракує ресурсів

Показати всю історію (6)


Коментарі

Зустріч з керівництвом банку запланована на наступний тиждень.

Бюджет і виконання та історія змін: хто, коли, що змінив і причина.

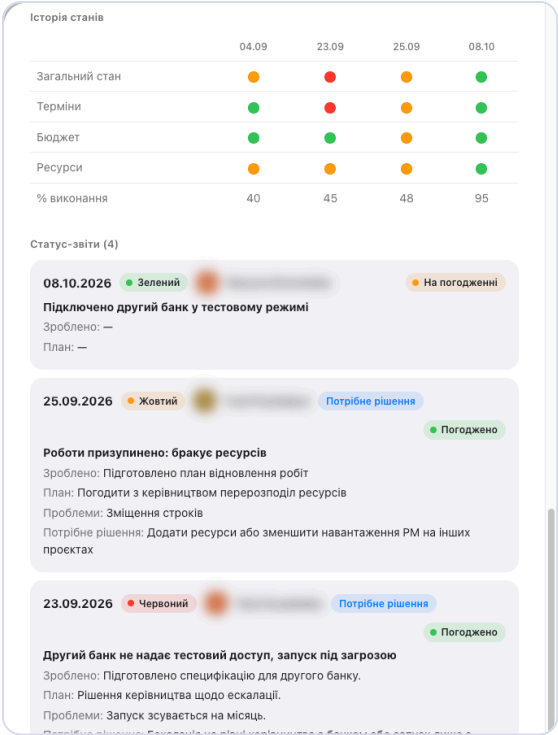


Історія станів за останніми звітами та самі статус-звіти.

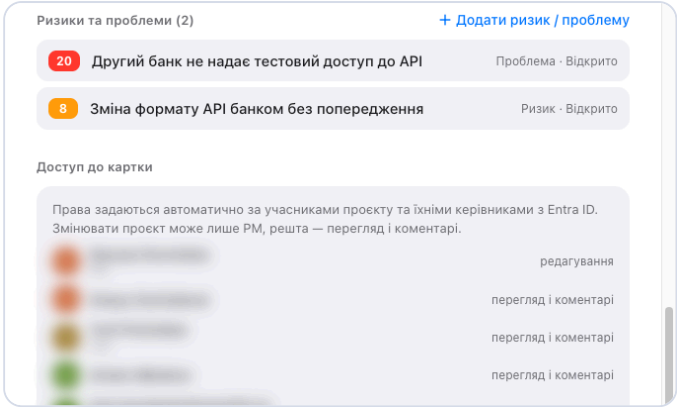

«Доступ до картки»: РМ — редагування, керівники, власник і команда — перегляд і коментарі.

Сповіщення

Дзвіночок угорі показує **число нових подій** ваших проєктів і похитується, поки вони є. Що бачить кожен — за роллю: РМ, власник і команда — створення, «Призначення», рішення РМО щодо звітів, оновлення показників, коментарі; ризики — РМ і власник ризику завжди, власник і команда — лише високі; РМО — подання звітів на погодження й переходи проєктів в архів. Свої дії не показуються, керівники РМ сповіщень не отримують. Відкрита подія стає прочитаною (угорі — «← Сповіщення», повернення до списку), «Позначити все прочитаним» — усі одразу. Листи й стрічка активності Microsoft Teams — наступний етап.

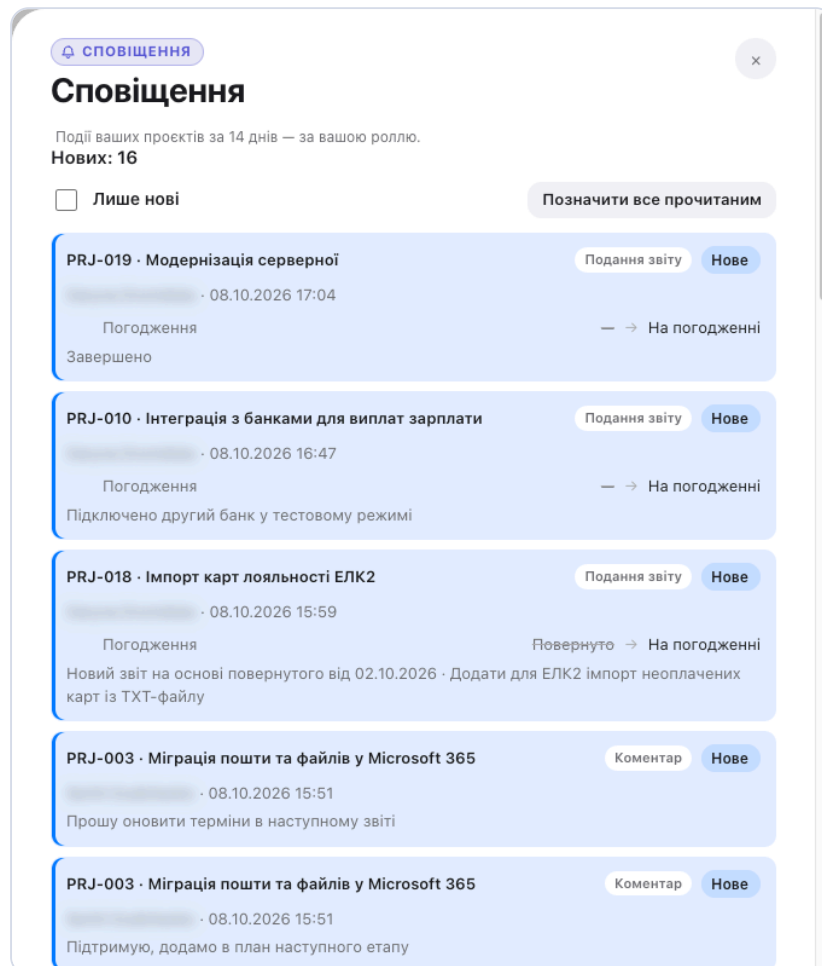

«Сповіщення»: нові події вгорі (блакитні, «Нове»), «Нових: N», «Лише нові» й «Позначити все прочитаним».

Статус-звіт

РМ оцінює терміни, бюджет і ресурси — загальний стан рахується сам. Ключові показники вже заповнені поточними значеннями; змінюється лише те, що змінилося. **Дата подання** — день збереження (не вводиться), **період** рахується сам — з останнього погодженого звіту по дату подання («з ... по ...»). Фаза й тип записуються в кожен звіт. Якщо змінено фазу, тип або дату, з'являється обов'язкова «Причина зміни показників». Дати — дд.мм.рррр або календар; дати запуску й завершення не раніше дати старту; фактичне завершення — не раніше старту й не пізніше дати подання (портал одразу пояснює, з якою датою порівняв); при «Потрібне рішення керівництва» опис рішення обов'язковий; % — ціле число від 0 до 100 (для «Завершено» — 100 автоматично); витрати — у \$. Якщо щось не заповнено, портал підсвічує всі такі поля одразу. Із картки звіт подається саме для цього проєкту; проєкти, де звіт уже на погодженні, у загальній формі недоступні.

СТАТУС-ЗВІТ

список «Статус-звіти»

Новий статус-звіт

Проект *

Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані

Дата подання: 08.10.2026Період: з 02.10.2026 по 08.10.2026

Дата подання — день збереження; період — від останнього погодженого звіту.

Терміни *

ЗеленийЖовтийЧервоний

Бюджет *

ЗеленийЖовтийЧервоний

Ресурси *

ЗеленийЖовтийЧервоний

Загальний стан (розраховується) Жовтий

Найгірша з оцінок: хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений.

Ключові показники

Змінюються лише через статус-звіт — у картку потрапляють після погодження РМО. Кожна зміна потрапляє в історію.

Фаза проєкту

Призупинено

% виконання

88

Тип проєкту

СтратегічнийЗвичайний

Дата старту

02.03.2026

Дата запуску (продакшн)

16.11.2026

Дата завершення (план)

18.12.2026

Прогноз завершення

29.01.2027

Оцінки й розрахунок загального стану.

Ключові показники

Змінюються лише через статус-звіт — у картку потрапляють після погодження РМО. Кожна зміна потрапляє в історію.

Фаза проєкту

Призупинено

% виконання

88

Тип проєкту

СтратегічнийЗвичайний

Дата старту

02.03.2026

Дата запуску (продакшн)

16.11.2026

Дата завершення (план)

18.12.2026

Прогноз завершення

26.02.2027

Причина зміни показників *

Наприклад: перенесення запуску через затримку інтеграції з 1С

Резюме одним рядком *

Наприклад: етап інтеграції завершено, відставань немає

Зроблено за період

План на наступний період

Проблеми та ризики

Ключові показники: змінено дату — потрібна причина.

Що відбувається після збереження

- Одразу:** звіт іде на погодження РМО; у картці — позначка «Статус-звіт ... на погодженні РМО»; картка поки не змінюється, а новий звіт по проєкту не подається, доки РМО не вирішить. Надісланий звіт змінити не можна.
- РМО погоджує** — картка одразу показує новий стан, % виконання, дати й «Останній апдейт»; протягом 15 хвилин синхронізація записує в журнал кожну зміну: було → стало, автор, причина.
- РМО повертає** — картка не змінюється, РМ бачить коментар і здає новий звіт кнопкою «Новий звіт на основі повернутого».
- Запит на рішення** (позначка «Потрібне рішення керівництва») — одразу в блоці на головній і в поданні «Потребують рішення».

5. **«Завершено» або «Скасовано»** — після погодження проєкт отримує цю фазу і дату завершення / скасування, переходить в «Архів»; лише перегляд, без коментарів.
6. **Змінився РМ або проєкт пішов в архів** до рішення РМО — звіт повертається автоматично з коментарем.

Звіт може здати лише чинний РМ проєкту — портал перевіряє це перед збереженням, а синхронізація не застосує звіт іншої людини. Звіт, автор якого вже не РМ, РМО може лише повернути.

Погодження статус-звітів

Кожен статус-звіт погоджує РМО. Звіти, що чекають, — у показнику «Очікують погодження» на головній і у «Статус-звіти» → «Відображати: Очікують погодження».

STATUS-ZBIT PRJ-010 · список «Статус-звіти»

Підключено другий банк у тестовому режимі

Інтеграція з банками для виплат зарплати Дата подання: 08.10.2026

Період: 2 тижні На погодженні

Погодження звіту

РМО змінює лише оцінки. У картку звіт потрапить після погодження.

Терміни * Зелений Жовтий Червоний

Бюджет * Зелений Жовтий Червоний

Ресурси * Зелений Жовтий Червоний

Загальний стан (розраховується) Жовтий

Коментар РМО

Бюджет другого етапу ще не затверджено — жовтий

Погодити зі зміною оцінок Повернути на доопрацювання

Загальний стан	Зелений
Терміни	Зелений
Бюджет	Зелений
Ресурси	Зелений

Що може РМО

- **Погодити** — звіт потрапляє в картку з оцінками РМ.
- **Погодити зі зміною оцінок** — змінити терміни, бюджет чи ресурси; у картку потрапляє оцінка РМО. Коментар обов'язковий.
- **Повернути на доопрацювання** — картка не змінюється, РМ бачить коментар. Коментар обов'язковий.

РМО змінює лише оцінки — тексти, дати й фаза звіту лишаються як у РМ. Рішення РМО — окремий запис, тож це забезпечують права SharePoint, а не лише інтерфейс. Рішення потрапляє в історію змін проєкту: «Погодження звіту», було → стало, коментар.

Вирішений звіт повторно не погоджується; помилку виправляє наступний звіт РМ. Якщо звіт уже вирішив інший РМО — рішення не збережеться, з'явиться пояснення.

Звіт на погодженні: РМО змінив оцінку бюджету — кнопка стала «Погодити зі зміною оцінок», коментар обов'язковий.

Як змінити фазу проєкту

1. РМ у картці — «Додати статус-звіт» (якщо немає звіту на погодженні) → «Ключові показники» → нову «Фазу проєкту».
2. Заповнює «Причина зміни показників», оцінки й резюме → «Зберегти». Звіт іде на погодження.
3. РМО погоджує — фаза в картці змінюється, в історії з'являються «Погодження звіту» і «Оновлено статус-звітом».
4. «Завершено — перенести в архів» або «Скасовано — перенести в архів» — після погодження проєкт отримує фазу «Завершено» або «Скасовано», дату завершення / скасування і переходить в «Архів».

Окремої кнопки «Змінити фазу» немає свідомо: будь-яка зміна фази має причину, погодження і слід в історії.

Ризики та проблеми

Реєстр ризиків і проблем усіх видимих проєктів з оцінкою, **стратегією реагування** (Уникнення, Зниження (пом'якшення), Передача, Прийняття), власником, статусом і терміном. У ризику — «Заходи для зниження ризику» і «План дій у разі настання». Форма ризику рахує оцінку одразу й пояснює кожен бал шкали. Ризики проєктів в архіві — «Відображати: Ризики архівних проєктів» (лише перегляд).

PPM — Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

Головна

Проекти

Статус-звіти

Ризики та проблеми

Архів

Відгуки

UAENRU

16

?

Ризики та проблеми

+ Новий ризик / проблема

Відображати: Високі ризики CSV

Показано 6 з 6

Проект	Ризик / проблема	Тип	Оцінка	Стратегія реагування	Власник ризику	Статус	Термін виконання заходів
Чат-бот для відповідей співробітникам	Не ефективне використання звіту...	Ризик	25	Зниження (пом'якшення)		В роботі	02.10.2026
Єдиний довідник клієнтів	Затримка поставки ліцензій	Ризик	20	—		Відкрито	
Інтеграція з банками для виплат зарплати	Другий банк не надає тестовий доступ до API	Проблема	20	—		Відкрито	29.09.2026
Електронний документообіг з клієнтами	Постачальник ЕДО припиняє роботу	Проблема	25	—		Відкрито	24.10.2026

«Відображати: Високі ризики» — відкриті з оцінкою від 15; колонка «Стратегія реагування»; статус — кольорова мітка (Відкрито, В роботі, Закрито).

✓ Ризик

Проблема

Тип

Опис *

Затримка постачання ліцензій

Ймовірність

1

2

3

4

5

3 — можливо (30–60%)

Вплив

1

2

3

4

5

3 — суттєвий: зсув етапу або перевитрата до 10%

Оцінка

9

Середній (8–14) = 3 × 3

Оцінка = ймовірність × вплив, кожне від 1 до 5. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Власник ризику

Статус

Термін виконання заходів

30.10.2026

Стратегія реагування

Уникнення

✓ Зниження (пом'якшення)

Передача

Прийняття

Заходи для зниження ризику

Резервний постачальник, замовлення за 6 тижнів.

Новий ризик: оцінка $3 \times 3 = 9$ «Середній», стратегія реагування, заходи для зниження ризику і план дій у разі настання.

Як рахується оцінка

Ймовірність і вплив — від 1 до 5, кожен бал має опис (наприклад, 4 — «ймовірно, 60–90%», 5 — «критичний: зрив цілей проєкту»).

Оцінка = ймовірність × вплив. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Прострочений термін відкритого ризику виділяється червоним; закриті ризики зникають з подання «Відкриті».

Статус-звіти й архів

PPM — Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

Головна

Проекти

Статус-звіти

Ризики та проблеми

Архів

Відгуки

UA

EN

RU

16

?

Статус-звіти

+ Новий статус-звіт

Відобразити Очікують погодження CSV

Показано 5 з 5

🔍	📄	📅	Проект	Дата подання	Стан	Терміни	Бюджет	Ресурси	Резюме одним рядком	Автор	Погодження	Потрібне рішення
🔍	📄	📅	Модернізація серверної	08.10.2026	🟢	🟢	🟢	🟢	Завершено		🟡 На погодженні	—
🔍	📄	📅	Інтеграція з банками для виплат зарплати	08.10.2026	🟢	🟢	🟢	🟢	Підключено другий банк у тестовому...		🟡 На погодженні	—
🔍	📄	📅	Імпорт карт лояльності ЕЛК2	08.10.2026	🟡	🟢	🟢	🟡	Додати для ЕЛК2 імпорт неоплачен...		🟡 На погодженні	—
🔍	📄	📅	Мобільний застосунок для співробітників	08.10.2026	🟡	🟡	🟢	🟢	Доопрацювання після тестування		🟡 На погодженні	—
🔍	📄	📅	Чат-бот для відповідей	02.10.2026	🟡	🟢	🟡	🟡	Прототип бота готовий. збираєм...		🟡 На погодженні	—

Черга РМО — «Відобразити: Очікують погодження»: оцінки, резюме (відкриває звіт), автор, погодження, «Потрібне рішення». Інші подання — «Усі звіти», «Потребують рішення».

PPM — Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

Головна

Проекти

Статус-звіти

Ризики та проблеми

Архів

Відгуки

UA

EN

RU

16

?

Архів

Завершені та скасовані проєкти. Лише перегляд. · 5

Список

Плитки

Відобразити Усі проєкти CSV

Показано 5 з 5

🔍	📄	📅	Назва проєкту	Фаза проєкту	РМ	Власник	Дата завершення / скасування	Завершено (факт)	Завершення (план)	Бюджет	Факт
🔍	📄	📅	Звітність для клієнтів у Power BI	Завершено			07.10.2026	01.10.2026	23.11.2026		
🔍	📄	📅	Перехід на нову телефонію	Скасовано			30.09.2026	—	01.10.2026		
🔍	📄	📅	Оновлення сайту компанії	Завершено			30.09.2026	—	—		

Архів: проєкти з фазою «Завершено» або «Скасовано» і датою завершення / скасування, «Відобразити: Завершені / Скасовані», лише перегляд, без коментарів; ризики — у «Ризики архівних проєктів»; навігація як у «Проекти» — список або плитки, «Відобразити», CSV.

Команда, посилання, довідка і відгуки

Учасники

РМ

Власник

РМ і власника змінює лише РМО.
Команда проекту

Стейкхолдер

З яких питань звертати

x

Бізнес-замовник

Цілі, пріоритети, бюдже

x

Ключовий корист

Вимоги, тестування, на

x

+ Додати учасника

Посилання

Loop

https://loop.cloud.microsoft/demo/prj-010

x

Технічне завдання

https://example.com/pmo-demo/prj-010/tz

x

План-графік

https://example.com/pmo-demo/prj-010/plan

x

+ Додати посилання

Після зміни учасників права доступу буде перераховано.

Бюджет і виконання

Форма проекту: команда (учасник, роль — обов'язково, з яких питань звертатися) і посилання (назва, адреса <https://>). Новий проект створює РМО.

ВІДГУК

список «Відгуки»

x

Відгук про портал

Що не так або що покращити? Опишіть, що ви робили і що очікували побачити. Вкажіть, на якому екрані це помітили; пристрій додається сам.
Що не так або що покращити? *

Крок 3.3 («Проекти - Список»): хотілося б бачити у фільтрі колонки «Звіт» кількість проектів біля кожного варіанта.

Скриншоти (0/5)

Додати скриншот

Скриншот можна вставити з буфера: Ctrl+V (Windows) або Cmd+V (Mac).

Надіслати

Скасувати

«Залишити відгук»: зауваження зі скриншотами (вставка з буфера або з галереї телефона); пристрій додається сам.

ДОВІДКА

РРМ — Портфель проектів

x

Довідка

Що це

Портал, де компанія веде всі проекти в одному місці:

- у кожного проекту є **картка**: команда, посилання, терміни, бюджет, стан, історія змін, коментарі, статус-звіти й ризики;
- РМ регулярно здає **статус-звіт** — лише через нього змінюються ключові показники проекту (фаза, стан, % виконання, дати, витрати);
- РМО погоджує** кожен статус-звіт: у картку звіт потрапляє лише після погодження;
- ризики та проблеми** проекту оцінюються як «ймовірність x вплив», для кожного обирається стратегія реагування;
- головна** показує стан портфеля: ключові показники, карту ризиків, зсуви термінів, найближчі запуски, портфель за напрямками.

Кожен бачить лише ті проекти, де він сам або його підлеглі мають роль.

Як відкрити

- Комп'ютер**: відкрийте в браузері <https://smarthrua.sharepoint.com/sites/pm-a-test> і увійдіть робочим обліковим записом Microsoft 365.
- Телефон і планшет (iPhone, iPad, Android)**: та сама адреса в Safari або Chrome. Щоб відкрити, як застосунок: у Safari — «Поділитися» → «На екран „Додому“», у Chrome — меню : → «Додати на головний екран».
- Застосунок SharePoint на телефоні** може показувати портал не повністю — тоді відкривайте в браузері. Меню SharePoint над порталом приховане: усе робиться у вкладках порталу.

Вкладки меню — зі значками; у кожного розділу свій колір. На телефоні лишаються тільки значки (назва — у підказці).

«Довідка» — інструкція в самому порталі, кнопка «?», три мови; наприкінці — «Детальний огляд системи» (цей документ) і «Завантажити PDF».

Зворотний зв'язок під час тестування

Учасник відкриває вкладку «Відгуки» → «Залишити відгук» і пише, на якому екрані помітив проблему. До 5 скриншотів; на комп'ютері — вставка з буфера (Ctrl+V / Cmd+V). Зауваження, що прийшли листом, розробники заносять туди ж.

Сторінка «Відгуки» — зв'язок розробників рішення з учасниками: усі бачать усі зауваження, автора, статус розгляду (Новий, Прийнято, Зроблено, Прокоментовано, Відхилено) і відповідь. Скриншоти бачать лише автор і розробники; статус і відповідь ставлять розробники.

Відгуки

Зауваження й пропозиції учасників тесту та відповіді розробників рішення

Залишити відгук

Відображати Усі відгуки CSV


Показано 80 з 80

№	Дата	Автор	Що не так або що покращити?	Статус розгляду	Відповідь	Скриншоти	Екран
#80	08.10.2026 17:02		Після подачі статус-звіт одразу отримує статус «На погодженні», і РМ не може...	Відхилено	Не потрібно створювати новий - треба дочекатись поки його передивиться ПМ...	1	Відгуки
#79	08.10.2026 16:05		У таблиці «Статус-звіти» звіти різних проектів показуються одним списком упереміш і...	Відхилено	Зведено по проекту можна подивитись в самому проекті - там є розділ з усіма звітам...	1	Відгуки
#78	08.10.2026 15:45		Зараз у списку проектів є колонка «Статус» (Ініціація, Планування, Реалізація), але...	Зроблено	Колонки відповідають на різні питання: Статус — етап життєвого циклу (Ініціація →...	1	Відгуки
#77	08.10.2026 15:10		Виправити відображення статусу проекту у звіті, створеному на основі...	Зроблено	Зроблено (1.7.2.1): фаза й тип проекту записуються в кожен звіт, навіть якщо не...	2	Відгуки
#76	08.10.2026 12:24		Прибрати колонку «Статус» зі списку архівних проектів Крок: 2.5. Екран: Архів · Список ...	Зроблено	Архів, це той самий список проектів але автоматично фільтрований по статусу яки...	1	Відгуки
#75	08.10.2026 08:45		Деталізувати зміни в історії картки проекту Кроки: 4.2–4.3; 8.2. Екран: Картка проекту ...	Відхилено	На скріні зліва - як було а справо як стало, одразу бачимо що було змінено	1	Відгуки


Сторінка «Відгуки»: № (у вікні відгуку — стрілки < > до попереднього й наступного), дата, автор, зауваження, статус розгляду, відповідь, кількість скриншотів, екран.

Телефон і планшет


Портал відкривається в браузері телефона й планшета без окремого застосунку: сторінки підлаштовуються під ширину, картка й форми — на весь екран, кнопка «Зберегти» завжди видна; меню — лише значки, кнопки дій — по центру й однакової ширини.

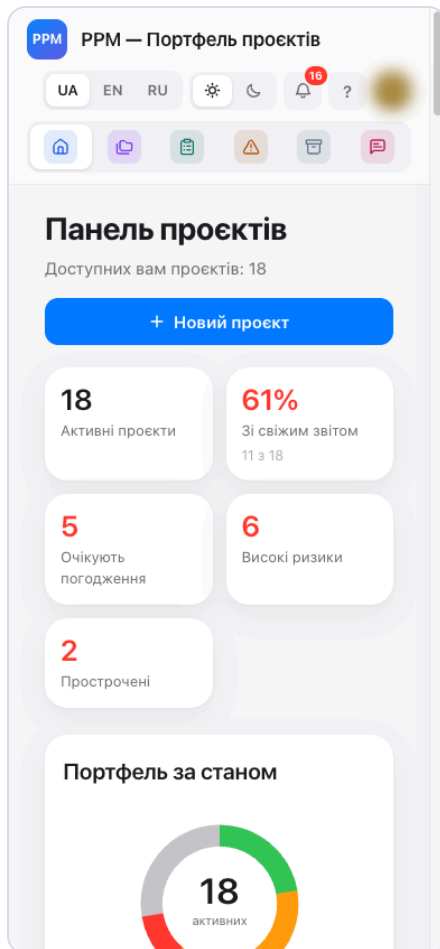

Головна.

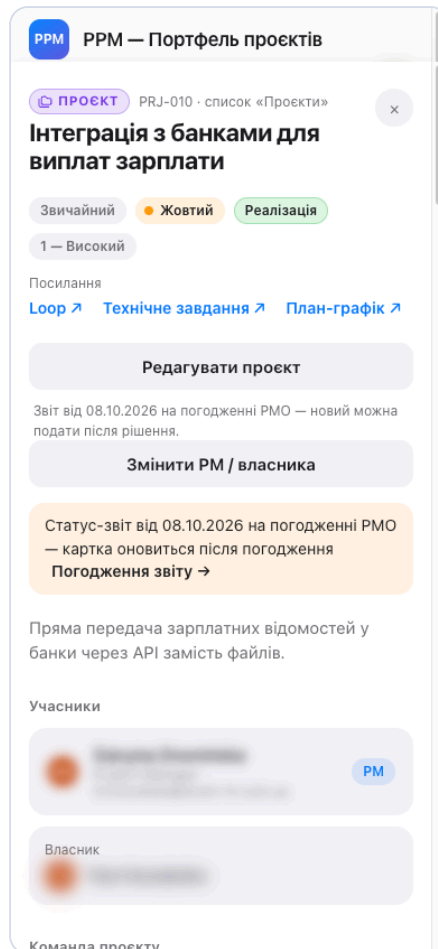

Картка проекту.

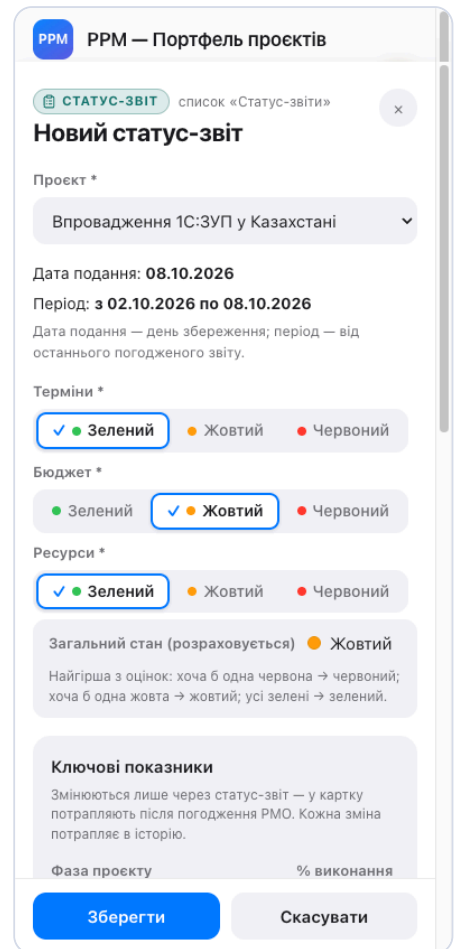

Статус-звіт.

Безпека та дані

- Дані — лише в SharePoint Online компанії; зовнішніх баз і сервісів немає.
- Застосунок працює від імені користувача: кожен бачить лише те, до чого має доступ.
- Права на кожен проект і його записи (папки проектів) видає синхронізація за оргструктурою; змінювати може лише РМ; записати щось у чужий проект неможливо; ключові поля захищені еталоном; архів — лише перегляд.
- Синхронізація має доступ тільки до сайту порталу (Sites.Selected) і лише читає оргструктуру з Microsoft Entra ID (User.Read.All). В Azure Automation — керована ідентичність, без паролів і сертифікатів у скриптах.

Стан і наступні кроки

Етап	Стан
Списки, права, синхронізація	готово, тестовий сайт
Застосунок: головна, проекти, картка, форми, телефон	готово, тестовий сайт
Раунд 2 і відгуки фокус-групи: погодження звітів, команда й посилання, стратегія ризику, аналітика, «Відгуки», захист від одночасних змін, долари, поле дати	готово, тестовий сайт
Раунди 3–4: форма звіту й ризику, «Призначення» РМ / власника, сповіщення в порталі, архів за фазами, дата подання й період, фільтр за погодженням, новий вигляд меню й вікон	готово, тестовий сайт (1.7.2.1)
Тестування з фокус-групою (РМ, РМО)	триває
Синхронізація в хмарі (Azure Automation)	працює (Germany West Central) з 04.10.2026
Сповіщення листом і в стрічці активності Microsoft Teams	наступний етап
Робочий сайт, Microsoft Teams, запуск на всю компанію	після тестування з фокус-групою

Документи

Документ	Для кого
Інструкція користувача (UA / EN / RU) — також «Довідка» в порталі	усі користувачі
Цей огляд — у порталі («Довідка» → «Детальний огляд системи») і PDF	усі користувачі, керівництво
Плани тестування — РМ і РМО	учасники фокус-групи
Технічне завдання	РМО, ІТ
Розгортання й адміністрування	ІТ, адміністратори SharePoint
Архітектура рішення й модель даних	ІТ, розробники

Усі документи ведуться в репозиторії проекту разом із кодом, тож оновлюються разом зі змінами системи.
