




Портфель проєктів

Огляд системи: навіщо вона, з чого складається і як нею користуються РМ, керівники та РМО.

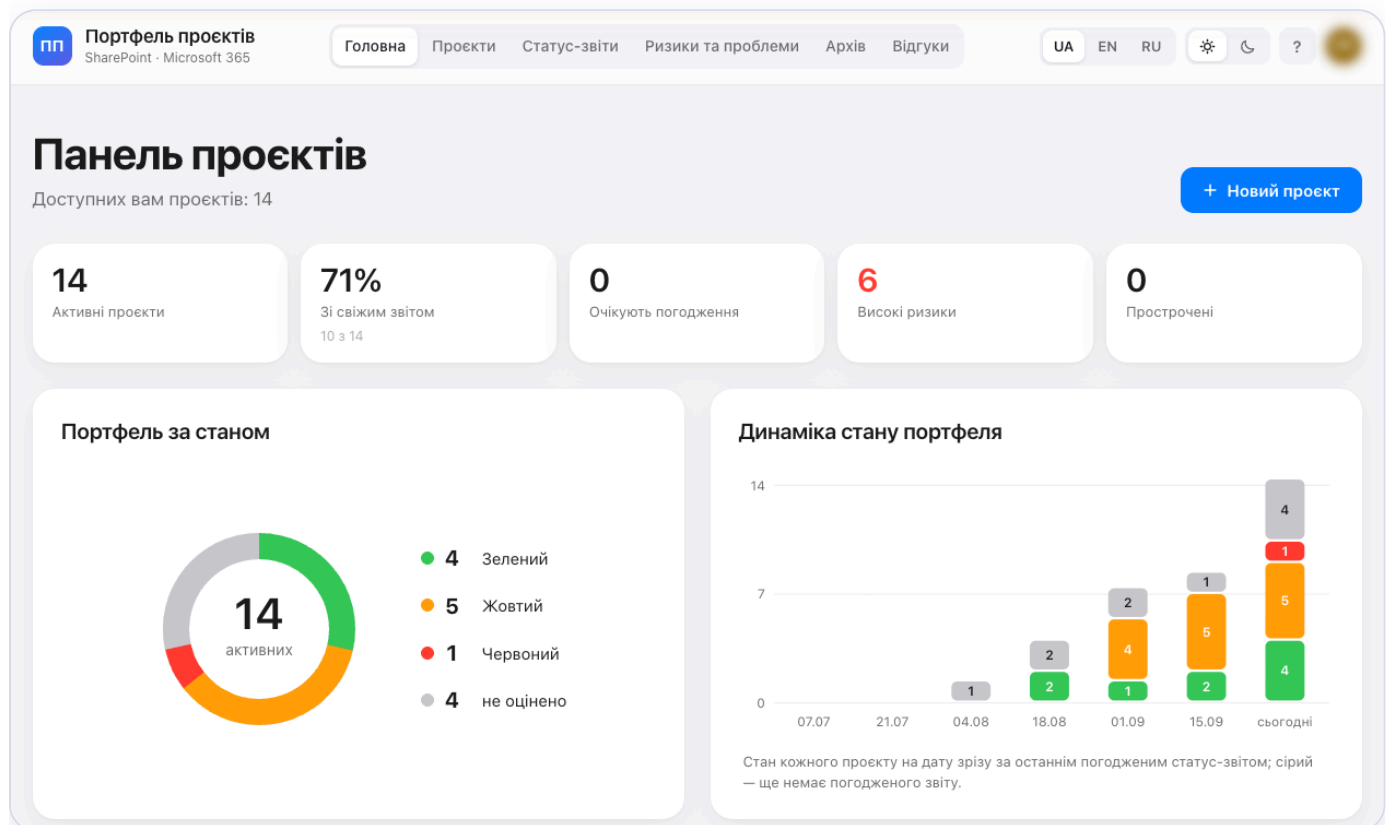

Навіщо

Портфель проєктів — єдине місце, де компанія веде всі проєкти: хто відповідає, у якому вони стані, що змінилося і де потрібне рішення керівництва. Замість таблиць, листів і нарад «що там з проєктом» — одна картка проєкту й регулярний статус-звіт РМ.

Один стан портфеля

Головна: ключові показники, карта ризиків, зсуви термінів, найближчі запуски, портфель за напрямками.

Зміни — лише через погоджений звіт

Статус, стан, % виконання, дати й витрати змінюються тільки статус-звітом РМ, який погодив РМО; причина обов'язкова, усе потрапляє в історію.

Прозорість для керівництва

Керівник бачить проєкти своїх підлеглих автоматично — за оргструктурою Microsoft 365, без ручного налаштування доступу.

Контроль ризиків

Оцінка «ймовірність × вплив», стратегія реагування, заходи й план дій у разі настання, власник і термін.

Запити на рішення

РМ позначає у звіті «Потрібне рішення керівництва» — запит одразу видно на головній і в окремому поданні.

Там, де всі працюють

У браузері на комп'ютері, на телефоні й планшеті, згодом — у Microsoft Teams. Три мови: українська, англійська, російська.

Хто що бачить і що може

Роль	Бачить	Може
РМ проєкту	свій проєкт	редагувати картку (команда, посилання), здавати статус-звіти, вести ризики, коментувати
Керівники РМ (за оргструктурою)	проєкти підлеглих	переглядати й коментувати
Власник, команда проєкту та їхні керівники	проєкти, де роль мають вони або їхні підлеглі	переглядати й коментувати
РМО	усі проєкти	створювати нові проєкти й призначати РМ; погоджувати або повертати статус-звіти (змінює лише оцінки, з коментарем); решту — переглядати й коментувати
Інші співробітники	порожній портал	—

Завершений проєкт переходить в архів і стає лише для перегляду для всіх. Керівника бачать за полем «Керівник» у Microsoft 365: CEO бачить усе, бо CIO — його підлеглий; фінансовий директор — лише проєкти, де роль має він або його підлеглі.

3 чого складається

Система побудована повністю на Microsoft 365 компанії: дані зберігаються в SharePoint, доступ і оргструктура — з Microsoft Entra ID. Зовнішніх сервісів і баз немає.

Користувачі

- браузер на комп'ютері
- телефон і планшет (iOS, Android)
- Microsoft Teams — наступний етап

Застосунок portalu

- головна сторінка сайту SharePoint на весь екран
- головна, проекти, статус-звіти, ризики, архів, картка й форми
- працює від імені користувача — показує лише дозволене

Списки SharePoint

- Проекти, Команда проекту
- Статус-звіти, Погодження звітів
- Ризики та проблеми
- Коментарі
- Зміни показників (журнал)

Користувач → застосунок → списки SharePoint ← синхронізація за розкладом ← оргструктура Microsoft Entra ID


Компонент	Що робить
Застосунок (SharePoint Framework)	Інтерфейс portalu: сторінки, картка проекту, форми статус-звіту, ризику, проекту й коментаря. Збережене видно на екрані одразу.
Списки SharePoint	Усі дані portalu. Звичайні списки лишаються для адміністраторів, вивантаження в Excel і Power BI.
Синхронізація	Кожні 15 хвилин: переносить рішення РМО у статус-звіт, погоджений звіт — у картку проекту, веде журнал змін, відправляє завершені проекти в архів, видає права за оргструктурою, оновлює «Доступ до картки». Раз на тиждень — повний перерахунок прав.
Microsoft Entra ID	Облікові записи, керівники, посади — джерело прав за ієрархією.
Відгуки (лише тест)	Сторінка «Відгуки» з кнопкою «Залишити відгук» (текст, скриншоти, пристрій): усі бачать усі зауваження, статус розгляду й відповідь розробників.


Ключові правила

- Загальний стан звіту** — найгірша з трьох оцінок (терміни, бюджет, ресурси): хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений. Стан проекту — за останнім звітом.
- Ключові показники** (статус, стан, тип, %, дати, витрати) змінюються лише статус-звітом; зміна статусу, типу чи дат вимагає причини.
- Погодження РМО:** у картку потрапляє лише погоджений звіт; РМО може змінити лише оцінки або повернути звіт — в обох випадках з коментарем.
- «Завершено» або «Скасовано»** у погодженому звіті → проект у «Архів», лише перегляд; що проект скасовано, видно у звіті.
- Оцінка ризику** = ймовірність × вплив (1–25): 15–25 високий, 8–14 середній, 1–7 низький.
- Свіжість звіту:** до 8 днів — зелений, 8–14 — жовтий, понад 14 — червоний.
- Історія:** кожна зміна — «було → стало», хто, коли і чому.

Головна

Стан портфеля за видимими користувачу проектами (без архіву). Угорі — **смуга показників**: активні проекти, частка зі свіжим звітом, звіти на погодженні (для РМО), високі ризики, прострочені проекти; кожен показник відкриває відфільтрований список. Для РМО показник «Очікують погодження» — черга статус-звітів.

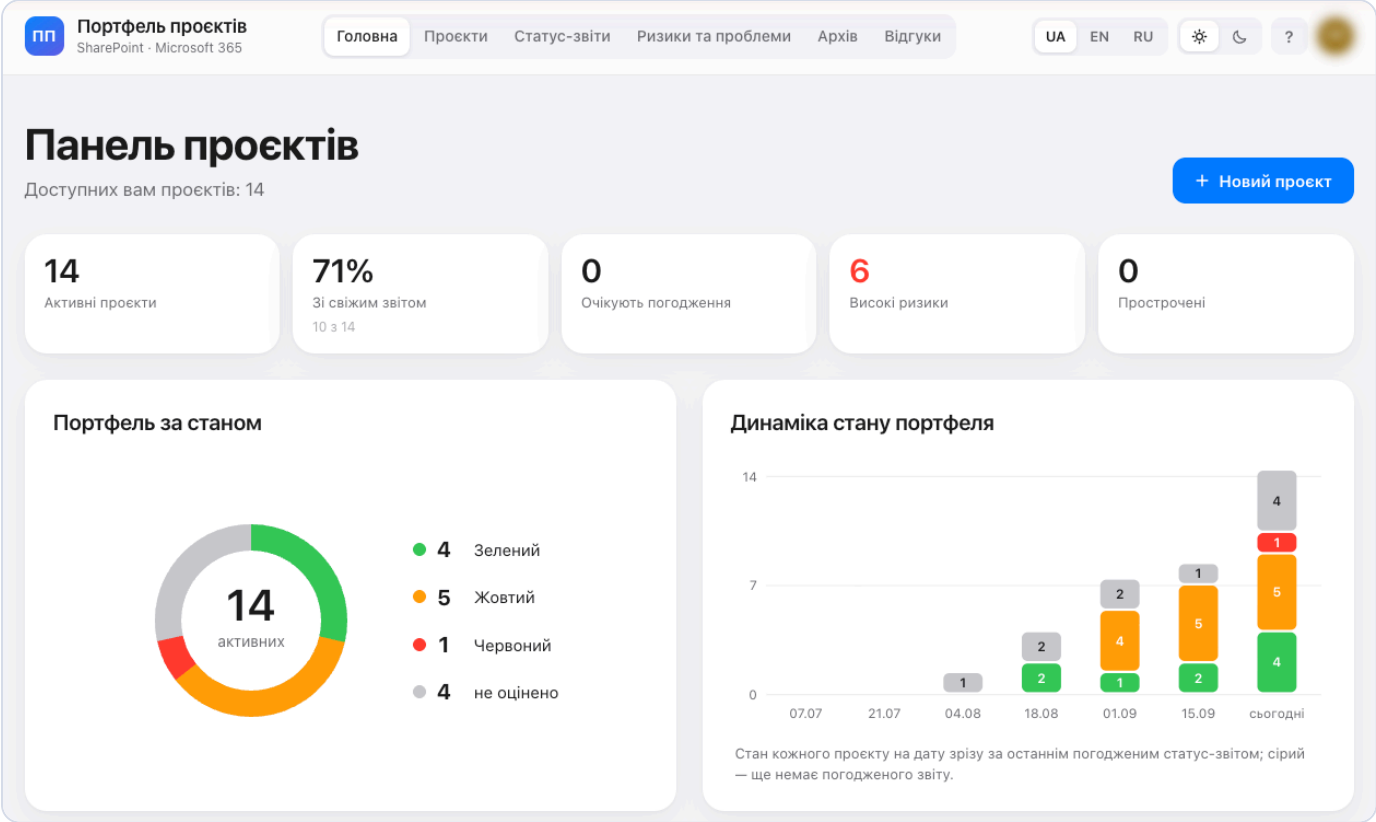

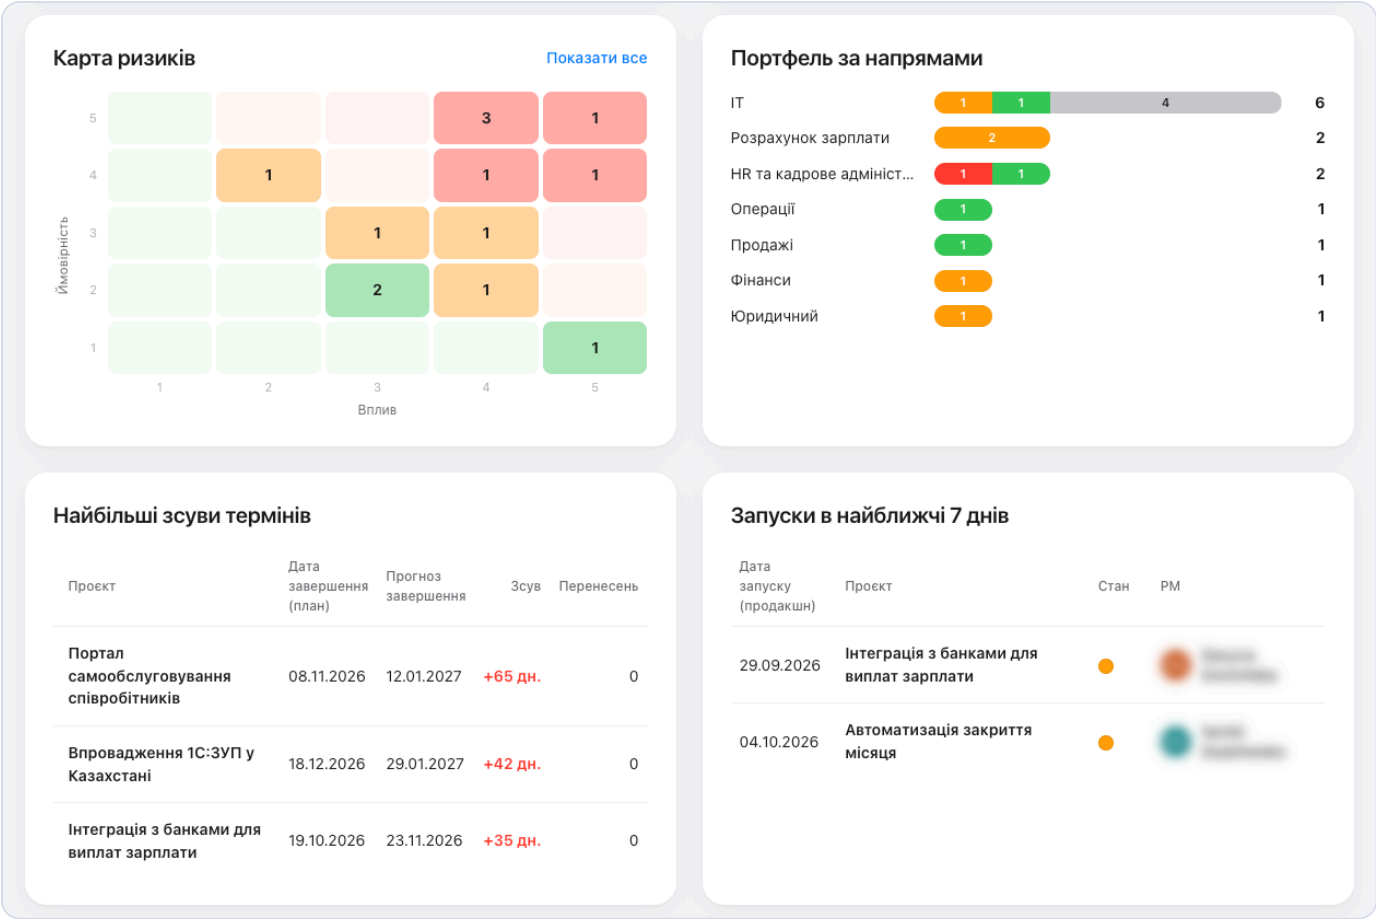

Найбільші зсуви термінів

Проект	Дата завершення (план)	Прогноз завершення	Зсув	Перенесень
Портал самообслуговування співробітників	08.11.2026	12.01.2027	+65 дн.	0
Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані	18.12.2026	29.01.2027	+42 дн.	0
Інтеграція з банками для виплат зарплати	19.10.2026	23.11.2026	+35 дн.	0

Запуски в найближчі 7 днів


Дата запуску (продакшн)	Проект	Стан	PM
29.09.2026	Інтеграція з банками для виплат зарплати		
04.10.2026	Автоматизація закриття місяця		

Карта ризиків 5 × 5 (клік по клітинці — її ризики), портфель за напрямками (у кожному кольорі — число проєктів), три найбільші зсуви термінів, запуски в найближчі 7 днів; блоки однакової висоти.

Нижче на головній лишаються «Проблемні проєкти», «Немає свіжого статус-звіту», «Потребують рішення керівництва» і «Відкриті ризики».

Проекти

Плитки для швидкого огляду або таблиця з сортуванням, фільтрами за значеннями й вибором колонок. «Відобразити»: Усі проекти, Стратегічні, Проблемні, Мої проекти, Немає свіжого звіту, Прострочені. Нові записи — угорі.

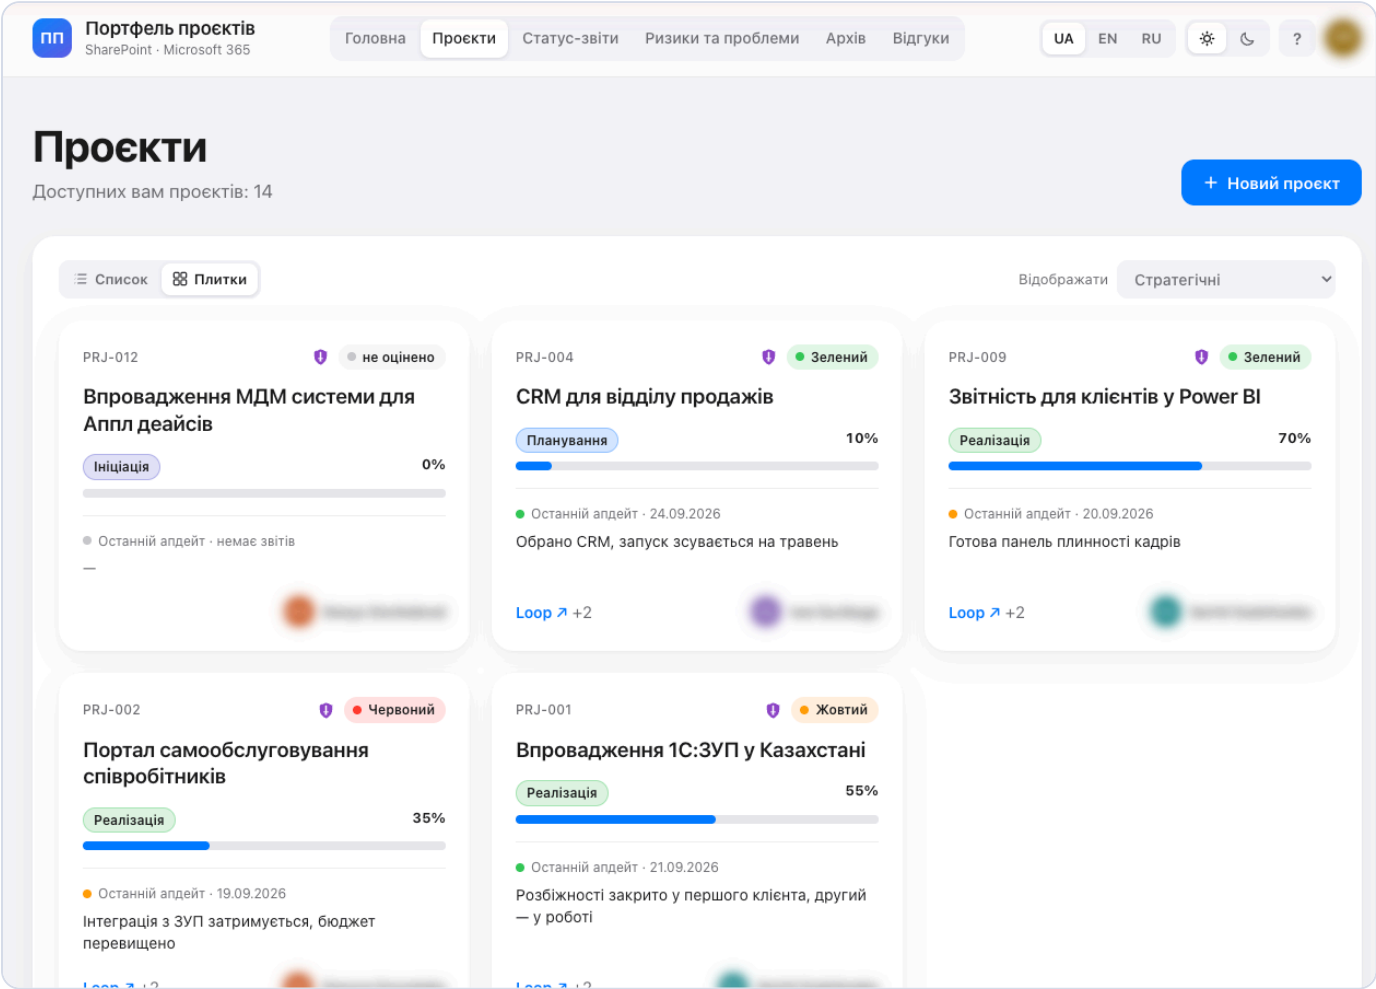

Плитки: номер (PRJ-### — присвоюється автоматично, унікальний), стан, статус (кольорова мітка) і % виконання, останній апдейт зі світлофором свіжості, PM.

пп

Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхівВідгуки

UAENRU

Проекти

Доступних вам проєктів: 14

Список

Плитки

Відобразити

Усі проєкти

CSV

Показано 14 з 14

	Назва проєкту	РМ	Статус	Стан	Звіт	% виконання	Завершення (план)	Останній апдейт
	Тестовий Проєкт 3		Ініціація		немає звітів	0%	—	—
	Тестовий Проєкт 2		Ініціація		немає звітів	0%	30.09.2026	—
	Тестовий Проєкт		Ініціація		немає звітів	0%	—	—
	Впровадження МДМ системи для Аппл деайсів		Ініціація		немає звітів	0%	30.11.2026	—
	Перевірка форми нового проєкту		Планування		28.09.2026	10%	—	Тест повернення звіту
	Навчальна платформа для нових співробітників		Ініціація		25.09.2026	5%	21.02.2027	Роботи за планом: етап продовжується
	CRM для відділу продажів		Планування		24.09.2026	10%	14.05.2027	Обрано CRM, запуск зсувається на травень
	Розробка системи управління		Планування		20.09.2026	10%	22.11.2026	Будова бази даних завершена

Таблиця: статус — кольорова мітка, стан — кружечок; воронка — фільтр, шестерня — колонки, клік по заголовку — сортування.

Картка проекту

Усе про проєкт в одній панелі: посилання (Loop, документи), учасники й **команда проєкту** — хто, яка роль, з яких питань звертатися; терміни з відхиленням прогнозу, бюджет і виконання, історія змін, коментарі, історія станів, статус-звіти, ризики та «Доступ до картки». Посиланням на картку можна поділитися.

PRJ-011 - список «Проекти»

Перевірка форми нового проєкту

Звичайний

Жовтий

Планування

2 — Середній

Посилання

Технічне завдання

+ Додати статус-звіт

Редагувати

Учасники

Власник

Команда проєкту

Учасник	Роль	З яких питань звертатися
	Бізнес-замовник	Цілі, бюджет

Терміни

Дата старту	24.09.2026
Дата запуску (продакшн)	—
Дата завершення (план)	—
Прогноз завершення	—

Бюджет і виконання

% виконання

Останній статус-звіт

Шапка картки: тип, стан, статус (кольорова мітка), пріоритет, посилання; поки звіт на погодженні — позначка «на погодженні РМО»; команда проєкту.

Бюджет і виконання

% виконання

Останній статус-звіт

Бюджет (план)

Витрати (факт)

Напрямок

Розрахунок зарплати

Історія змін

21.09.2026 15:00

Оновлено статус-звіт

% виконання

48% → 55%

Розбіжності закрито у першого клієнта, другий — у роботі

08.09.2026 15:00

Оновлено статус-звіт

% виконання

40% → 48%

Прогноз завершення

— → 29.01.2027

Розбіжності паралельного розрахунку потребують доопрацювання формул. · Пілотний паралельний розрахунок: розбіжності у 2 з 3 клієнтів

25.08.2026 15:00

Оновлено статус-звіт

Статус проєкту

Планування → Реалізація

% виконання

0% → 40%

Завершено міграцію довідників і кадрових даних

Бюджет і виконання та історія змін: хто, коли, що змінив і причина.

Історія станів

	25.08	08.09	21.09
Загальний стан			
Терміни			
Бюджет			
Ресурси			
% виконання	40	48	55

Статус-звіти (3)

21.09.2026

Жовтий

Розбіжності закрито у першого клієнта, другий — у роботі

Зроблено: Виправлено формули утримань; перший клієнт звірнений без розбіжностей. Підключено другого консультанта.

План: Звірити другого клієнта, почати навчання розрахунковців.

Проблеми: Прогноз завершення — кінець січня.

08.09.2026

Жовтий

Пілотний паралельний розрахунок: розбіжності у 2 з 3 клієнтів

Зроблено: Проведено паралельний розрахунок для трьох клієнтів; у двох розбіжності в утриманнях.

План: Виправити формули утримань, повторити розрахунок.

Проблеми: Зсув запуску на 6 тижнів, якщо розбіжності не закриємо до кінця місяця.

25.08.2026

Жовтий

Завершено міграцію довідників і кадрових даних

Зроблено: Перенесено довідники та кадрові дані 12 клієнтів. Налаштовано базові види нарахувань.

План: Паралельний розрахунок за вересень для трьох пілотних клієнтів.

Проблеми: Не вистачає одного консультанта з розрахунку.

Історія станів за останніми звітами та самі статус-звіти.

План: Звірити другого клієнта, почати навчання розрахунковців.

Проблеми: Прогноз завершення — кінець січня.

08.09.2026

Жовтий

Пілотний паралельний розрахунок: розбіжності у 2 з 3 клієнтів

Зроблено: Проведено паралельний розрахунок для трьох клієнтів; у двох розбіжності в утриманнях.

План: Виправити формули утримань, повторити розрахунок.

Проблеми: Зсув запуску на 6 тижнів, якщо розбіжності не закриємо до кінця місяця.

25.08.2026

Жовтий

Завершено міграцію довідників і кадрових даних

Зроблено: Перенесено довідники та кадрові дані 12 клієнтів. Налаштовано базові види нарахувань.

План: Паралельний розрахунок за вересень для трьох пілотних клієнтів.

Проблеми: Не вистачає одного консультанта з розрахунку.

Ризики та проблеми (2)

12

Розбіжності розрахунку в пілотних клієнтах не буде закрито вчасно

Ризик - В роботі

6

Звільнення ключового розрахунковця клієнта під час запуску

Ризик - Відкрито

Доступ до картки

Права задаються автоматично за учасниками проєкту та їхніми керівниками з Entra ID.

Змінювати проєкт може лише РМ, решта — перегляд і коментарі.

редагування

перегляд і коментарі

перегляд і коментарі

перегляд і коментарі

перегляд і коментарі

перегляд і коментарі

«Доступ до картки»: РМ — редагування, керівники, власник і команда — перегляд і коментарі.

Статус-звіт

РМ оцінює терміни, бюджет і ресурси — загальний стан рахується сам. Ключові показники вже заповнені поточними значеннями; змінюється лише те, що змінилося. Якщо змінено статус, тип або дату, з'являється обов'язкова «Причина зміни показників».

список «Статус-звіти»

Новий статус-звіт

Проект *
Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані

Дата звіту *
25.09.2026

Період
2 тижні

Терміни *
Зелений Жовтий Червоний

Бюджет *
Зелений Жовтий Червоний

Ресурси *
Зелений Жовтий Червоний

Загальний стан (розраховується) ☐ не оцінено
Найгірша з оцінок: хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений.

Ключові показники
Змінюються лише через статус-звіт. Кожна зміна потрапляє в історію.
Статус проекту
Реалізація
% виконання
55
Тип проекту
Стратегічний Звичайний
Дата старту
02.03.2026
Дата запуску (продакшн)
16.11.2026
Дата завершення (план)
29.01.2027
Прогноз завершення
29.01.2027
Причина зміни показників *
Наприклад: перенесення запуску через затримку інтеграції з 1С
Резюме одним рядком *
Наприклад: етап інтеграції завершено, відставань немає
Зроблено за період

Оцінки й розрахунок загального стану.

Ключові показники
Змінюються лише через статус-звіт. Кожна зміна потрапляє в історію.
Статус проекту
Реалізація
% виконання
55
Тип проекту
Стратегічний Звичайний
Дата старту
02.03.2026
Дата запуску (продакшн)
16.11.2026
Дата завершення (план)
29.01.2027
Прогноз завершення
29.01.2027
Причина зміни показників *
Наприклад: перенесення запуску через затримку інтеграції з 1С
Резюме одним рядком *
Наприклад: етап інтеграції завершено, відставань немає
Зроблено за період

Ключові показники: змінено дату — потрібна причина.

Що відбувається після збереження

- Одразу:** звіт іде на погодження РМО; у картці — позначка «Статус-звіт ... на погодженні РМО», картка поки не змінюється. Надісланий звіт змінити не можна.
- РМО погоджує** — картка одразу показує новий стан, % виконання, дати й «Останній апдейт»; протягом 15 хвилин синхронізація записує в журнал кожен змін: було → стало, автор, причина.
- РМО повертає** — картка не змінюється, РМ бачить коментар і здає новий звіт кнопкою «Новий звіт на основі повернутого».
- Запит на рішення** (позначка «Потрібне рішення керівництва») — одразу в блоці на головній і в поданні «Потребують рішення».
- «Завершено»** — проєкт отримує статус «Архівний» і дату архівації, зникає з робочих списків і стає лише для перегляду.

Звіт може здати лише РМ проєкту. Звіт від іншої людини синхронізація не застосує — це захист від випадкових змін у чужих проєктах.

Погодження статус-звітів

Кожен статус-звіт погоджує РМО. Звіти, що чекають, — у показнику «Очікують погодження» на головній і у «Статус-звіти» → «Відображати: Очікують погодження».

Звіт на погодженні: РМО змінив оцінку бюджету — кнопка стала «Погодити зі зміною оцінок», коментар обов'язковий.

Що може РМО

- **Погодити** — звіт потрапляє в картку з оцінками РМ.
- **Погодити зі зміною оцінок** — змінити терміни, бюджет чи ресурси; у картку потрапляє оцінка РМО. Коментар обов'язковий.
- **Повернути на доопрацювання** — картка не змінюється, РМ бачить коментар. Коментар обов'язковий.

РМО змінює лише оцінки — тексти, дати й статус звіту лишаються як у РМ. Рішення РМО — окремий запис, тож це забезпечують права SharePoint, а не лише інтерфейс. Рішення потрапляє в історію змін проєкту: «Погодження звіту», було → стало, коментар.

Вирішений звіт повторно не погоджується.

Як змінити статус проєкту

1. РМ у картці — «Додати статус-звіт» → «Ключові показники» → новий «Статус проєкту».
2. Заповнює «Причина зміни показників», оцінки й резюме → «Зберегти». Звіт іде на погодження.
3. РМО погоджує — статус у картці змінюється, в історії з'являються «Погодження звіту» і «Оновлено статус-звітом».
4. «Завершено — перенести в архів» або «Скасовано — перенести в архів» — після погодження проєкт отримує «Архівний», дату архівації і переходить в «Архів»; що його скасовано, видно у звіті.

Окремої кнопки «Змінити статус» немає свідомо: будь-яка зміна статусу має причину, погодження і слід в історії.

Ризики та проблеми

Реєстр ризиків і проблем усіх видимих проєктів з оцінкою, **стратегією реагування** (Уникнення, Зниження (пом'якшення), Передача, Прийняття), власником, статусом і терміном. У ризику — «Заходи для зниження ризику» і «План дій у разі настання». Форма ризику рахує оцінку одразу й пояснює кожен бал шкали.

пп Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхівВідгуки

UAENRU⚙️🌙?

Ризики та проблеми

+ Новий ризик

ВідображатиВисокі ризикиCSV⚙️

Показано 6 з 6

🔍 ⚙️ 📄 ⚙️	Проект ⚙️	Ризик / проблема	Тип ⚙️	Оцінка ⚙️	Стратегія реагування ⚙️	Власник ризику ⚙️	Статус ⚙️	Термін виконання заходів
🔍 ⚙️	📄 ⚙️	Впровадження МДМ системи для Аппл деайсів	Ризик	20	—	👤	Відкрито	07.10.2026
🔍 ⚙️	📄 ⚙️	Перевірка форми нового проєкту	Ризик	20	—	👤	Відкрито	
🔍 ⚙️	📄 ⚙️	Інтеграція з банками для виплат зарплати	Проблема	20	—	👤	Відкрито	29.09.2026
🔍 ⚙️	📄 ⚙️	Електронний документообіг з клієнтами	Проблема	25	—	👤	Відкрито	24.10.2026
🔍 ⚙️	📄 ⚙️	Портал самообслуговування співробітників	Ризик	16	—	👤	Відкрито	04.10.2026

«Відображати: Високі ризики» — відкриті з оцінкою від 15; колонка «Стратегія реагування»; статус — кольорова мітка (Відкрито, В роботі, Закрито).

Ризик / проблема *

Затримка постачання ліцензій

Тип

РизикПроблема

Ймовірність

12345

3 — можливо (30–60%)

Вплив

12345

3 — суттєвий: зсув етапу або перевитрата до 10%

Оцінка 9 Середній (8–14) = 3 × 3

Оцінка = ймовірність × вплив, кожне від 1 до 5. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Власник ризику

Статус

Відкрито

Термін виконання заходів

дд. мм. рррр

Стратегія реагування

УникненняЗниження (пом'якшення)ПередачаПрийняття

Заходи для зниження ризику

Резервний постачальник, замовлення за 6 тижнів.

План дій у разі настання

Тимчасові ліцензії на 1 місяць, зсув навчання.

Новий ризик: оцінка $3 \times 3 = 9$ «Середній», стратегія реагування, заходи для зниження ризику і план дій у разі настання.

Як рахується оцінка

Ймовірність і вплив — від 1 до 5, кожен бал має опис (наприклад, 4 — «ймовірно, 60–90%», 5 — «критичний: зрив цілей проєкту»).

Оцінка = ймовірність × вплив. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Прострочений термін відкритого ризику виділяється червоним; закриті ризики зникають з подання «Відкриті».

Статус-звіти й архів

Статус-звіти

+ Новий статус-звіт

Відобразити Усі звіти CSV

Показано 23 з 23

Проект	Дата звіту	Стан	Терміни	Бюджет	Ресурси	Резюме одним рядком	Автор	Погодження
Перевірка форми нового проєкту	28.09.2026					Тест повернення звіту		Погоджен
Перевірка форми нового проєкту	28.09.2026					Тест повернення звіту		Повернут
Перевірка форми нового проєкту	28.09.2026					Тест погодження: перехід у планування		Погоджен
Інтеграція з банками для виплат зарплати	25.09.2026					Все погано, проєкт не рухається		Погоджен
CRM для відділу продажів	24.09.2026					Обрано CRM, запуск зсувається на травень		Погоджен
Інтеграція з банками для виплат зарплати	23.09.2026					Другий банк не надає тестовий доступ, запуск під загрозою		Погоджен
Міграція пошти та файлів у Microsoft 365	22.09.2026					Почато перенесення файлових серверів		Погоджен

Усі статус-звіти: оцінки, резюме (відкриває звіт), автор, погодження, «Потрібне рішення». «Відобразити»: «Потребують рішення», «Очікують погодження».

Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхівВідгуки

UAENRU

Архів

Завершені та скасовані проєкти. Лише перегляд. · 2

СписокПлитки

Відобразити Усі проєкти CSV

Показано 2 з 2

Назва проєкту	РМ	Власник	Дата архівації	Завершення (план)	Бюджет	Факт
Тестовий проєкт 4		—	29.09.2026	30.09.2026		
Оновлення мережевої інфраструктури офісу			28.08.2026	25.08.2026		

Архів: завершені та скасовані проєкти з датою архівації, лише перегляд; навігація як у «Проекти» — список або плитки, «Відобразити», CSV.

Команда, посилання, довідка і відгуки

Учасники

РМ *

Власник

Команда проекту

Бізнес-замовникЦілі, бюджетx

+ Додати учасника

Посилання

Технічне завданняhttps://example.com/tzx

+ Додати посилання

Після зміни учасників права доступу буде перераховано.

Форма проекту: команда (учасник, роль — обов'язково, з яких питань звертатися) і посилання (назва, адреса <https://>). Новий проект створює РМО.

Портфель проектів

Довідка

Що це

Портал, де компанія веде всі проекти в одному місці:

- у кожного проекту є **картка**: команда, посилання, терміни, бюджет, стан, історія змін, коментарі, статус-звіт і ризики;
- РМ регулярно здає **статус-звіт** — лише через нього змінюються ключові показники проекту (статус, стан, % виконання, дати, витрати);
- РМО погоджує** кожен статус-звіт: у картку звіт потрапляє лише після погодження;
- ризики та проблеми** проекту оцінюються як «ймовірність × вплив», для кожного обирається стратегія реагування;
- головна** показує стан портфеля: ключові показники, карту ризиків, зсуви термінів, найближчі запуски, портфель за напрямками.

Кожен бачить лише ті проекти, де він сам або його підлеглі мають роль.

Як відкрити

- Комп'ютер**: відкрийте в браузері <https://smarthrua.sharepoint.com/sites/pmo-test> і увійдіть робочим обліковим записом Microsoft 365.
- Телефон і планшет (iPhone, iPad, Android)**: та сама адреса в Safari або Chrome. Щоб відкрити, як застосунок: у Safari — «Поділитися» → «На екран „Додому“», у Chrome — меню : → «Додати на головний екран».
- Застосунок SharePoint на телефоні** може показувати портал не повністю — тоді відкривайте в браузері. Меню SharePoint над порталом приховане: усе робиться у вкладках порталу.

Ця інструкція завжди під кнопкою ? угорі порталу.

«Довідка» — інструкція в самому порталі, кнопка «?», три мови.

список «Відгуки»

Відгук про портал

Що не так або що покращити? Опишіть, що ви робили і що очікували побачити. Вкажіть, на якому екрані це помітили; пристрій додається сам.

Що не так або що покращити? *

Крок 2.5 («Проекти - Архів»): хотілося б бачити кількість архівних проектів у заголовку.

Скриншоти (0/5)

Додати скриншот

Скриншот можна вставити з буфера: Ctrl+V (Windows) або Cmd+V (Mac).

НадіслатиСкасувати

«Залишити відгук»: зауваження зі скриншотами (вставка з буфера або з галереї телефона); пристрій додається сам.

Зворотний зв'язок під час тестування

Учасник відкриває вкладку «Відгуки» → «Залишити відгук» і пише, на якому екрані помітив проблему. До 5 скриншотів; на комп'ютері — вставка з буфера (Ctrl+V / Cmd+V). Зауваження, що прийшли листом, розробники заносять туди ж.

Сторінка «Відгуки» — зв'язок розробників рішення з учасниками: усі бачать усі зауваження, автора, статус розгляду (Новий, Прийнято, Зроблено, Прокоментовано, Відхилено) і відповідь. Скриншоти бачать лише автор і розробники; статус і відповідь ставлять розробники.

Відгуки

Зауваження й пропозиції учасників тесту та відповіді розробників рішення

Залишити відгук

Відобразити Усі відгуки CSV


Показано 20 з 20

Дата	Автор	Що не так або що покращити?	Статус розгляду	Відповідь	Скриншоти	Екран
28.09.2026 09:04		Як змінювати статус проєкта?	Прокоментовано	Статус змінюється лише статус-звітом: «Ключові показники» → новий статус і причина →...	—	Лист РМО
28.09.2026 09:03		Є така ідея - Статус-звіт потрапляє на Head of PM Department, а він вже...	Зроблено	Статус-звіт погоджує група РМО: погодити, змінити лише оцінки (з коментарем) або повернути на...	—	Лист РМО
28.09.2026 09:02		Картка проєкту - може сюди перейдемо з Loor? Для цього нам достатньо додати блок з...	Зроблено	У картці — блок «Посилання» (кілька посилань) і таблиця «Команда проєкту»: учасник,...	—	Лист РМО
28.09.2026 09:01		В блок "Ризики та проблеми" (в картку ризику) додати як саме ми обробляємо ризик у разі його...	Зроблено	У ризику додано «Стратегія реагування» (Уникнення, Зниження (пом'якшення),...	—	Лист РМО
28.09.2026 09:00		Подання (Усі проєкти, Стратегічні, Проблемні, Мої проєкти, Немає свіжого звіту)...	Зроблено	Перейменовано на «Відобразити» в усіх списках.	—	Лист РМО
27.09.2026 22:03		Експорт в Excel не працює більше року (минулого року влітку тестив). Замість цього потрібно...	Зроблено	Додано кнопку CSV у таблицях — вивантажує таблицю як на екрані, файл відкривається в...	1	Головна
27.09.2026		Потрібно додати кольорів до	Зроблено	Статуси відгуків кольорові; є	1	Головна

Сторінка «Відгуки»: дата, автор, зауваження, статус розгляду, відповідь, кількість скриншотів, екран.

Телефон і планшет

Портал відкривається в браузері телефона й планшета без окремого застосунку: сторінки підлаштовуються під ширину, картка й форми — на весь екран, кнопка «Зберегти» завжди видна.

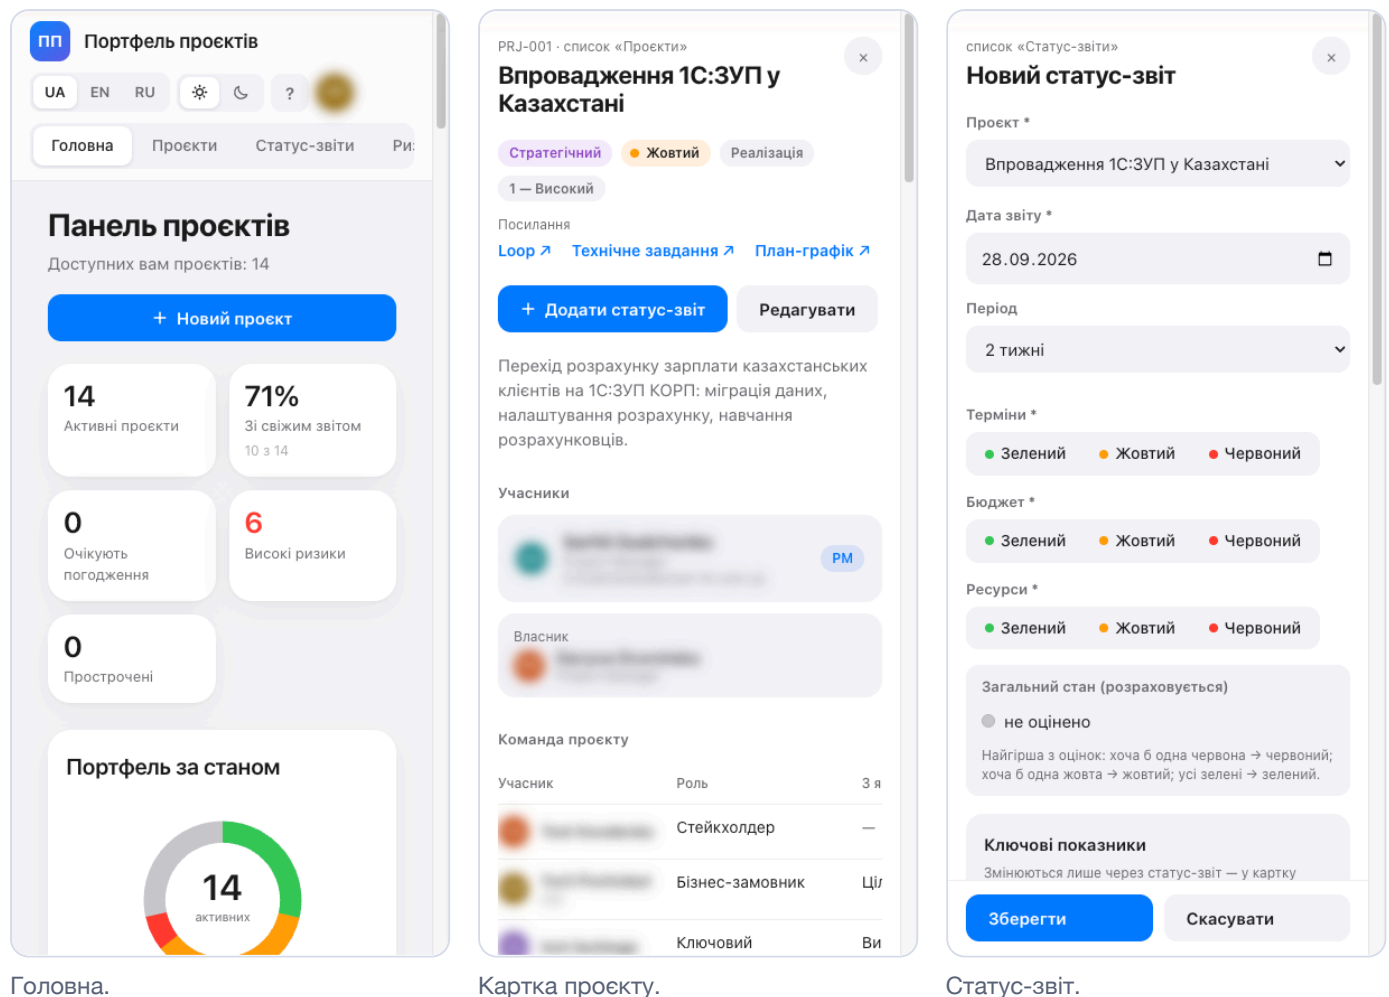

Головна.

Картка проекту.

Статус-звіт.

Безпека та дані

- Дані — лише в SharePoint Online компанії; зовнішніх баз і сервісів немає.
- Застосунок працює від імені користувача: кожен бачить лише те, до чого має доступ.
- Права на кожен проєкт і його записи видає синхронізація за оргструктурою; змінювати може лише РМ, архів — лише перегляд.
- Синхронізація має доступ тільки до сайту порталу (Sites.Selected) і читає оргструктуру з Microsoft Entra ID.

Стан і наступні кроки

Етап	Стан
Списки, права, синхронізація	готово, тестовий сайт
Застосунок: головна, проекти, картка, форми, телефон	готово, тестовий сайт
Раунд 2 за запитами РМО: погодження звітів, команда й посилення, стратегія ризику, аналітика, «Відгуки»	готово, тестовий сайт
Тестування з фокус-групою (РМ, РМО)	триває
Синхронізація в хмарі (Azure Automation)	очікує підписку Azure
Microsoft Teams, запуск на всю компанію	після розбору відгуків

Документи

Документ	Для кого
Інструкція користувача (UA / EN / RU) — також «Довідка» в порталі	усі користувачі
Плани тестування — РМ і РМО	учасники фокус-групи
Технічне завдання	РМО, ІТ
Розгортання й адміністрування	ІТ, адміністратори SharePoint

Усі документи ведуться в репозиторії проекту разом із кодом, тож оновлюються разом зі змінами системи.
