PPM · ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ PMO І PM · ВИПУСК 1.7.11 · 02.11.2026

ОНОВЛЕННЯ ДАНИХ ПОТОЧНИХ ПРОЄКТІВ

У порталі з'явилися країна проєкту, бюджет і прогноз витрат у статус-звіті, правило оцінки бюджету, обов'язковий власник ризику. Щоб картки, головна сторінка й щотижневий лист керівникам показували правильні цифри, поточні проєкти треба доповнити. PMO починає з країни, PM — у найближчому статус-звіті.

ЩО БРАКУЄ ЗАРАЗ

Стан на 02.11.2026: 23 активні проєкти (Ініціація — 13, Реалізація — 7, Призупинено — 3).

23 з 23
без країни — заповнює PMO

23 з 23
без прогнозу витрат на завершення

19 з 23
без бюджету (план)

19 з 23
без дати завершення (план)

14 з 23
без жодного статус-звіту

4 з 23
без команди проєкту

Бюджет, витрати, прогноз і дати змінюються лише статус-звітом і потрапляють у картку після погодження PMO. Тому для PM головна дія — подати звіт.

PMO СПЕРШУ, ДО ЗВІТІВ PM


0 **Перевірте довідник «Країни і CEO»**

Меню під аватаром (праворуч угорі) → `Країни і CEO`. Перевірте, що для кожної країни вказано правильного CEO, і додайте країни, яких бракує. Докладно — у розділі «Країна (бізнес-юніт) і CEO країни» нижче.


1 **Вкажіть країну кожного проєкту**

Картка проєкту → **Змінити PM / власника / країну** → поле «Нова країна» → коментар (наприклад, «Початкове внесення країни») → «Зберегти». PM і власника не змінюйте — лише поля порожніми.


Протягом ~15 хвилин синхронізація запише країну в картку, і CEO цієї країни отримає перегляд і коментарі проєкту. На головній у блоці «Портфель за країнами» проєкти без країни зібрані в рядку «—»: коли він зникне, країну вказано всім.

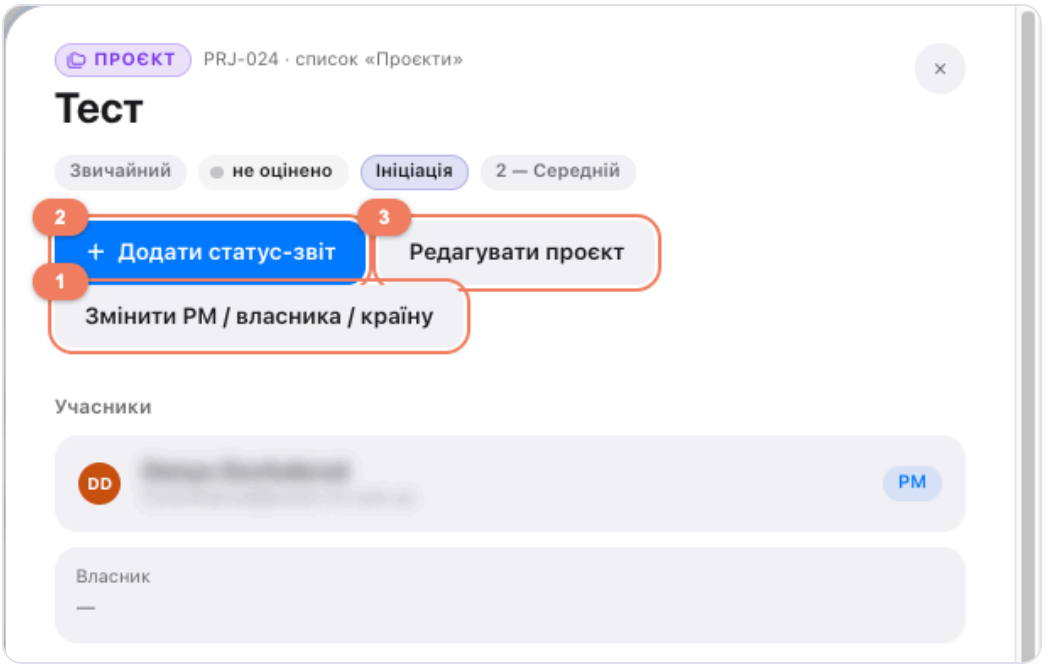

1. «Змінити PM / власника / країну» — для PMO: країна, PM, власник.
2. «Додати статус-звіт» — для PM: бюджет, витрати, прогноз, дати, оцінки.
3. «Редагувати проєкт» — для PM: команда, посилання, опис, пріоритет.

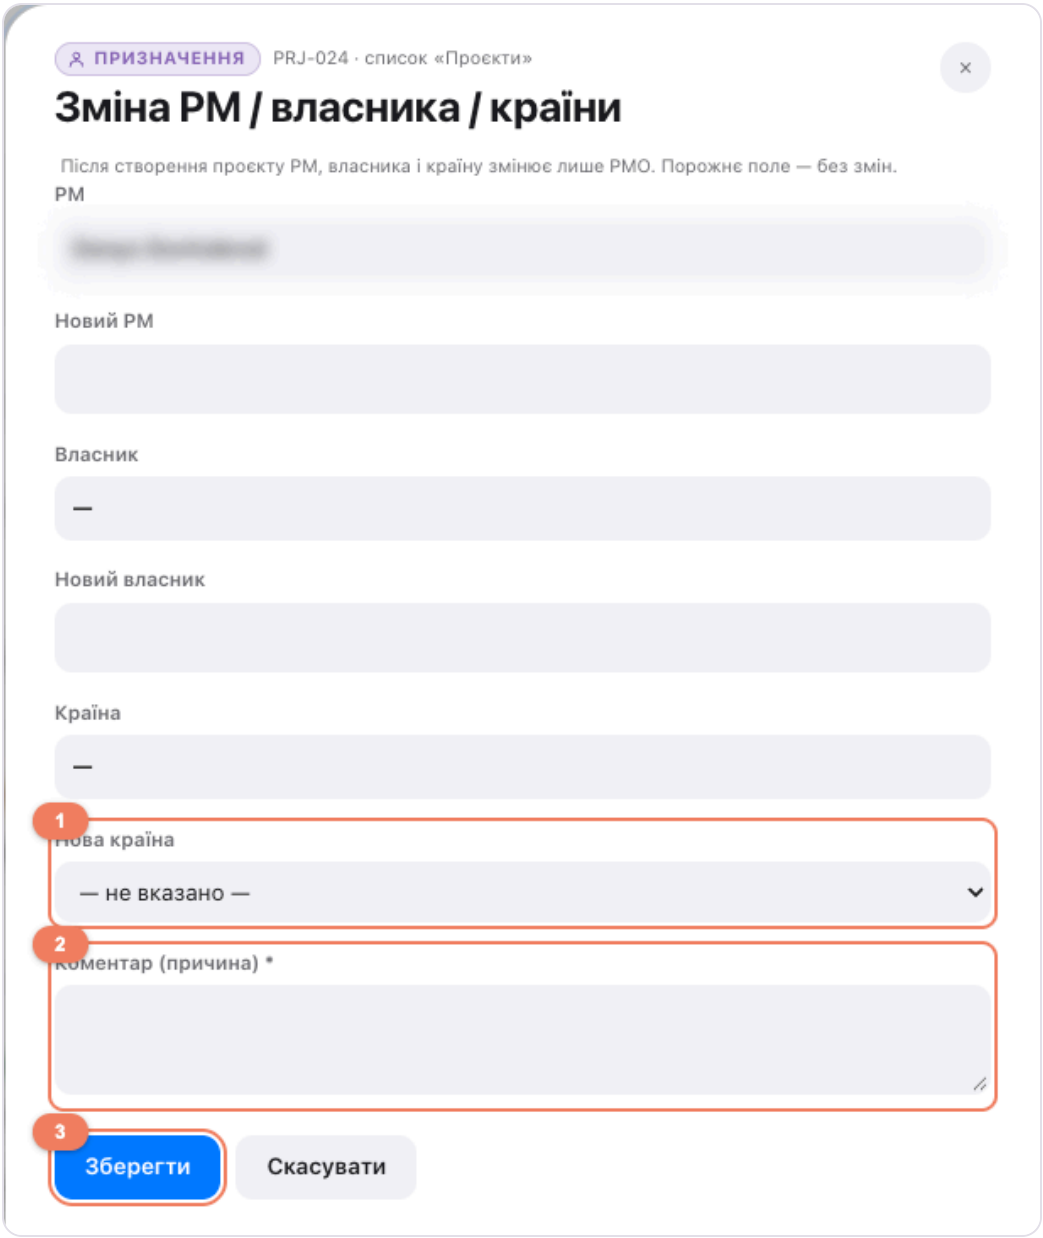

1. «Нова країна» — оберіть країну зі списку.
2. «Коментар (причина)» — обов'язково, наприклад «Початкове внесення країни».
3. «Зберегти». Поля «Новий PM» і «Новий власник» лиште порожніми — вони не зміняться.

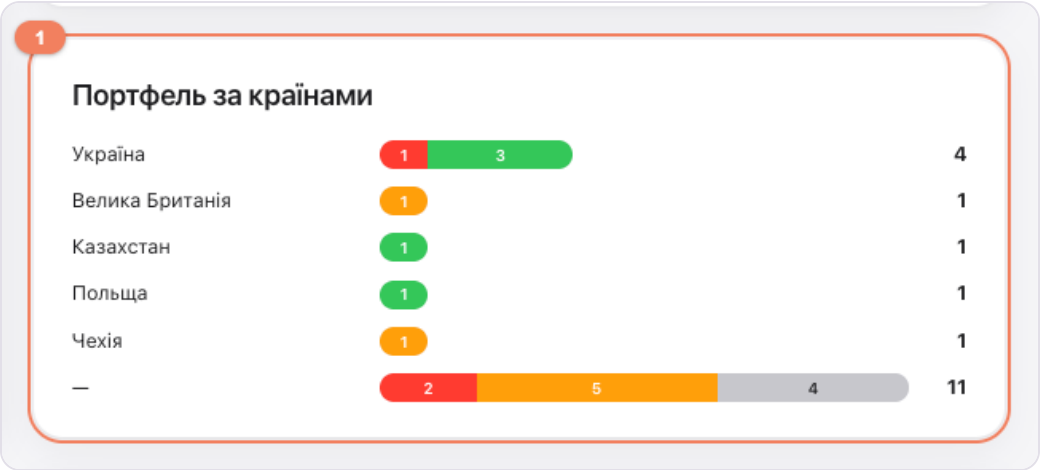

1 «Портфель за країнами»: проєкти без країни — у рядку «—». Коли рядок зникне, країну вказано всім.

---

2 **Погодьте або поверніть звіти, що вже чекають**

Зараз на погодженні 3 звіти. Перевірте оцінку «Бюджет» за правилом нижче. «Не оцінено» допустиме лише у фазах «Ініціація» і «Планування».

---

3 **Скажіть PM, що команда тепер бачить проєкт**

До 02.11 учасники «Команди проєкту» на порталі доступу до проєкту не мали. Тепер вони бачать проєкт і можуть коментувати. Попросіть PM перевірити склад команди (крок 1 для PM).

---


4 **Після звітів PM — перегляньте головну**

«Потребують рішення» показує запит лише з останнього звіту проєкту. «Високі ризики та проблеми» — відкриті записи з оцінкою від 15, зокрема проблеми.

PM ПО КОЖНОМУ АКТИВНОМУ ПРОЄКТУ

1 **Перевірте команду проєкту**

Картка → **Редагувати проєкт** → «Команда проєкту». Учасники команди тепер бачать проєкт і коментують — приберіть зайвих, додайте тих, кого бракує, вкажіть роль. Зовнішню людину спершу додають у гості через запит у хелпдеск, потім шукайте її за повною адресою пошти.

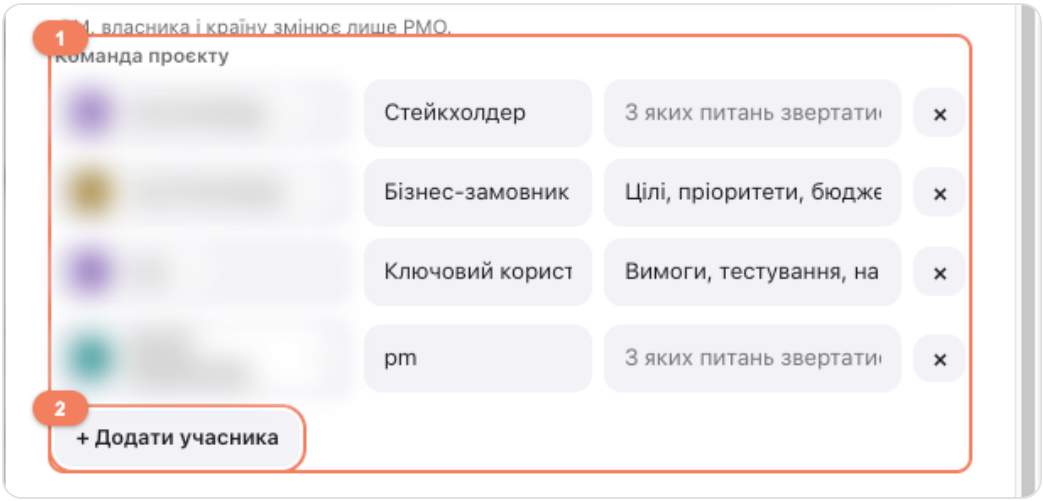

1. Рядок учасника: людина (оберіть зі списку пошуку), роль — обов'язково, з яких питань звертатися. × — прибрати.
2. «+ Додати учасника» — новий рядок. Потім «Зберегти» внизу форми.

---

2 Подайте статус-звіт із ключовими показниками


Картка → **Додати статус-звіт**. Обов'язково для 14 проєктів без жодного звіту, для решти — у найближчому звіті. Заповніть порожні показники:

- **Витрати на дату** — усі витрати проєкту разом (зовнішні витрати й робота команди) з початку проєкту, наростаючим підсумком. Невідомо — лиште порожнім.
- **Бюджет (план)** — погоджений бюджет проєкту.
- **Прогноз витрат на завершення** — скільки проєкт коштуватиме до кінця. Підказка під полем рахує прогноз за темпом витрат. На ранній фазі, поки невідомо, — порожнім.
- **Дата завершення (план)** і **Прогноз завершення**, якщо порожні.

Зміна показників вимагає поля **«Причина зміни показників»**. Для першого внесення достатньо однієї фрази.

ТАК
Початкове внесення бюджету, прогнозу витрат і дат у портал за погодженим планом проєкту.

НЕ ТАК
«Оновлено» — без пояснення, звідки цифри.

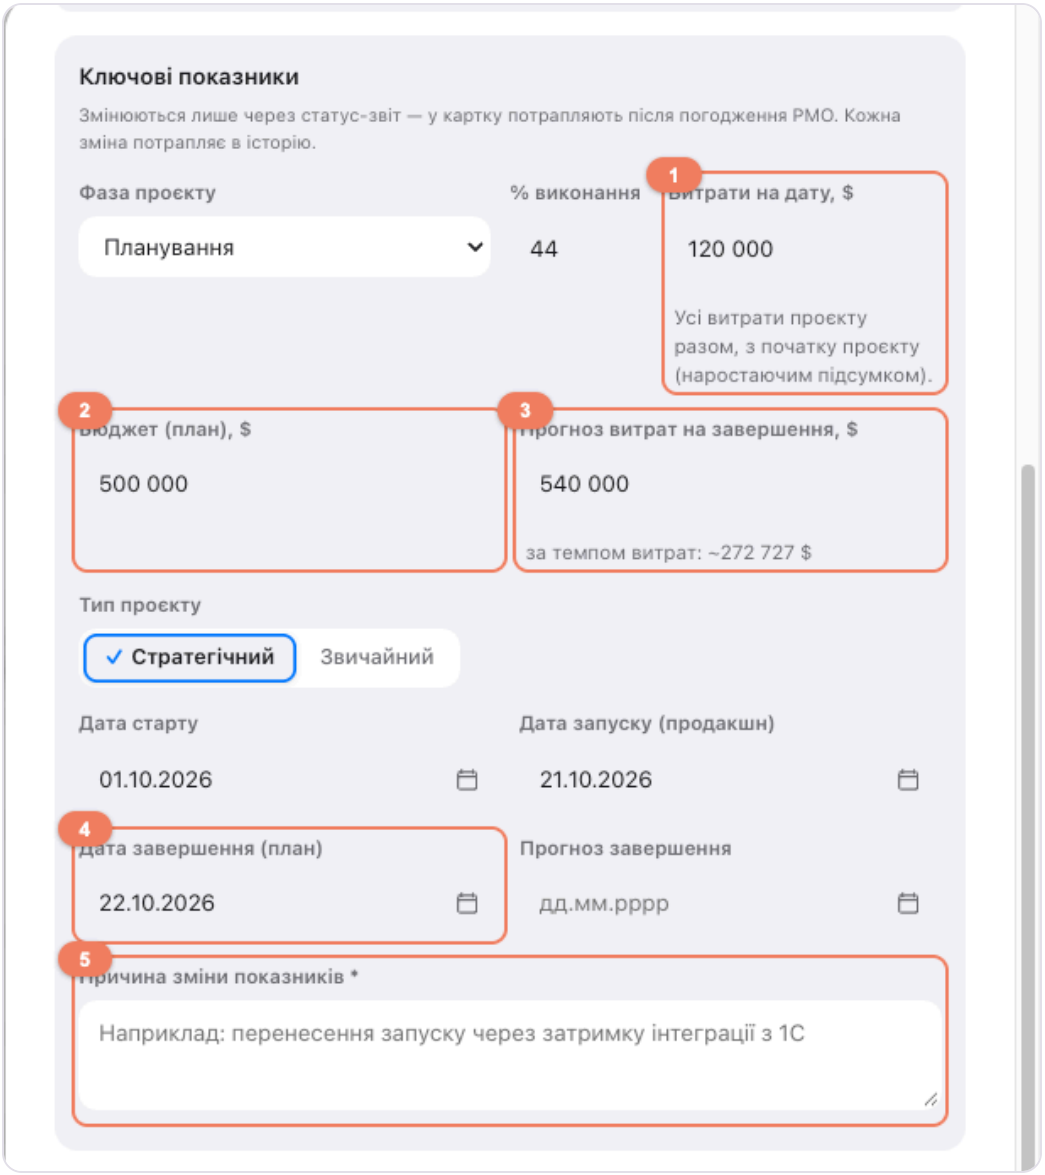

1. «Витрати на дату» — усі витрати проєкту разом, з початку проєкту. Невідомо — порожньо.
2. «Бюджет (план)» — погоджений бюджет проєкту.
3. «Прогноз витрат на завершення» — ваша оцінка; під полем — підказка «за темпом витрат».
4. «Дата завершення (план)» і «Прогноз завершення», якщо порожні.
5. «Причина зміни показників» — з'являється, коли змінено бюджет, прогноз, фазу, тип чи дати; обов'язкова.


---

3 Оцініть бюджет за правилом PMO

Оцінка «Бюджет» — за прогнозом витрат відносно бюджету (план). Портал рахує відсоток сам і показує підказку під оцінкою.

Зелений	Жовтий	Червоний
прогноз у межах бюджету	перевищення до 9%	перевищення від 10%

У фазах «Ініціація» і «Планування», поки бюджет ще не визначено, можна обрати «Не оцінено» — тоді загальний стан рахується з двох інших оцінок. З фази «Реалізація» оцінка обов'язкова.

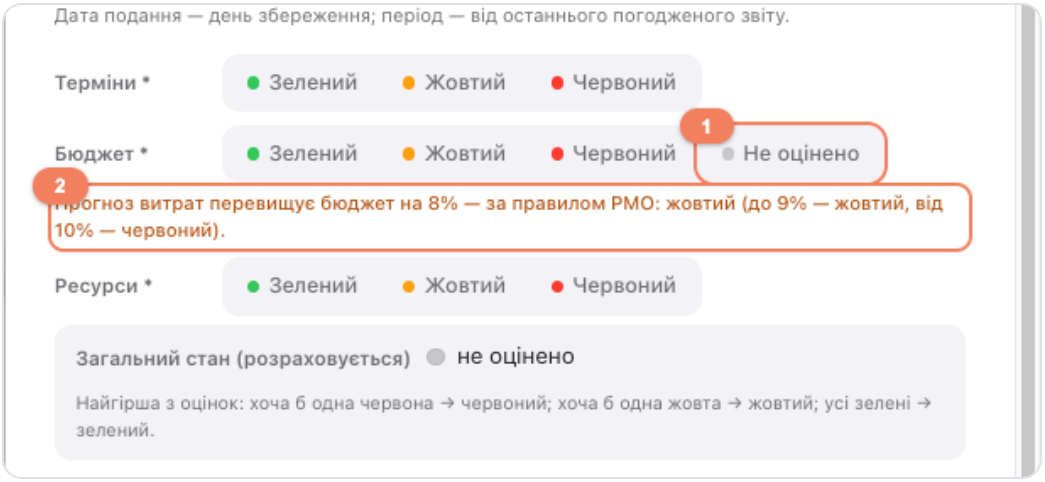


1. «Не оцінено» — є лише у фазах «Ініціація» і «Планування».
2. Підказка за правилом РМО: на скільки прогноз перевищує бюджет і яка оцінка за правилом. Обрано зеленішу — з'явиться попередження.

---

4 Зроблено і не зроблено з плану

Якщо в попередньому погодженому звіті був план, поле **«Не зроблено з плану і чому»** обов'язкове. Усе виконали — позначте `План виконано повністю`, писати «Усе виконано» вручну не треба.

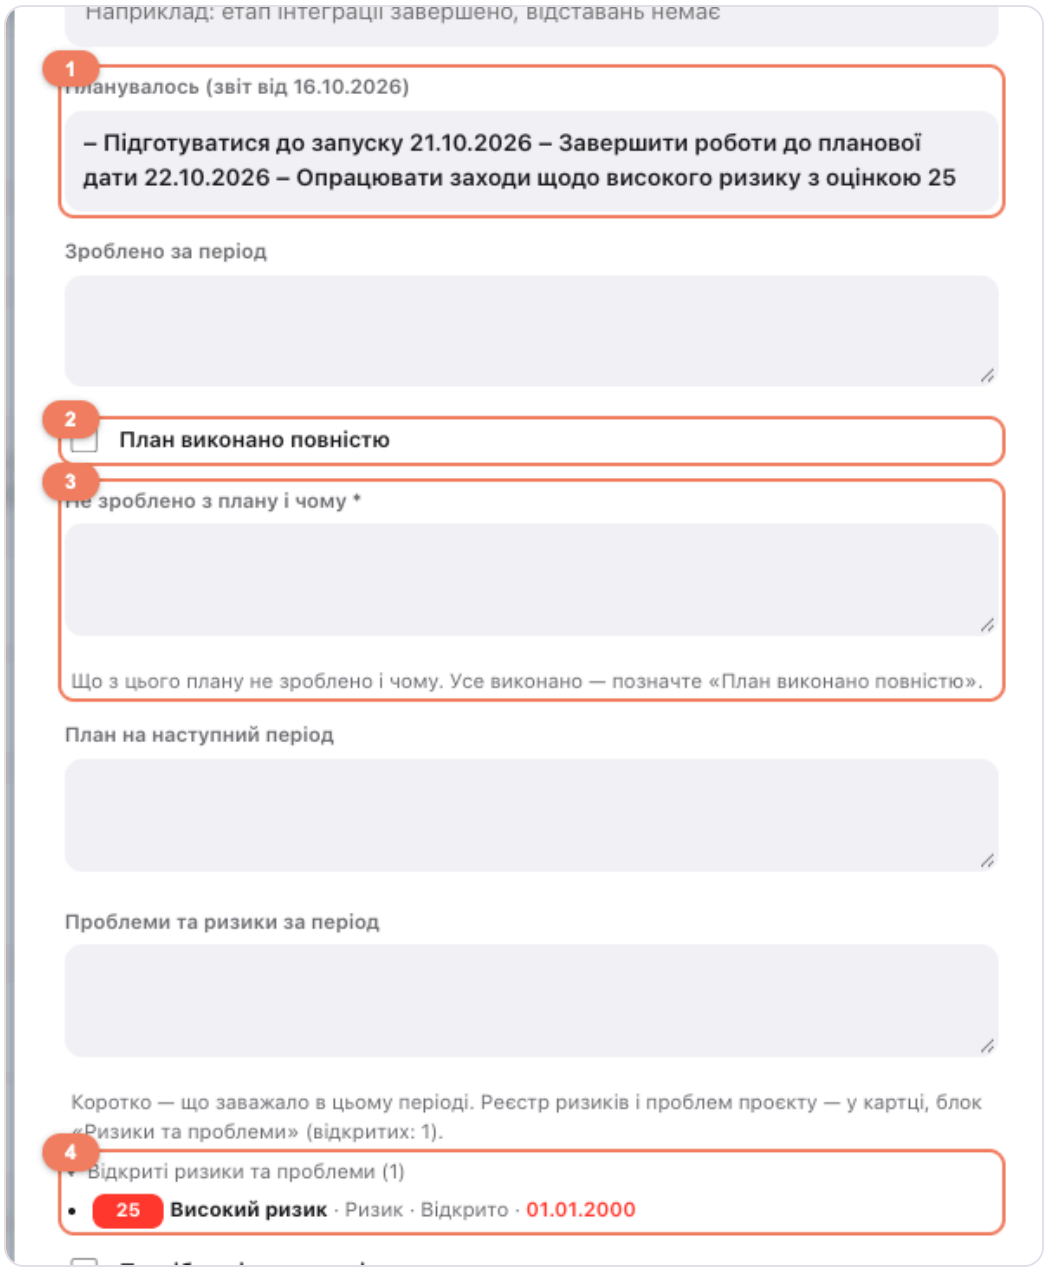


1. «Планувалось» — план із попереднього погодженого звіту, тільки для читання.
2. «План виконано повністю» — позначте, якщо все з плану зроблено.
3. «Не зроблено з плану і чому» — обов'язково, якщо позначки немає.
4. «Відкриті ризики та проблеми» — список ризиків проєкту прямо у формі; розгорніть, щоб переглянути.

---

5 Перевірте ризики й проблеми

Відкриті ризики проєкту видно прямо у формі звіту, під «Проблеми та ризики за період». Прострочені терміни (зараз 3) — закрийте запис або зробіть **Копіювати ризик** з новим терміном і закрийте старий. У нових записах власник обов'язковий; якщо відповідального ще немає — лишайте PM.



1 «Власник ризику *» — обов'язково; за замовчуванням підставлено PM.

---


6 Завершені проєкти — в архів

Фаза **Завершено — перенести в архів** (або «Скасовано…») і «Дата завершення (факт)». У «Витрати на дату» вкажіть фактичну суму на момент завершення — вона може бути меншою за план; прогноз дорівнюватиме факту.

---

7 Перевірте погоджений звіт

Після погодження PMO відкрийте звіт: у ньому видно суми на дату звіту і план, з яким порівнювали результат. Ці ж значення потрапляють у картку.

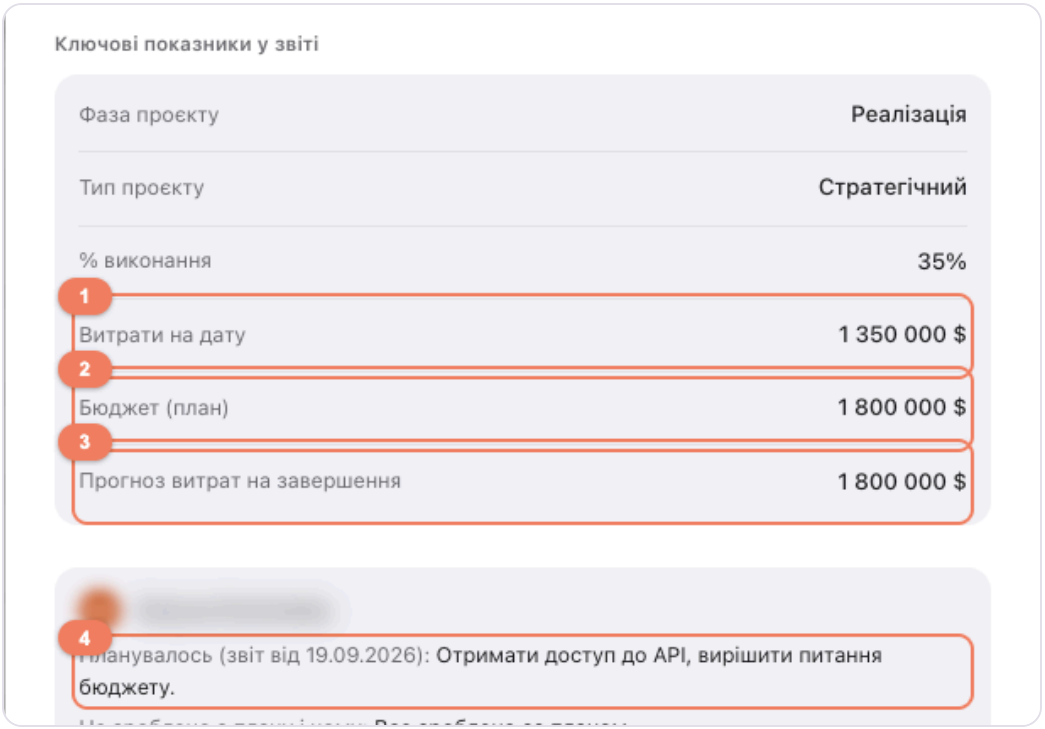

1 «Витрати на дату» на дату звіту.

2 «Бюджет (план)».


3 «Прогноз витрат на завершення». Якщо звіт суму не змінював, показано попереднє значення.

4 «Планувалось (звіт від …)» — план попереднього звіту.


КРАЇНА (БІЗНЕС-ЮНІТ) І CEO КРАЇНИ

Бізнес-юніт у порталі — це **«Країна»** проєкту. Країни й CEO веде PMO в порталі: меню під аватаром → `Країни і CEO`. Пункт бачать лише PMO і власники сайту.

- **Країну проєкту** задає PMO: при створенні проєкту, а для поточних — через «Змінити PM / власника / країну» (див. розділ PMO). У виборі — активні країни довідника.
- **CEO країни** бачить усі проєкти своєї країни і може їх коментувати. Сповіщень не отримує; проєкти в архіві — лише перегляд. Доступ з'являється протягом ~15 хвилин після збереження CEO або після того, як проєкту вказано країну.
- **Змінити CEO**: відкрийте країну → «CEO країни» → знайдіть людину за ім'ям або повною адресою пошти (кілька людей — можна), × — прибрати → «Зберегти».
- **Нова країна**: «+ Додати країну» → назва українською (обов'язково), англійською й російською (для інших мов інтерфейсу), CEO, порядок у списку → «Зберегти». Країна одразу з'являється у виборі для проєктів.
- **Вимкнути країну**: зніміть «Активна». Її не буде у виборі для нових проєктів; наявні проєкти залишаються з нею, CEO зберігає доступ до них. Видаляти країни не можна.
- **Назву наявної країни змінити не можна** — вона записана в проєктах. Щоб виправити: додайте нову країну, перепризначте проєкти («Змінити PM / власника / країну») і вимкніть стару.

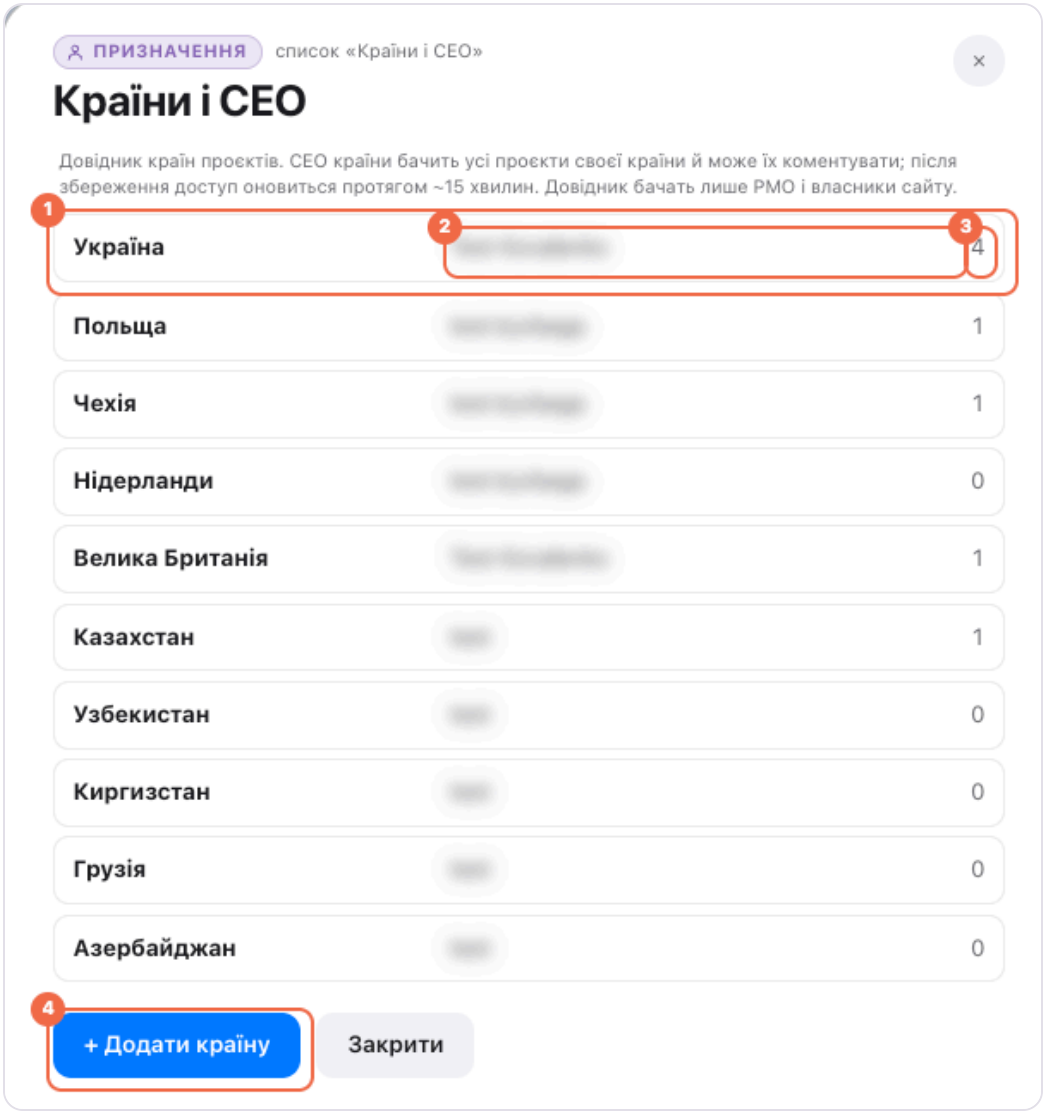

1. Рядок країни — натисніть, щоб змінити CEO, переклади, порядок чи «Активна».
2. CEO країни (одна чи кілька людей); «CEO не призначено» — ніхто не отримує доступ як CEO.
3. Кількість активних проєктів країни.
4. «+ Додати країну».

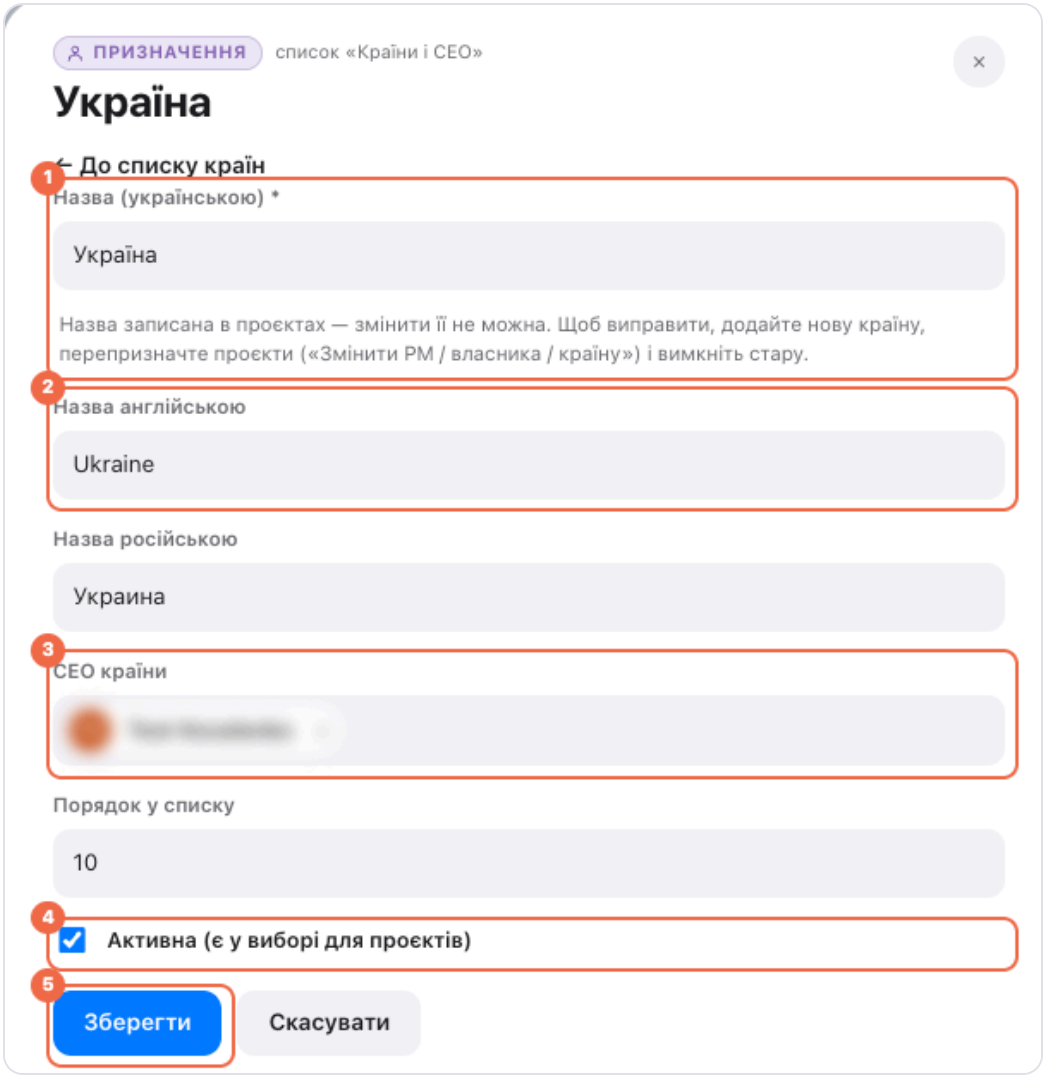

1. Назва українською — у наявної країни лише для перегляду.
2. Назви англійською й російською — для інших мов інтерфейсу; порожньо — як українською.
3. «CEO країни» — пошук за ім'ям або повною адресою пошти; × — прибрати.
4. «Активна» — є у виборі для проєктів.
5. «Зберегти» — доступ CEO оновиться протягом ~15 хвилин.

ХТО ЩО ОНОВЛЮЄ

ДАНІ	ХТО	ДЕ	КОЛИ В КАРТЦІ
Країни і CEO країн	PMO	Меню під аватаром → Країни і CEO	одразу; доступ CEO — ~15 хв
Країна	PMO	Змінити PM / власника / країну	~15 хв, з коментарем в історії
Бюджет (план), прогноз витрат, витрати на дату	PM	Статус-звіт, з причиною	після погодження PMO

ДАНІ	ХТО	ДЕ	КОЛИ В КАРТЦІ
Фаза, % виконання, дати	PM	Статус-звіт	після погодження PMO
Команда, посилання, опис, пріоритет	PM	Редагувати проєкт	одразу; доступ команди — ~15 хв
Ризики й проблеми	PM	Картка → Ризики та проблеми	одразу; в історії — ~15 хв
PM і власник	PMO	Змінити PM / власника / країну	~15 хв

ЧАСТІ ПИТАННЯ

Чому бюджет не можна змінити в «Редагувати проєкт»?

Бюджет, витрати, прогноз, фаза й дати — ключові показники. Вони змінюються лише статус-звітом і після погодження PMO, щоб кожна зміна мала причину й запис в історії.

Сума поки невідома — що писати?

Нічого: лиште поле порожнім. Порожня сума не дорівнює «0 $» на екрані, а в розрахунках рахується як нуль.

Подав звіт, а картка не змінилась.

Картка оновлюється після погодження PMO і наступного запуску синхронізації (~15 хвилин). До того звіт видно з позначкою «на погодженні».

Людина з команди пише, що не бачить проєкт.

Перевірте, що її обрано зі списку пошуку, а не набрано текстом, і зачекайте ~15 хвилин. Зовнішню людину спершу мають додати в гості через хелпдеск.

Детальніше про заповнення звіту?

Пам'ятка «Як заповнювати статус-звіт» і «Довідка» в порталі — кнопка «?» угорі праворуч.
