PPM · ДЛЯ PMO · ПРОЄКТ РІШЕННЯ · 09.11.2026

ПРОЄКТИ ПІДТРИМКИ В ПОРТАЛІ

Нова фаза проєкту «Підтримка» — для проєктів, які не завершені, а потребують постійного нагляду: помилки, обслуговування, дрібні зміни. Такі проєкти отримують свою вкладку, свій режим головної сторінки і щотижневий статус-звіт по четвергах. Поточні проєкти звітують у понеділок і четвер. Скриншоти — з прототипу на демо-даних.

КОРОТКО

1
нова фаза проєкту — «Підтримка»

3
вкладки проєктів: поточні, підтримки, архівні

2
режими головної: поточні проєкти і проєкти підтримки

пн · чт / чт
дні статус-звіту: поточні / підтримка

Права, журнал змін, сповіщення і погодження PMO працюють так само, як зараз. Нових полів у картці проєкту немає.

ЩО ТАКЕ ФАЗА «ПІДТРИМКА»


«Фаза проєкту» має сім значень: Ініціація, Планування, Реалізація, **Підтримка**, Призупинено, Завершено, Скасовано. «Підтримка» стоїть після «Реалізації»: систему запущено, а команда далі виправляє помилки, обслуговує її і робить дрібні зміни.

- Проєкт на підтримці активний. Його веде PM, як і зараз: звіти, ризики, команда, посилання.
- Контроль ручний, як у поточних проєктів: оцінки «Терміни», «Бюджет», «Ресурси» у статус-звіті, бюджет (план) і прогноз витрат.
- «Дата завершення (план)» для проєкту підтримки — кінець періоду підтримки (наприклад, договору). Коли дата минула, портал показує це на головній.
- Проєкт на підтримці не може одночасно бути «Призупинено»: пауза — це зміна фази на «Призупинено».

ЯК ПРОЄКТ ПЕРЕХОДИТЬ У ПІДТРИМКУ PM → PMO

1 PM подає статус-звіт із фазою «Підтримка»

У блоці «Ключові показники» PM вибирає «Фаза проєкту» — «Підтримка» і пише причину (обов'язково, як для будь-якої зміни фази). У тому ж звіті варто оновити «Дату завершення (план)» — кінець періоду підтримки, а також бюджет і прогноз на цей період.

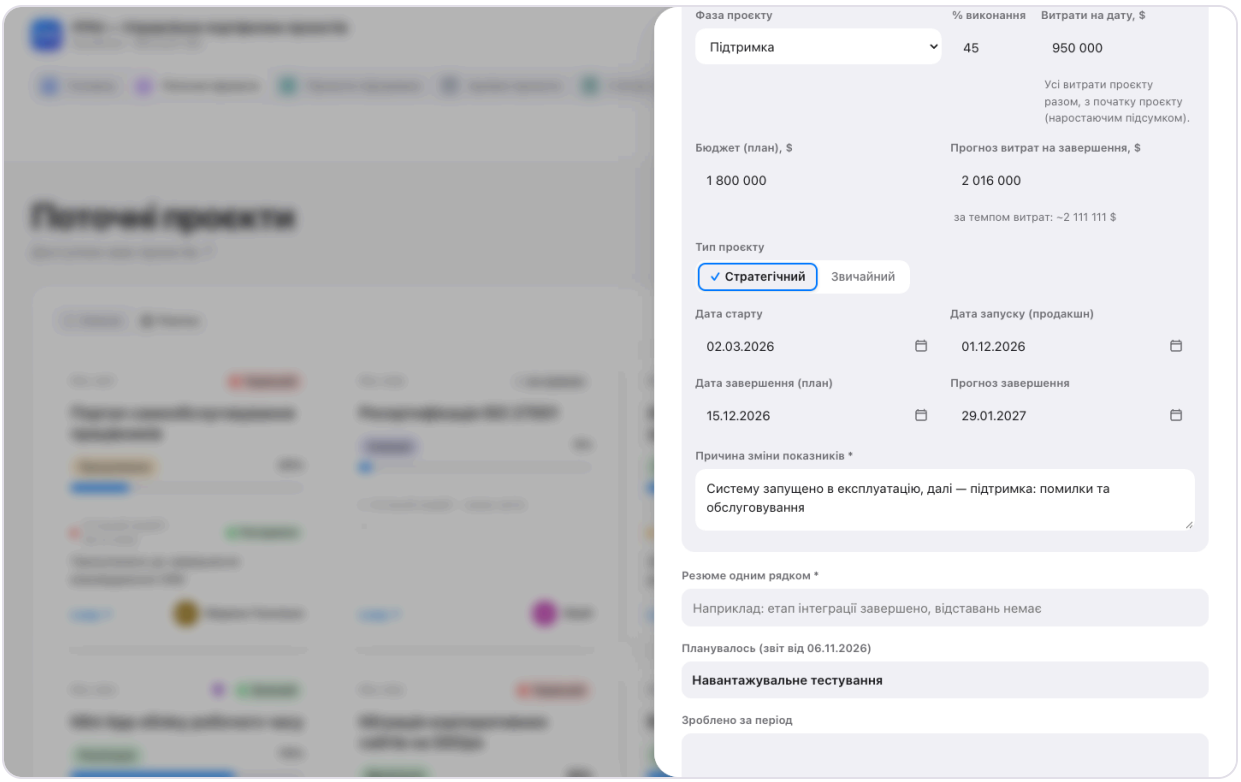

Форма статус-звіту: фаза «Підтримка», причина зміни обов'язкова.

---

2 PMO погоджує звіт

Як зараз: погодити, погодити зі зміною оцінок або повернути на доопрацювання. До погодження проєкт лишається у «Поточних проєктах».


---

3 Проєкт переходить у вкладку «Проєкти підтримки»


Після погодження фаза в картці змінюється, у журналі з'являється запис «Фаза проєкту: Реалізація → Підтримка» з причиною. З цього дня проєкт звітує щочетверга.

Назад так само: звіт із фазою «Реалізація» (велика доробка) або «Завершено» / «Скасовано» (період підтримки закінчився, проєкт іде в архів). Окремої кнопки немає.


ТРИ ВКЛАДКИ ПРОЄКТІВ



ВКЛАДКА	ЩО В НІЙ	БУЛО
Поточні проєкти	активні проєкти, крім підтримки: Ініціація, Планування, Реалізація, Призупинено	«Проєкти» (разом із майбутньою підтримкою)
Проєкти підтримки	проєкти у фазі «Підтримка»; ті самі плитки, список і представлення, що й у поточних	—
Архівні проєкти	Завершено і Скасовано, лише перегляд	«Архів»

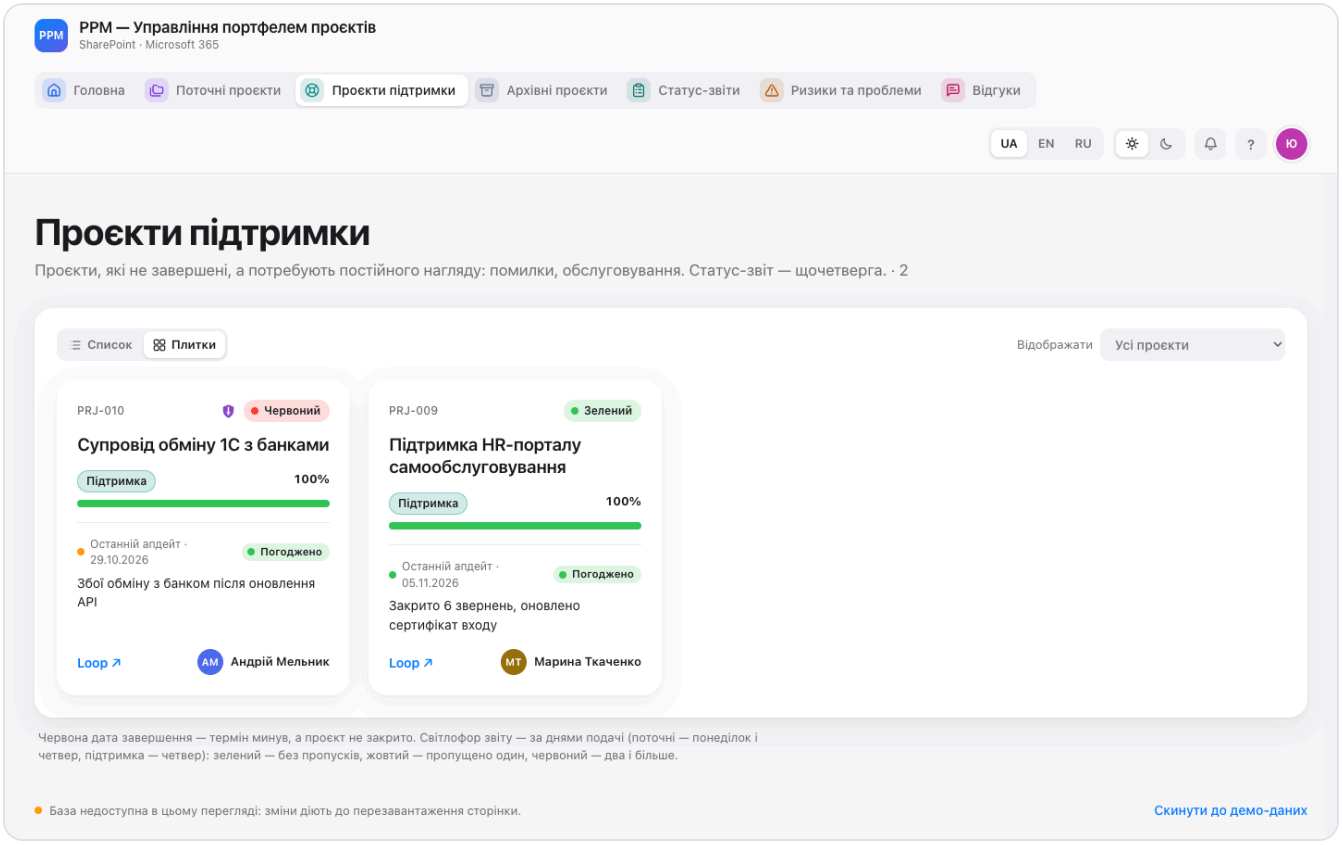


«Проєкти підтримки», плитки. Колір крапки біля дати — свіжість звіту за четвергами.

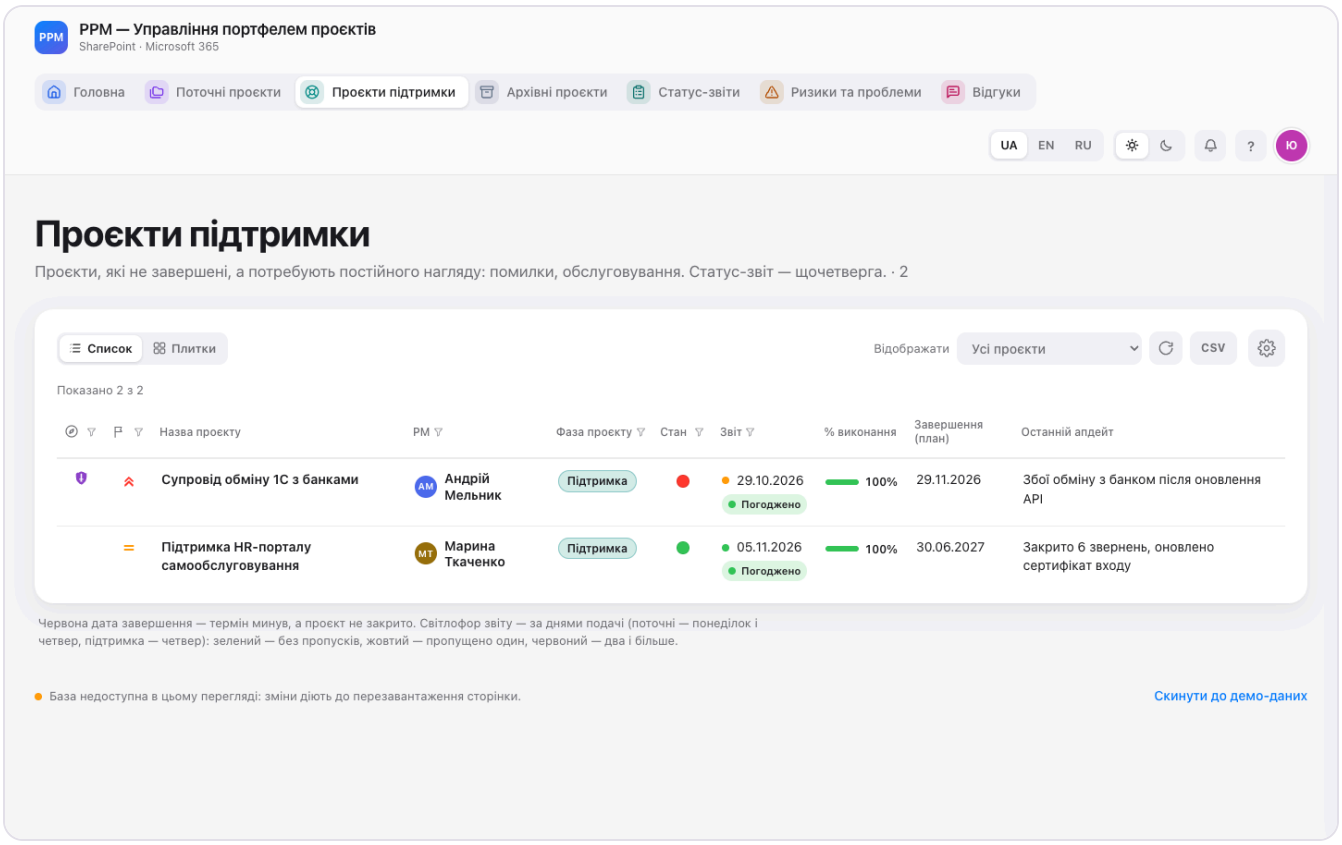

Те саме списком: колонки, фільтри, сортування і CSV — як у «Поточних проєктах».

У «Статус-звітах» і «Ризиках та проблемах» з'являються представлення за категорією: «Проєкти підтримки», «Підтримка — очікують погодження», «Підтримка — відкриті проблеми», «Поточні — очікують погодження», «Поточні — високі ризики та проблеми» тощо. Саме в них ведуть показники головної, тому число на плитці збігається зі списком.

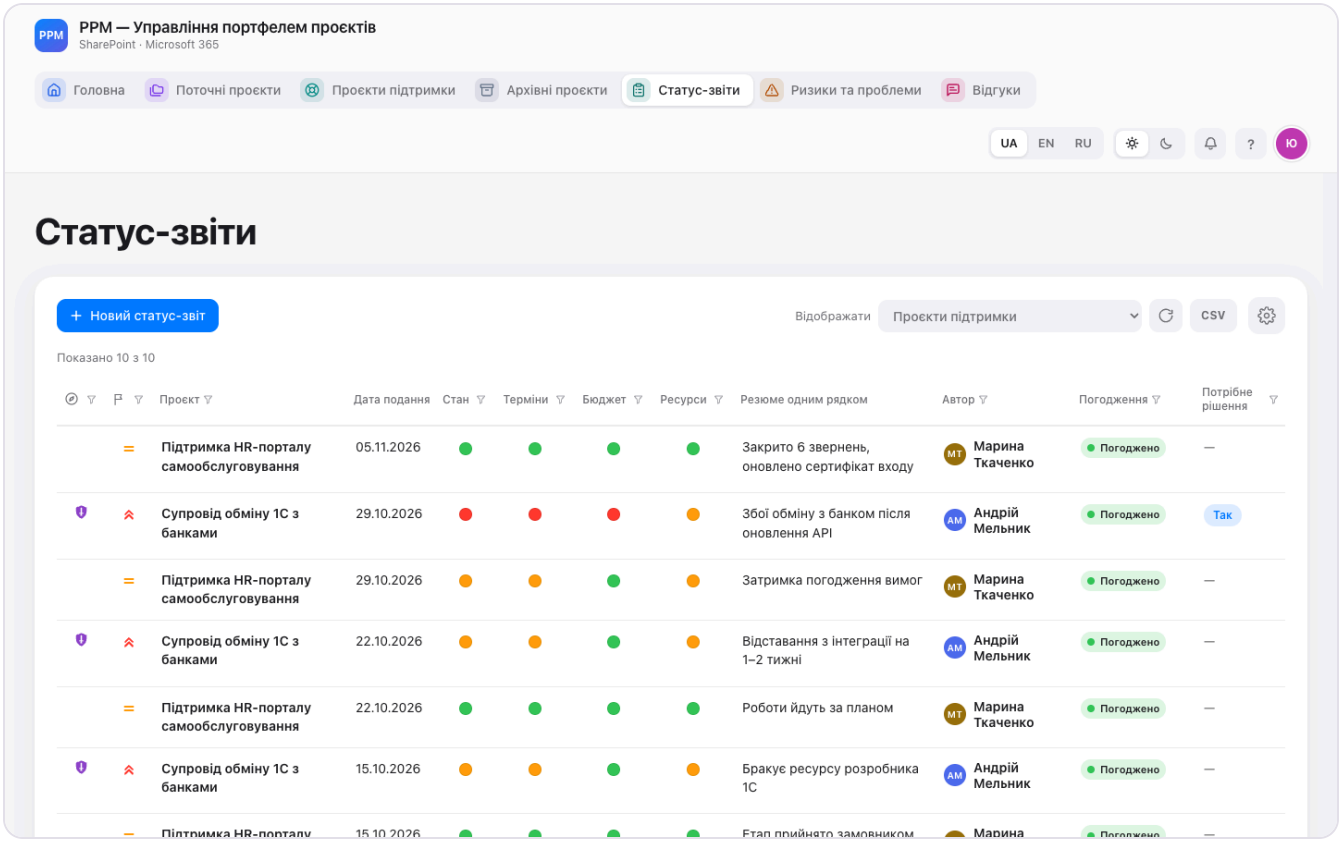

«Статус-звіти» → «Відображати: Проєкти підтримки» — щотижневі звіти.

ГОЛОВНА: ДВА РЕЖИМИ

Під заголовком — перемикач «Поточні проєкти / Проєкти підтримки» з кількістю проєктів. Портал запам'ятовує вибір. У кожному режимі всі показники, діаграми, черга погодження і таблиці рахуються лише за своїми проєктами. Кнопки «Показати все» і показники ведуть у вкладку свого режиму.

Режим «Поточні проєкти»

Те саме, що зараз, але без проєктів підтримки. Показник «Зі свіжим звітом» стає «Звіт вчасно» (за правилом днів подачі, див. нижче).

PPM — Управління портфелем проєктів
SharePoint · Microsoft 365

Головна | Поточні проєкти | Проєкти підтримки | Архівні проєкти | Статус-звіти | Ризики та проблеми | Відгуки

UA EN RU

Панель проєктів


Доступних вам проєктів: 9

+ Новий проєкт

Поточні проєкти 7 | Проєкти підтримки 2

7	14%	2	3	3
Активні проєкти	Звіт вчасно	Очікують погодження	Високі ризики та проблеми	Прострочені
	1 з 7			

Портфель за станом



- 2 Зелений
- 2 Жовтий
- 2 Червоний
- 1 не оцінено


Динаміка стану портфеля



Стан кожного проєкту на дату зрізу за останнім погодженим статус-звітом; сірий — ще немає погодженого звіту.

Карта ризиків

Показати все

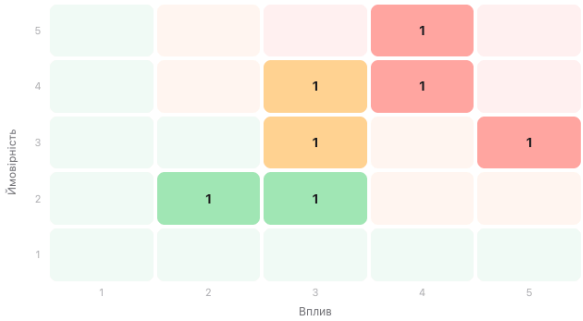

Портфель за напрямами

IT	1 1 1 1	4
Операції	1	1
Розрахунок зарплати	1	1
HR та кадрове адмініструва...	1	1

Портфель за країнами

Україна	2 1 1	4
Велика Британія	1	1
Казахстан	1	1
Польща	1	1

Найбільші зсуви термінів

Проєкт	Дата завершення (план)	Прогноз завершення	Зсув	Перенесень
Портал самообслуговування працівників	01.10.2026	30.04.2027	+211 дн.	0
Міграція корпоративних сайтів на GitOps	15.09.2026	02.11.2026	+48 дн.	1
Впровадження Twenty CRM	15.12.2026	29.01.2027	+45 дн.	1


Запуски в найближчі 7 днів

Запусків у найближчі 7 днів немає

Проблемні проєкти

Показати все

Назва проєкту	Стан	PM	Останній апдейт	Звіт
Міграція корпоративних сайтів на GitOps		АМ Андрій Мельник	Перевитрата бюджету, повторний злам двох сайтів	24.10.2026 На погодженні 07.11.2026
Портал самообслуговування працівників		МТ Марина Ткаченко	Призупинено до завершення впровадження CRM	06.10.2026 Погоджено
Автоматизація розрахунку зарплати		НШ Наталія Шевчук	Зміни законодавства потребують доопрацювання алгоритмів	03.11.2026 Погоджено

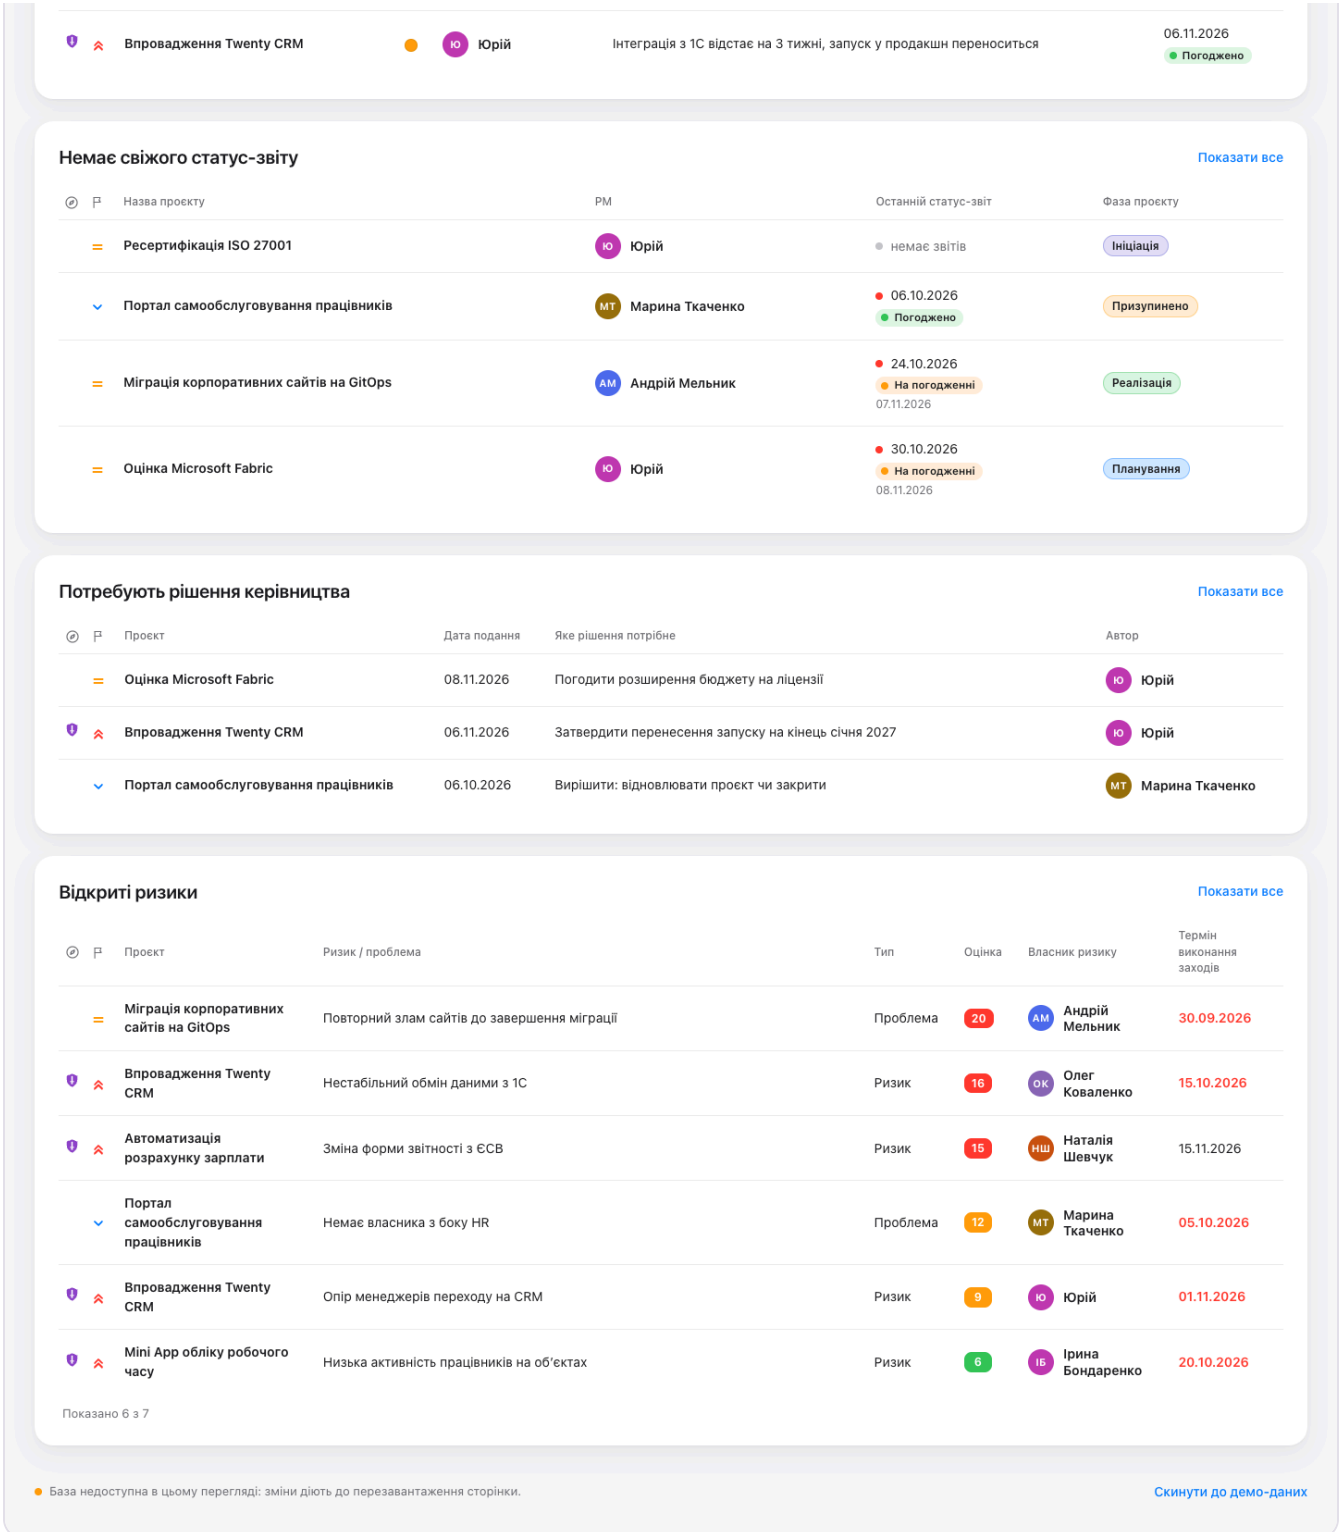

Режим «Проєкти підтримки»

БЛОК	ЩО ПОКАЗУЄ
На підтримці	скільки проєктів у фазі «Підтримка»
Звіт вчасно	частка проєктів без пропущеного четверга
Очікують погодження	звіти підтримки на погодженні (бачить PMO)

БЛОК	ЩО ПОКАЗУЄ
Відкриті проблеми	відкриті записи типу «Проблема» в реєстрі; окремо — скільки з них високих (оцінка 15–25)
Період підтримки минув	«Дата завершення (план)» уже минула; окремо — скільки спливає за 30 днів
Підтримка за станом, динаміка	кільце стану і динаміка зі зрізами щотижня
Карта ризиків, напрями, країни	як у поточних, але лише по підтримці
Період підтримки: минув або спливає за 30 днів	замість «Найбільших зсувів термінів» і «Запусків у найближчі 7 днів» — у підтримки запуску немає
Проблемні, без свіжого звіту, рішення, ризики	ті самі таблиці, лише проєкти підтримки

PPM — Управління портфелем проєктів
SharePoint · Microsoft 365

Головна | Поточні проєкти | Проєкти підтримки | Архівні проєкти | Статус-звіти | Ризики та проблеми | Відгуки

UA EN RU

Панель проєктів


Доступних вам проєктів: 9

+ Новий проєкт

Поточні проєкти 7 | Проєкти підтримки 2

2	50%	0	1	0
На підтримці	Звіт вчасно	Очікують погодження	Відкриті проблеми	Період підтримки минув
	1 з 2		з них високі: 1	спливає за 30 днів: 1

Підтримка за станом




Динаміка стану підтримки (щотижня)



Стан кожного проєкту на дату зрізу за останнім погодженим статус-звітом; сірий — ще немає погодженого звіту.

Карта ризиків

Показати все

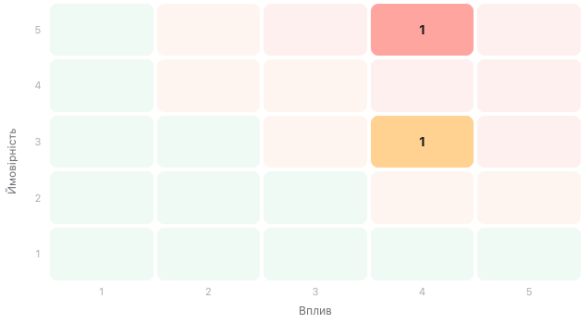

Портфель за напрямами

Фінанси	1	1
HR та кадрове адмініструва...	1	1

Портфель за країнами

Україна	1 | 1	2

Період підтримки: минув або спливає за 30 днів

Показати все

Дата завершення (план)	Проєкт	Стан	PM
29.11.2026	Супровід обміну 1С з банками		Андрій Мельник

Проблемні проєкти

Показати все

Назва проєкту	Стан	PM	Останній апдейт	Звіт
Супровід обміну 1С з банками		Андрій Мельник	Збої обміну з банком після оновлення API	29.10.2026 Погоджено

Немає свіжого статус-звіту


Показати все

Усі проєкти звітують вчасно: не більше одного пропущеного дня подачі.

Потребують рішення керівництва

Показати все

Проєкт	Дата подання	Яке рішення потрібне	Автор
Супровід обміну 1С з банками	29.10.2026	Продовжити період підтримки на 2027 рік	Андрій Мельник

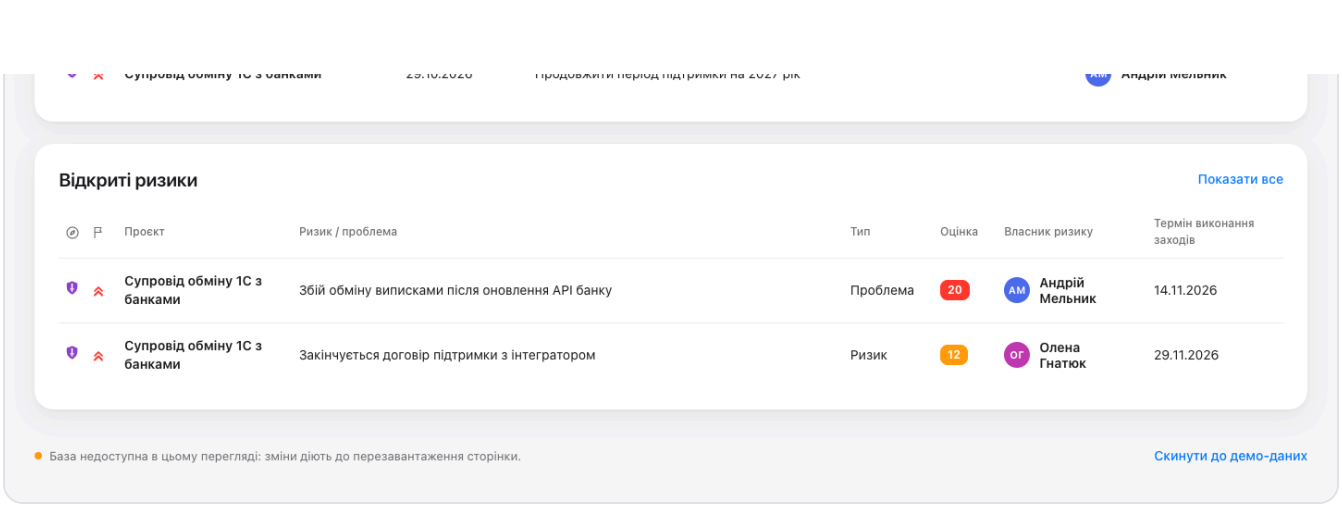

«Динаміка» поточних проєктів показує проєкти без тих, що зараз на підтримці, — за весь період. Після переведення проєктів у підтримку історія поточних перерахується. «Динаміка» підтримки на минулі дати показує проєкти, які зараз на підтримці, зокрема за звітами до переходу.

КОЛИ ПОДАВАТИ ЗВІТ І ЯК РАХУЄТЬСЯ СВІЖІСТЬ

Зараз портал вважає звіт свіжим до 8 днів. Це не відповідає практиці: PM звітують двічі на тиждень. Нове правило — за днями подачі.

Поточні проєкти	**Проєкти підтримки**	**Що рахується**
понеділок і четвер	четвер	лише погоджений PMO звіт, за датою подання

День подачі вважається пропущеним, якщо він минув, а погодженого звіту, поданого цього дня або пізніше, немає. У сам день подачі пропуску ще немає — до кінця дня.

- **Зелений** — пропусків немає
- **Жовтий** — пропущено один день подачі
- **Червоний** — два і більше; проєкт потрапляє в «Немає свіжого звіту»
- **Сірий** — погоджених звітів ще немає

Приклад: поточний проєкт, звіт поданий у понеділок

пн · звіт	вт	ср	**чт**	пт	сб	нд

До четверга включно — зелений. У п'ятницю (четвер пропущено) — жовтий. З наступного вівторка (пропущено ще й понеділок) — червоний.

Приклад: проєкт підтримки, звіт поданий у четвер

Зелений до наступного четверга включно. У п'ятницю — жовтий. Ще через тиждень, у п'ятницю, — червоний.

Звіт на погодженні


Свіжість рахується лише за погодженими звітами (рішення 09.11). Дата — день подання, тож звіт, поданий у понеділок і погоджений у середу, після погодження закриває понеділок. Поки звіт на погодженні, він не рахується: якщо РМО погоджує не в день подачі, з наступного дня проєкт жовтий, а два непогоджені звіти поспіль (понеділковий і четверговий) дають червоний, хоча РМ усе подав. Після погодження колір відновлюється. Підказка біля крапки показує дату звіту на погодженні.

Щоб колір показував дисципліну РМ, а не черги погодження, РМО погоджує звіти в день подачі.

Перевірено на 22 прикладах (дні тижня, перехід через рік, звіт поза днем подачі) — однакових для прототипу, а потім і для порталу.

НА ТЕЛЕФОНІ

Вкладки в шапці — іконками, перемикач режимів головної — під заголовком.

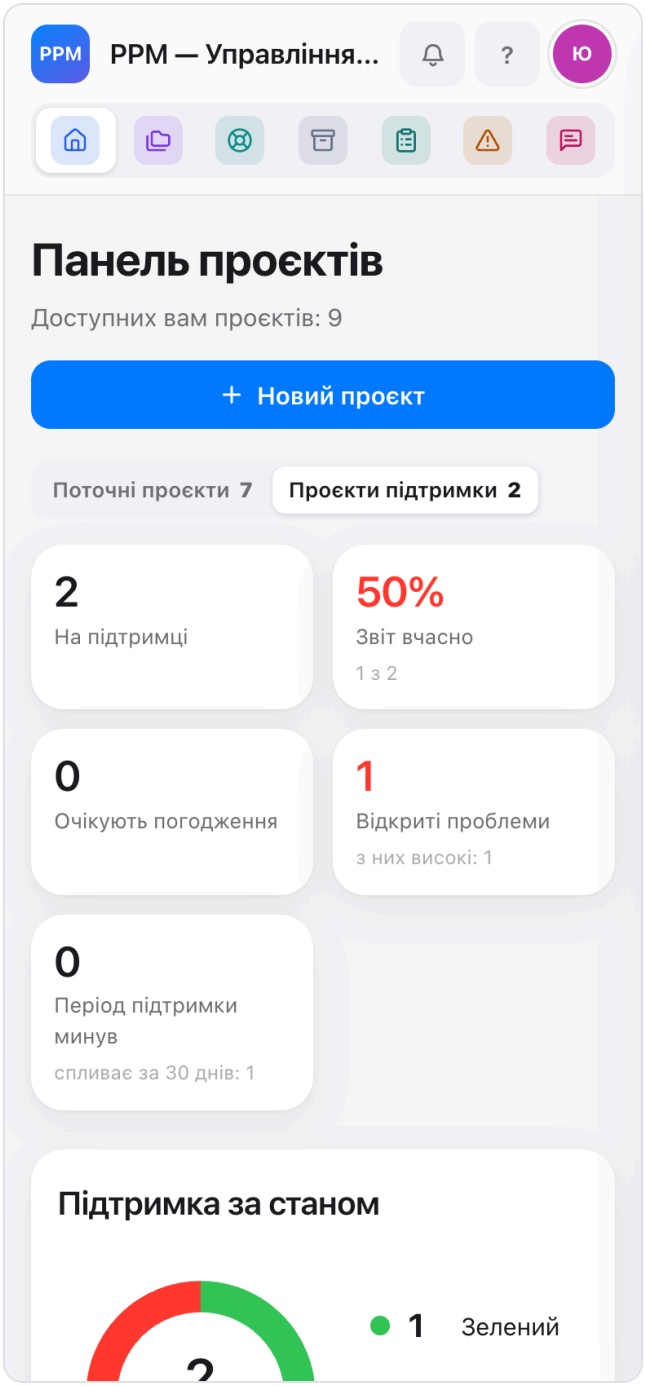

ЩО НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

- Права: проєкт підтримки редагує лише PM; керівники, власник, стейкхолдери, CEO країни — перегляд і коментарі.
- Погодження PMO, один звіт «на погодженні» на проєкт, журнал змін, сповіщення в дзвіночку.
- Поля картки і статус-звіту — ті самі.

ПІЗНІШЕ, НЕ В ЦЬОМУ ВИПУСКУ

- Години кожного ресурсу на проєкті підтримки і бюджет у межах цих годин.
- Терміни за завданнями з helpdesk (план R8).
- Нагадування листом про пропущений звіт (зараз вимкнені).

ЯК ДАЛІ

1 **PMO перевіряє цей документ**

Зауваження — власнику порталу. Окремий документ — що треба зробити команді проєктів і керівнику.

2 **Доробка порталу на тестовому сайті**

Після погодження PMO: портал, синхронізація, інструкція користувача. Перевіряє фокус-група.

3 **Випуск на робочий портал**

Після приймання на тесті — за окремим рішенням власника.
