PPM · Портфель проєктів

Что взять у LeoPPM: предложение по развитию портала PPM

Сравнение с решением LEO Consulting (leoppm.com) · 09.11.2026 · для владельца портала и PMO

Мы сравнили LeoPPM, украинскую PPM-систему на Microsoft Power Platform, с нашим порталом PPM на SharePoint Online. В документе собраны функции, которые стоит перенести к нам: что именно добавить, зачем, кому это поможет и как это ложится в нашу архитектуру. Для каждого пункта есть скриншоты обеих систем.

Содержание

1. Коротко: выводы и приоритеты
2. Что такое LeoPPM
3. Где PPM уже не хуже или сильнее
4. Предложение 1. Контрольные точки (вехи)
5. Предложение 2. Шкала стадий в карточке
6. Предложение 3. Запросы на проект и критерии отбора
7. Предложение 4. Стратегические цели
8. Предложение 5. Матрица стейкхолдеров
9. Предложение 6. Извлечённые уроки
10. Предложение 7. Пороги оценки сроков
11. Предложение 9. Новый проект на основе существующего
12. Предложение 8. Финансы по месяцам
13. Что не переносить и почему
14. План выпусков и вопросы владельцу

Источник материалов LeoPPM — открытая страница leoppm.com (раздел «Можливості», галерея «Відео-презентація рішення»), просмотр 06.11.2026. Скриншоты LeoPPM © LEO Consulting, приведены для внутреннего анализа; документ не для публикации. Скриншоты PPM — прототип с демо-данными и тестовый сайт.

1. Коротко: выводы и приоритеты

Главное. LeoPPM шире по охвату: стратегия, заявки, портфели, программы, ресурсы, Гант, финансы, интеграции. Наш портал глубже в управлении статусом: показатели проекта меняются только через статус-отчёт, PMO его согласует, сохраняется эталон ключевых полей и история с причинами, есть помощник ИИ, права выдаются по оргструктуре. Поэтому LeoPPM копировать не нужно. Стоит взять то, чего у нас нет на **входе** в портфель (заявки, связь со стратегией), **внутри** проекта (вехи, стейкхолдеры) и на **выходе** из него (уроки).

#	Что добавить	Зачем	Кому полезно	Объём*	Приоритет
1	**Контрольные точки (вехи)** в карточке и статус-отчёте	Прогресс виден по фактическим результатам, а не только по %	PM, PMO, руководители	4–6 дн.	Сначала
2	**Шкала стадий** вверху карточки, со сроком в стадии	За секунду понятно, где проект и сколько он в текущей стадии	Все	1–2 дн.	Сначала
3	**Запросы на проект** с критериями отбора и решением PMO	Прозрачный вход в портфель, отбор по единым правилам	Инициаторы, PMO, руководство	8–12 дн.	После решения
4	**Стратегические цели**: значения и связь с проектами	Видно, какие проекты работают на какую цель	CEO, руководство, PMO	6–9 дн.	После решения
5	**Матрица стейкхолдеров** (влияние × интерес, поддержка)	Подсказывает PM, с кем как работать	PM, руководители	2–4 дн.	Сначала
6	**Извлечённые уроки** при закрытии проекта	Опыт не теряется, новые проекты учатся на прошлых	PMO, PM новых проектов	3–4 дн.	Сначала
7	**Пороги оценки сроков** (как сейчас для бюджета)	Одинаковые оценки «Терміни» у всех PM	PM, PMO	1–2 дн.	Сначала
8	**Финансы по месяцам**: план, бюджет, факт	Видно, когда тратятся деньги, а не только итог	Финансы, PMO, CEO	10–15 дн.	Позже, с R5
9	**Новый проект на основе существующего**	PMO быстрее заводит типовые проекты	PMO	1 дн.	Сначала

* Объём — дни работы Claude как основного исполнителя (код, тесты, документация на трёх языках, сборка, выкладка на тест). Отдельно, по календарю: решения владельца, приёмка фокус-группой (обычно 1–2 недели на выпуск).


Рекомендация. Выпуск 1.8: пункты 2, 7, 9, 5 и 6. Это быстрые улучшения в текущей модели данных, без новых процессов. Выпуск 1.9: вехи (пункт 1), самый ценный для PMO и руководства. Запросы (пункт 3) и цели (пункт 4) брать после решения владельца о процессе: кто подаёт заявки и ведёт ли компания формализованные цели с числовыми показателями. Финансы по месяцам (пункт 8) объединить с R5 дорожной карты («план, прогноз и факт раздельно»).

Как читать предложения


Каждое предложение построено одинаково: как это сделано в LeoPPM → что есть у нас сейчас → что добавить → зачем и кому → как это ложится в нашу архитектуру (списки SharePoint, синхронизация, приложение) → объём и вопросы. Мы соблюдаем правила портала: ключевые показатели меняются только через статус-отчёт; права выдаёт синхронизация; новые поля и списки только добавляются, данные не теряются; значения хранятся на украинском и переводятся на три языка.

2. Что такое LeoPPM

Разработчик	LEO Consulting (Киев), центр компетенций по управлению проектами с 2011 года: внедрение, обучение, создание PMO.
Платформа	Microsoft Power Platform (Dataverse, model-driven Power Apps) в тенанте Microsoft 365 заказчика. Аналитика — Power BI. Планирование — MS Planner (Planner Edition) или собственный LEO Gantt (Gantt Edition).
Модель продажи	Внедрение под заказчика: первый проект за 3 дня, пилот около 20 дней, затем договор поддержки. Нужны лицензии Microsoft: Project Plan 1/3/5, Power BI, Microsoft 365.
Клиенты	Дарниця, Brocard, Acino, Credit Agricole, Велмарт, Карітас-Спес, Національна поліція и другие.
Модули (по меню)	Стратегия: звіти, стратегічні цілі, дашборди. PPM: запити на проєкт, портфелі, програми, проєкти. Артефакти: задачі, ризики, інциденти, стейкхолдери, засвоєні уроки, продукти, вигоди.
Интеграции	MS Project Online, Jira, Azure DevOps, Teams; через Power Automate и Dataflow — CRM и ERP.

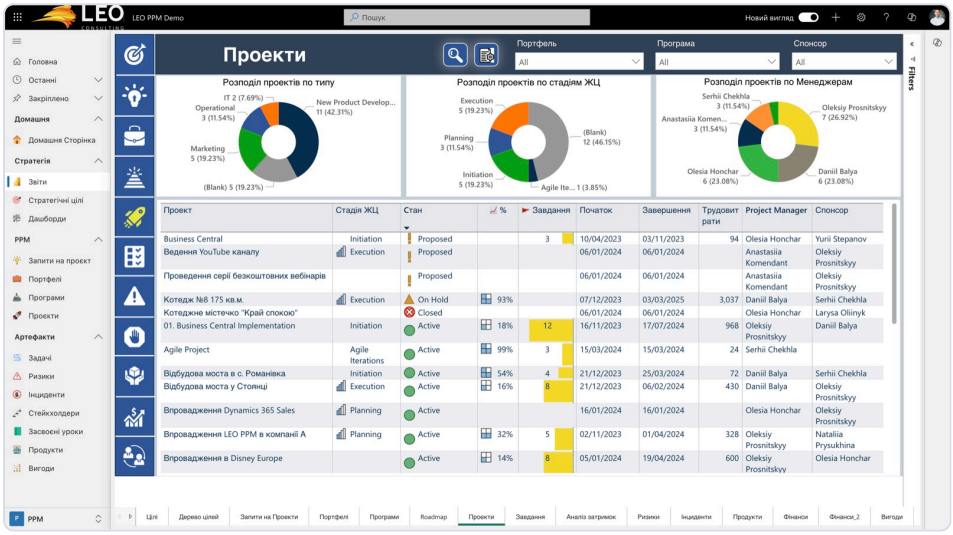

LeoPPM · реестр проектов. Слева меню модулей (Стратегія, PPM, Артефакти), сверху диаграммы Power BI по типу, стадии ЖЦ и менеджерам, внизу вкладки отчётов.

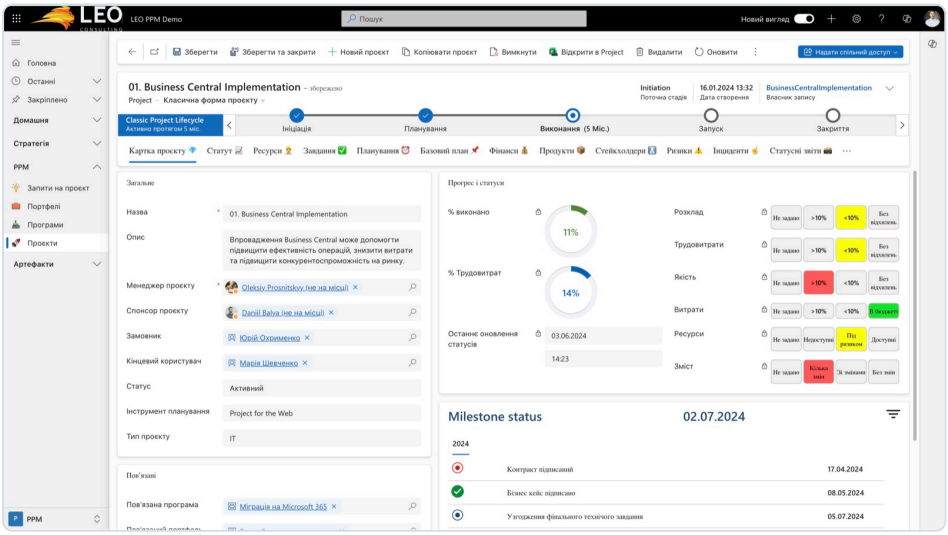


LeoPPM · карточка проекта. Шкала стадий жизненного цикла (Ініціація → Планування → Виконання (5 міс.) → Запуск → Закриття), вкладки артефактов, круговые индикаторы «% виконано / % трудовитрат», оценки по порогам (Розклад, Трудовитрати, Якість, Витрати, Ресурси, Зміст) и блок Milestone status.


3. Где PPM уже не хуже или сильнее

Эти функции переносить не нужно, у нас они есть, и часто проработаны лучше. Это важно для разговора о «покупке против своей разработки»: базовый процесс PPM у нас уже закрыт.


Возможность	LeoPPM	PPM (наш портал)
Статус-отчёт	Вкладка «Статусні звіти», оценки по порогам	Отчёт — единственный способ изменить ключевые показатели. Общее состояние считается как худшая из трёх оценок, причина изменения обязательна, есть план прошлого периода и «не сделано из плана»
Согласование PMO	Не видно на скриншотах	В карточку попадает только согласованный отчёт. PMO меняет оценки с комментарием или возвращает отчёт; эталон откатывает правки в обход отчёта
Риски	Матрица влияние × вероятность, стратегия реагирования	То же самое (5×5, оценка P×I, стратегия) плюс карта рисков портфеля на главной и проверка помощником ИИ, что высокие риски упомянуты в отчёте
История изменений	«Централизованное управление изменениями с фиксацией истории»	Журнал «было → стало» с причиной и автором, события согласования, назначений и подачи отчётов
Доступ	Роли Dataverse	Автоматически по оргструктуре Entra ID: PM, его руководители, собственник, команда, CEO страны. В карточке видно «кто видит проект»
Аналитика портфеля	Power BI (отдельная лицензия)	Встроена на главной: состояние, динамика за 12 недель, карта рисков, сдвиги сроков, запуски, запросы решений руководства
Помощник ИИ	Нет	Черновик отчёта и проверка противоречий (пилот, Copilot Studio)
Стоимость владения	Лицензии Project Plan и Power BI, договор поддержки	Только Microsoft 365 и Azure Automation, развитие — своими силами

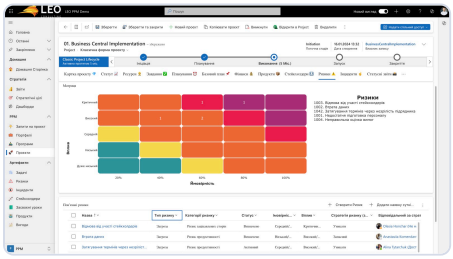

LeoPPM · риски проекта: матрица и реестр.

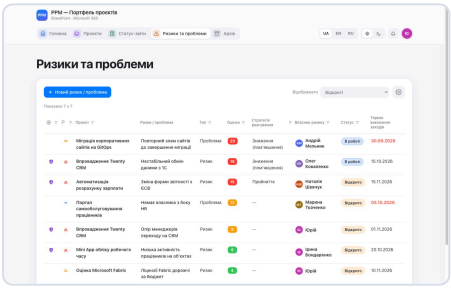


PPM · «Ризики та проблеми»: реестр по всему портфелю, оценка P×I, стратегия, просроченные меры подсвечены красным.

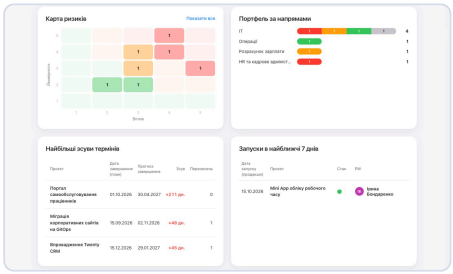


PPM · главная: карта рисков портфеля, сдвиги сроков, запуски в ближайшие 7 дней. В LeoPPM подобное собирается в Power BI.

4. Предложение 1. Контрольные точки (вехи)

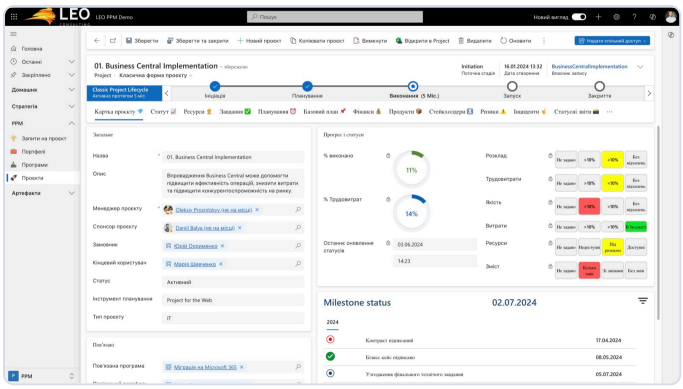

LeoPPM: блок «Milestone status» в карточке. Каждая веха с датой и значком «выполнено / не выполнено / в работе».

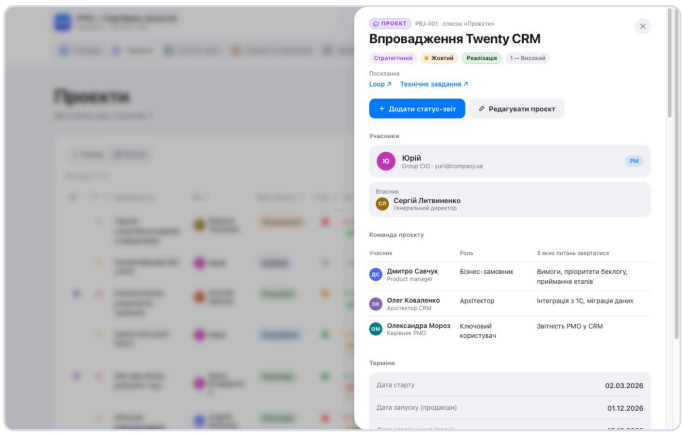

PPM сейчас: в карточке есть сроки (старт, запуск, план, прогноз) и % выполнения, но промежуточных результатов нет.

Что добавить

- Список **«Контрольні точки»** проекта: название, плановая дата, фактическая дата, статус (Заплановано / Виконано / Під загрозою / Пропущено), ответственный.
- В **карточке** блок «Контрольні точки»: лента вех с цветными отметками и просрочкой в днях.
- В **статус-отчёте** блок «Контрольні точки за період»: PM отмечает выполненные вехи и переносит даты (перенос с причиной, как для других дат).
- На **главной** блок «Контрольні точки в найближчі 14 днів» и «Пропущені», рядом с «Запусками».

Зачем

Процент выполнения — субъективная оценка PM. Вехи показывают проверяемые результаты: «договор подписан», «ТЗ согласовано». У руководителя появляется ответ на вопрос «что конкретно должно было случиться и случилось ли». В отчёте PMO видит пропущенную веху ещё до того, как сдвинется дата завершения.

Кому полезно


PMO — раннее предупреждение и предмет разговора с PM. **Руководители и CEO** — понятный язык результатов. **PM** — структура плана и аргумент при переносе сроков.

Как ложится в архитектуру


- Новый список `Lists/Milestones` (поля `msProject`, `msPlan`, `msActual`, `msStatus`, `msOwner`), записи в папках `P<ID>`, права наследуются от проекта.
- Плановые даты вех — ключевые показатели: меняются через статус-отчёт, переносит синхронизация после согласования, история попадает в журнал «Зміни показників». Эталон получает снимок вех.
- Общие векторы `tests/cases/milestones.json` для синхронизации, приложения и прототипа.

Вопрос владельцу: вехи вводит PM свободно или из шаблона по типу проекта? Рекомендация — свободно, шаблоны позже.

5. Предложение 2. Шкала стадий в карточке

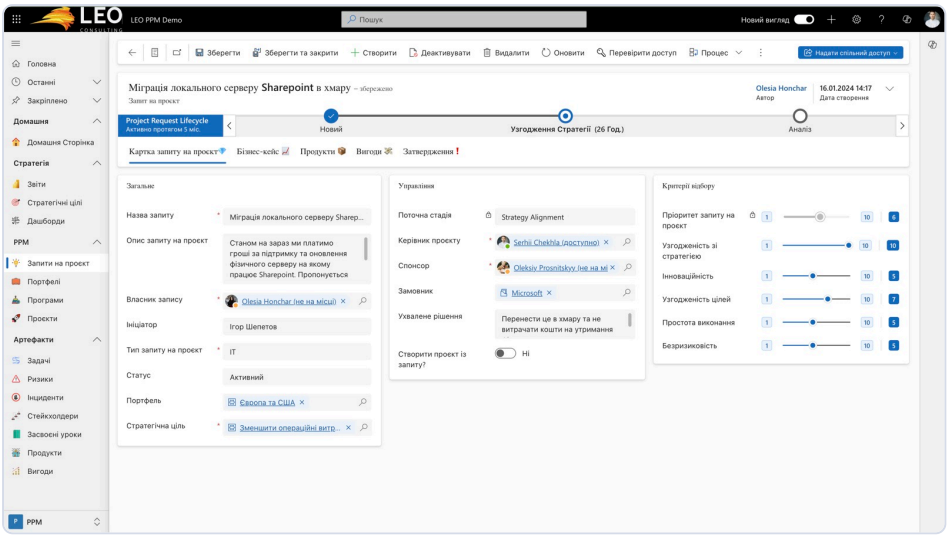

LeoPPM: шкала стадий процесса («Новий → Узгодження стратегії (26 год.) → Аналіз») с подсветкой текущей стадии и временем в ней. Такая же шкала есть в карточке проекта.

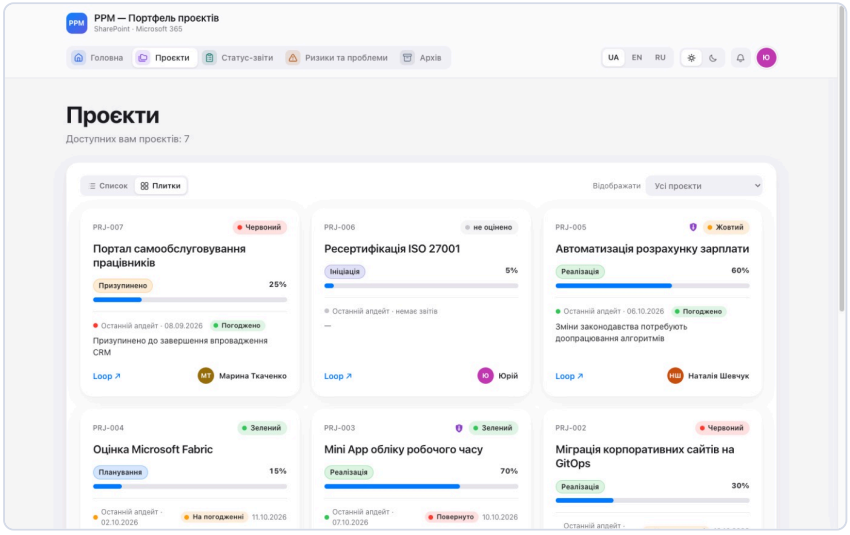

PPM сейчас: фаза показана меткой («Реалізація», «Планування»), но не видно, какие фазы пройдены и сколько проект находится в текущей.

Что добавить

Под заголовком карточки — горизонтальная шкала наших фаз: **Ініціація** → **Планування** → **Реалізація** → **Завершено**. Пройденные отмечены галочкой, текущая подсвечена, под ней «в фазе 5 міс.». «Призупинено» и «Скасовано» — отдельная метка поверх шкалы. При наведении на пройденную фазу видны даты входа и выхода.


Зачем и кому

Всем, кто открывает карточку, — мгновенная ориентация. **PMO** видит «застрявшие» проекты: «в Ініціації 7 месяцев» — повод для разговора. Данные уже есть в журнале «Зміни показників» (смены статуса), новых полей не нужно.

Как ложится в архитектуру

Только приложение и прототип: чистая функция `logic/phaseTrack.ts` по журналу, векторы в Jest и тест прототипа в jsdom. Синхронизацию и модель данных не трогаем. На телефоне шкала сворачивается до «Фаза 2 из 4 · 5 міс.».

6. Предложение 3. Запросы на проект и критерии отбора

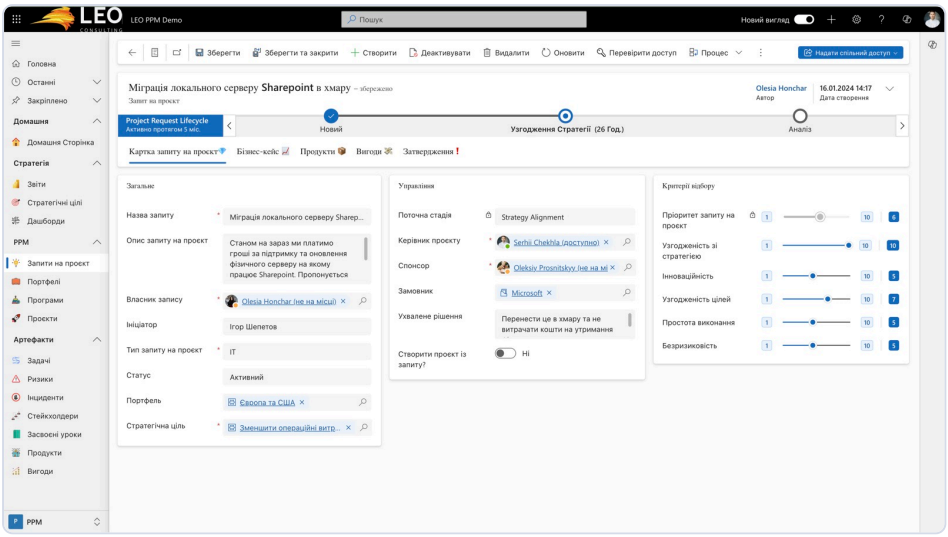

LeoPPM · карточка «Запит на проєкт»: описание, инициатор, портфель и стратегическая цель, руководитель и спонсор, решение, переключатель «Створити проєкт із запиту». Справа — «Критерії відбору» по шкале 1–10: Пріоритет, Узгодженість зі стратегією, Інноваційність, Узгодженість цілей, Простота виконання, Безризиковість. Вкладки «Бізнес-кейс», «Вигоди», «Затвердження».

PPM сейчас: проект создаёт только PMO («Новий проєкт»). Идея до этого момента живёт в письмах и разговорах, критериев отбора и истории отклонённых идей нет.

Что добавить

1. Вкладка **«Запити»**: любой участник сайта подаёт запрос (название, проблема и ожидаемый результат, инициатор, направление, страна, оценка бюджета и сроков, связь с целью — после пункта 4).
2. **Оценка PMO** по критериям 1–5 с весами (стратегия, ценность, срочность, сложность, риск), итоговый балл и рейтинг запросов.
3. **Решение**: Прийнято → синхронизация создаёт проект в «Ініціації», PM и владелец — из решения, ссылка на запрос в карточке; Відхилено / Відкладено — с комментарием, инициатор получает уведомление.

Зачем

Отбор проектов по единым правилам и сравнение идей между собой, а не «кто громче». Видна очередь на вход в портфель, отклонённые идеи с причиной не возвращаются по кругу.

Кому полезно


Инициаторы (руководители направлений) — понятный путь «как запустить проект» и статус своей заявки. **PMO** — входящий поток в одном месте и аргументы для отбора. **Руководство** — рейтинг кандидатов на проектный комитет.

Как ложится в архитектуру


- Новые списки `Lists/ProjectRequests` и `Lists/RequestDecisions` (решение — отдельной записью PMO, как «Погодження звітів»). Права: автор видит свой запрос, PMO — все.
- Синхронизация: новый раздел «запрос принят → проект», идемпотентно по ID запроса, плюс эталон и журнал «Створення».
- Сейчас участник без проектов видит пустой портал, поэтому для запросов нужна отдельная точка входа и решение, кому её показывать.

Вопросы владельцу: кто может подавать запросы (все сотрудники или руководители направлений)? Какие критерии и веса? Нужен ли этап «Бізнес-кейс» до решения?

7. Предложение 4. Стратегические цели

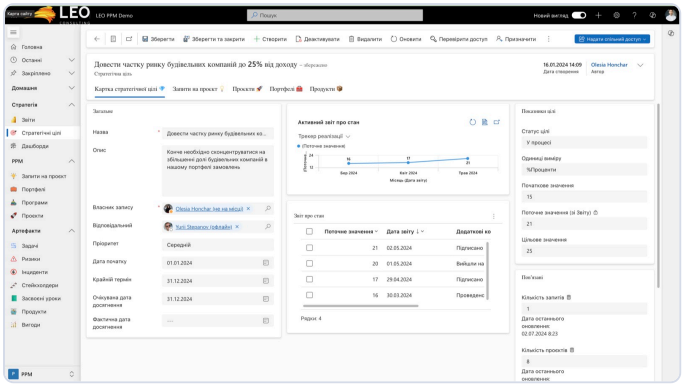

LeoPPM · карточка цели: «Довести частку ринку… до 25%», ответственный, сроки, начальное / текущее / целевое значение, тренд по датам, связанные запросы, проекты и портфели.

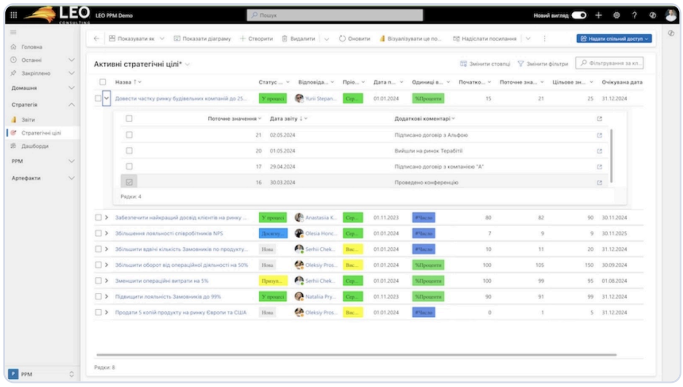

LeoPPM · реестр целей: статус, ответственный, приоритет, единица измерения, начальное, текущее и целевое значения, история значений.

> **PPM сейчас:** есть только признак «Стратегічний» (тип проекта) и щит в списках. Связать проект с конкретной целью компании нельзя.

Что добавить

- Справочник **«Стратегічні цілі»** (ведёт PMO): название, ответственный (CEO / директор), единица измерения, начальное, текущее и целевое значения, срок, статус.
- Поле **«Стратегічна ціль»** в проекте (ставит PMO при создании, потом через «Призначення») и в запросе на проект.
- Обновление текущего значения цели — ответственный или PMO, с датой и комментарием (история значений).
- Главная и отдельный экран «Цілі»: прогресс к цели, сколько проектов работает на цель и их состояние («цель на 60 %, из 4 проектов 2 красные»).

Зачем и кому


CEO и руководство видят, на что тратится проектный ресурс и подкреплена ли каждая цель проектами. **PMO** получает критерий для отбора запросов (пункт 3) и аргумент для приостановки проектов «без цели». Пользователи LeoPPM (Велмарт) называют связь проектов со стратегией главной причиной внедрения.

Как ложится в архитектуру


Справочник по образцу «Назви країн / Країни» (1.7.11): пишет приложение от имени PMO, читают все. `pmGoal` — lookup, ключевое поле эталона. Метрика проекта не трогается.

Вопрос владельцу: есть ли у компании утверждённые цели с числовыми показателями? Если нет, начать с простого справочника целей без значений: только связь и группировка.

8. Предложение 5. Матрица стейкхолдеров

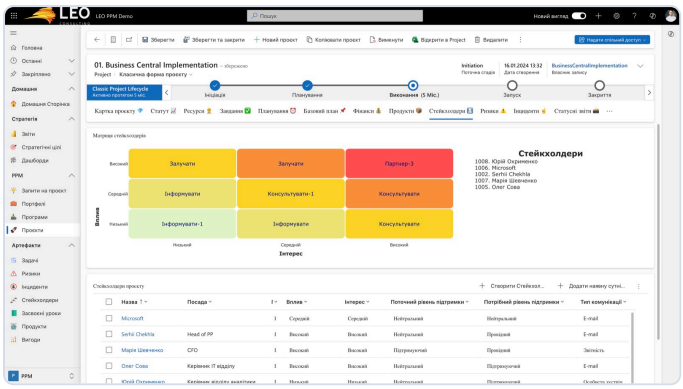

LeoPPM · стейкхолдеры проекта: матрица влияние × интерес с тактикой в ячейках (Залучати / Консультувати / Інформувати), реестр с должностью, текущим и требуемым уровнем поддержки, способом коммуникации.

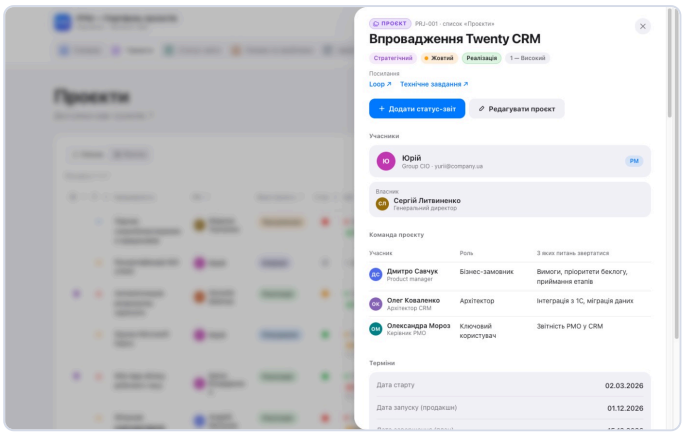

PPM сейчас: «Команда проєкту» с ролью и вопросами, по которым обращаться. Нет оценки влияния и отношения к проекту.

Что добавить

- В «Команді проєкту» необязательные поля **Вплив** и **Інтерес** (Низький / Середній / Високий), **Підтримка зараз** и **Потрібна підтримка** (Опір / Нейтральний / Підтримує / Лідер).
- Мини-матрица 3×3 в карточке с подсказкой тактики: высокий влияние и интерес — «Залучати», высокое влияние — «Задовольняти», высокий интерес — «Інформувати», остальные — «Моніторити».
- Подсветка разрыва «поддержка ниже нужной у влиятельного» — сигнал PM и повод для упоминания в отчёте (это может проверять помощник ИИ).

Зачем и кому

PM — простой инструмент работы со стейкхолдерами, которого сейчас нет. **Руководители PM** видят, где проекту нужна их помощь («финдиректор против — нужен разговор на уровне CEO»). Изменение небольшое: поля добавляются в существующий список.

Оценка отношения людей к проекту — чувствительная информация. Предлагаем показывать её только PM, его руководителям и PMO, а не всей команде (через отдельное поле с ограниченным выводом в приложении). Вопрос владельцу.

9. Предложение 6. Извлечённые уроки

LeoPPM: в меню «Артефакти» есть отдельный реестр «Засвоєні уроки». Скриншота нет в галерее, функция видна в меню на всех экранах (см. скриншоты выше).

PPM сейчас: проект уходит в архив через отчёт «Завершено / Скасовано». Опыт остаётся в головах и разрозненных комментариях.

Что добавить

- В статус-отчёте с фазой «Завершено» или «Скасовано» — обязательный блок **«Уроки проєкту»**: что сработало, что нет, что рекомендуете следующим (1–5 пунктов, у каждого категория: Терміни / Бюджет / Команда / Підрядники / Вимоги / Технології).
- Уроки можно добавлять и в ходе проекта (кнопка в карточке).
- Реестр **«Уроки»** с поиском и фильтром по направлению, типу и категории. При создании нового проекта PMO и PM видят подсказку: «Похожие проекты: 3 урока».


Зачем и кому

PMO — база знаний компании и материал для стандартов. **PM новых проектов** — чужие ошибки до старта. **Руководство** — повторяющиеся проблемы («подрядчики срывают сроки в 4 проектах из 6»).


Как ложится в архитектуру

Список `Lists/Lessons` в папках проектов. Права: читают все участники портала, кто видит проекты; у архивных проектов уроки должны оставаться видимыми для PMO и PM. Уроки из отчёта переносит синхронизация при согласовании. Помощник ИИ может предлагать черновик уроков по истории проекта.

10. Предложение 7. Пороги оценки сроков

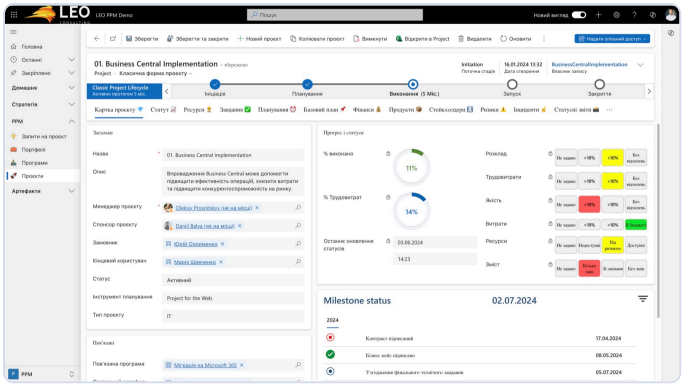

LeoPPM: оценка каждого измерения по шкале порогов: «Не задано / >10% / <10% / Без відхилень». Цвет определяется отклонением, а не ощущением PM.

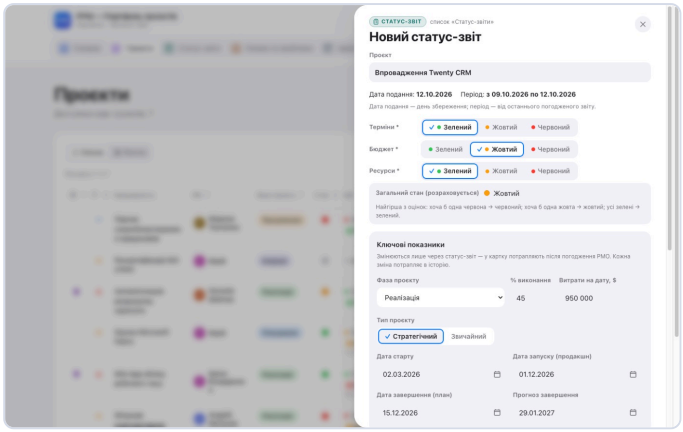

PPM сейчас: PM ставит зелёный, жёлтый или красный сам. Для бюджета портал подсказывает порог (до 9 % — жёлтый, от 10 % — красный), для сроков подсказки нет.

Что добавить

Подсказка для «Терміни» по отклонению прогноза завершения от плана, как сейчас для бюджета: например, сдвиг до 10 % длительности проекта (или до 14 дней) — жёлтый, больше — красный. Если PM ставит цвет лучше рассчитанного, форма предупреждает (сохранить не мешает), а PMO видит расхождение при согласовании.

Зачем и кому

PMO — сопоставимые оценки по всем проектам. **PM** — меньше споров о цвете. **Руководство** — «жёлтый» значит одно и то же во всех проектах. Помощник ИИ уже ловит «зелёные сроки при прогнозе позже плана»; порог делает правило явным и доступным без ИИ.

Как ложится в архитектуру


Чистая функция в `logic/`, общие векторы `tests/cases/schedule-threshold.json` (прототип и приложение), текст в «Довідці» на трёх языках. Порог утверждает PMO.

11. Предложение 9. Новый проект на основе существующего

> **LeoPPM:** кнопка «Копіювати проєкт» на панели карточки (см. скриншот карточки).

Что добавить: в форме «Новий проєкт» (только PMO) — «На основі…»: копируются тип, приоритет, направление, страна, описание как шаблон, команда (роли и вопросы), ссылки; показатели, отчёты и риски не копируются. **Кому:** PMO, когда заводит серию однотипных проектов (внедрения по странам, открытия объектов). **Объём:** около дня, только приложение.

12. Предложение 8. Финансы по месяцам

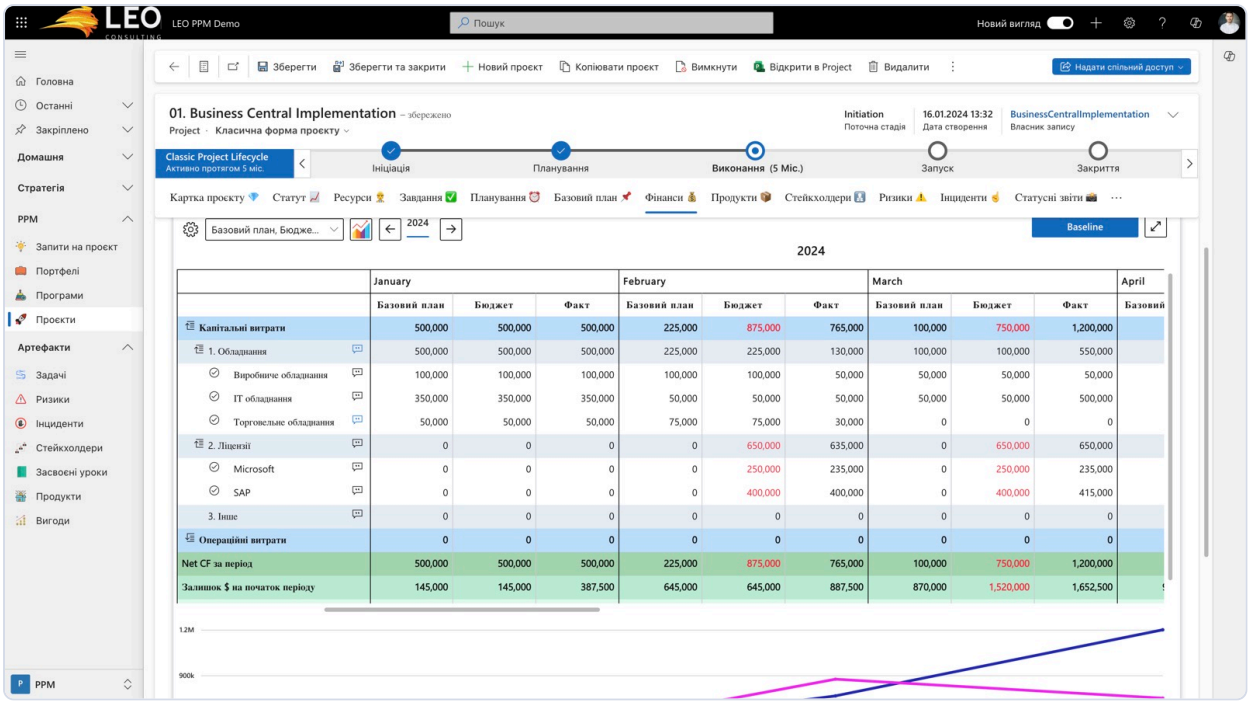

LeoPPM · финансы проекта: помесячная таблица «Базовий план / Бюджет / Факт» по статьям (капитальные: оборудование, лицензии; операционные), чистый денежный поток за период, остаток, график накопления.

> **PPM сейчас:** итоговые суммы проекта — бюджет (план), прогноз затрат на завершение, затраты (факт) нарастающим итогом — меняются через отчёт с причиной (с 1.7.7).

Что добавить (вариант)

План расходов по месяцам (и, при необходимости, по 2–4 статьям) при утверждении бюджета, факт за месяц — в статус-отчёте. В карточке — график «план / прогноз / факт нарастающим итогом».


Зачем и кому

Финансы и CEO — когда понадобятся деньги (cash flow портфеля по месяцам). **PMO** — раннее отклонение темпа расходов, а не только итоговое.


Почему позже

- Объём большой (10–15 дней), меняет форму отчёта и эталон.
- Нужен источник факта: ввод PM или выгрузка из учётной системы. Ручной ввод по месяцам и статьям — нагрузка на PM.
- Совпадает с R5 дорожной карты («план / прогноз / факт раздельно») и с R6 (данные в Azure SQL для отчётности). Делать вместе, по отдельной спецификации и после решения PMO и финансов, нужен ли помесячный разрез.

13. Что не переносить и почему

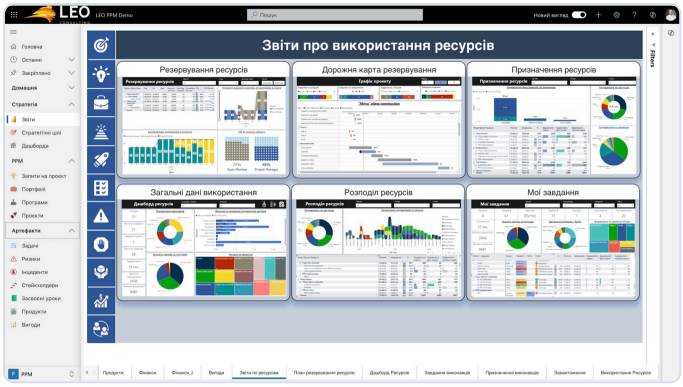

LeoPPM · отчёты по ресурсам (Power BI): резервирование, дорожная карта резервирования, назначения, распределение и загрузка исполнителей.

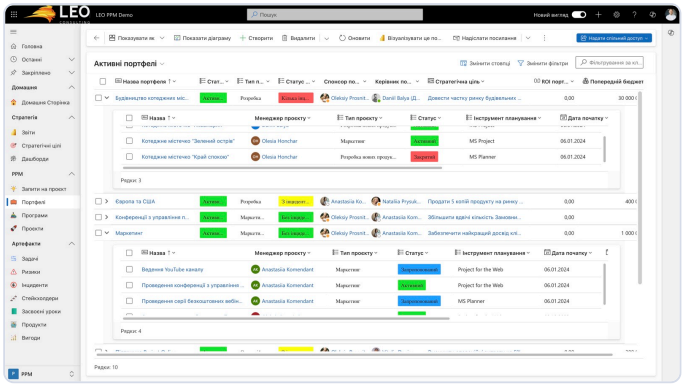

LeoPPM · портфели с вложенными проектами, статус и стратегическая цель портфеля.

Функция LeoPPM	Почему не переносим	Что у нас вместо
Гант, задачи, MS Planner	Это планирование работ внутри проекта, а наш портал — уровень портфеля. Свой Гант — месяцы работы и конкуренция с MS Project / Planner, которые PM уже используют	Ссылки на план в «Посилання» (Loop, Planner, Project); вехи (пункт 1) — уровень, нужный портфелю
Ресурсы и загрузка	Требуют учёта трудозатрат по задачам, которого в компании нет. Без него отчёты пустые	Оценка «Ресурси» в статус-отчёте
Портфели и программы как отдельные сущности	При нашем числе проектов это лишний уровень администрирования	«Батьківський проєкт» (вложенность любая), направления, страны; группировка на главной
Power BI	Отдельные лицензии и вторая точка входа	Встроенная аналитика на главной; при росте — R6 (Azure SQL), тогда Power BI станет естественным
Интеграции с MS Project Online, Jira, Azure DevOps	Нет запроса от PM; Microsoft объявила о выводе Project Online из эксплуатации	R8 (хелпдеск / Service Desk) в далёкой перспективе
Инциденты, продукты, вигоди	Инциденты у нас — «Проблема» в реестре рисков. Продукты и выгоды — тема для пункта 4 (цели), если он пойдёт	Реестр «Ризики та проблеми»

14. План выпусков и вопросы владельцу

Выпуск	Состав	Работа Claude	Ожидание (календарь)	Кто помогает
1.8 «Быстрые улучшения»	2 Шкала стадий · 7 Пороги сроков · 9 На основе проекта · 5 Матрица стейкхолдеров · 6 Уроки	8–12 дней	1–2 недели приёмки фокус-группой	PMO: порог сроков, категории уроков; владелец: видимость оценок стейкхолдеров
1.9 «Вехи»	1 Контрольные точки (карточка, отчёт, главная)	4–6 дней	1–2 недели	PMO: статусы вех, нужен ли шаблон
2.0 «Вход в портфель»	4 Стратегические цели · 3 Запросы на проект	14–20 дней	решение руководства о процессе; пилот 2–4 недели	Владелец, CEO: цели и показатели; PMO: критерии и веса
позже	8 Финансы по месяцам — вместе с R5 / R6	10–15 дней	согласование с финансами	Финансовый директор, PMO

Каждый выпуск идёт по порядку работы проекта: план в `docs/superpowers/plans/` → ревью → одобрение владельца → ветка → тесты и общие векторы → тестовый сайт → PR → прод только по решению владельца. Выпуски не конфликтуют с R9–R12 из дорожной карты; рекомендуем вставить 1.8 после текущих R11 и R12.

Вопросы владельцу

1. Согласны с составом и порядком выпусков 1.8 → 1.9 → 2.0?
2. Вехи: плановые даты вех — ключевые показатели (меняются только через отчёт)? Рекомендация — да.
3. Стейкхолдеры: кто видит оценки поддержки и влияния? Рекомендация — PM, его руководители, PMO.
4. Запросы на проект: кто подаёт (все сотрудники или руководители направлений) и какие критерии отбора?
5. Стратегические цели: есть ли утверждённые цели с числовыми показателями и кто ответственный за обновление значений?
6. Финансы по месяцам: нужен ли этот разрез финансам и PMO, или достаточно итоговых сумм?

Итог. LeoPPM подтверждает, что наш базовый процесс (карточка, статус-отчёт с согласованием, риски, история, права, аналитика) соответствует рыночному PPM, а местами сильнее. Главное, чего у нас нет, — связь портфеля со стратегией и управляемый вход проектов (запросы, цели), промежуточные результаты (вехи) и сохранение опыта (уроки). Пять быстрых улучшений выпуска 1.8 дают заметную пользу за 2–3 недели без изменения процессов. Вехи и вход в портфель — следующий шаг после решений владельца.
