




Портфель проєктів

Огляд системи: навіщо вона, з чого складається і як нею користуються РМ, керівники та РМО.

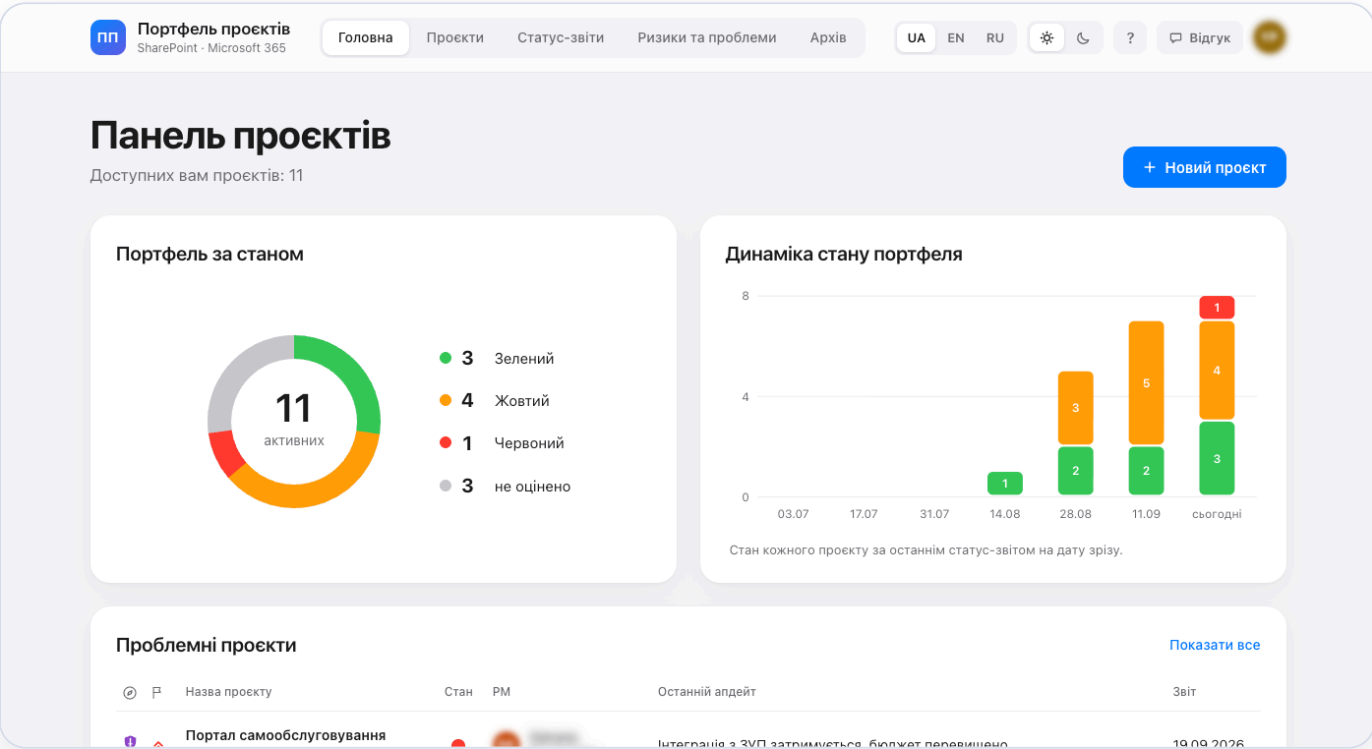

Навіщо

Портфель проєктів — єдине місце, де компанія веде всі проєкти: хто відповідає, у якому вони стані, що змінилося і де потрібне рішення керівництва. Замість таблиць, листів і нарад «що там з проєктом» — одна картка проєкту й регулярний статус-звіт РМ.

Один стан портфеля

Головна показує, скільки проєктів зелених, жовтих і червоних, як це змінювалося за 12 тижнів і що потребує уваги.

Зміни — лише через статус-звіт

Статус, стан, % виконання, дати й витрати змінюються тільки звітом РМ; причина обов'язкова, усе потрапляє в історію.

Прозорість для керівництва

Керівник бачить проєкти своїх підлеглих автоматично — за оргструктурою Microsoft 365, без ручного налаштування доступу.

Контроль ризиків

Ризики й проблеми з оцінкою «ймовірність × вплив», власником і терміном; прострочене виділяється.

Запити на рішення

РМ позначає у звіті «Потрібне рішення керівництва» — запит одразу видно на головній і в окремому поданні.

Там, де всі працюють

У браузері на комп'ютері, на телефоні й планшеті, згодом — у Microsoft Teams. Три мови: українська, англійська, російська.

Хто що бачить і що може

Роль	Бачить	Може
РМ проєкту	свій проєкт	редагувати картку, здавати статус-звіти, вести ризики, коментувати
Керівники РМ (за оргструктурою)	проєкти підлеглих	переглядати й коментувати
Власник, стейкхолдери та їхні керівники	проєкти, де роль мають вони або їхні підлеглі	переглядати й коментувати
РМО	усі проєкти	створювати нові проєкти й призначати РМ; решту — переглядати й коментувати (у своїх проєктах як РМ — редагувати)
Інші співробітники	порожній портал	—

Завершений проєкт переходить в архів і стає лише для перегляду для всіх. Керівника бачать за полем «Керівник» у Microsoft 365: CEO бачить усе, бо CIO — його підлеглий; фінансовий директор — лише проєкти, де роль має він або його підлеглі.

3 чого складається

Система побудована повністю на Microsoft 365 компанії: дані зберігаються в SharePoint, доступ і оргструктура — з Microsoft Entra ID. Зовнішніх сервісів і баз немає.

Користувачі

- браузер на комп'ютері
- телефон і планшет (iOS, Android)
- Microsoft Teams — наступний етап

Застосунок порталу

- головна сторінка сайту SharePoint на весь екран
- головна, проекти, статус-звіти, ризики, архів, картка й форми
- працює від імені користувача — показує лише дозволене

Списки SharePoint

- Проекти
- Статус-звіти
- Ризики та проблеми
- Коментарі
- Зміни показників (журнал)

Користувач → застосунок → списки SharePoint ← синхронізація за розкладом ← оргструктура Microsoft Entra ID


Компонент	Що робить
Застосунок (SharePoint Framework)	Інтерфейс порталу: сторінки, картка проекту, форми статус-звіту, ризику, проекту й коментаря. Збережене видно на екрані одразу.
Списки SharePoint	Усі дані порталу. Звичайні списки лишаються для адміністраторів, вивантаження в Excel і Power BI.
Синхронізація	Кожні 15 хвилин у робочий час: переносить статус-звіт у картку проекту, веде журнал змін, відправляє завершені проекти в архів, видає права за оргструктурою, оновлює «Доступ до картки». Раз на тиждень — повний перерахунок прав.
Microsoft Entra ID	Облікові записи, керівники, посади — джерело прав за ієрархією.
Відгуки (лише тест)	Кнопка «Відгук»: текст, скриншоти, екран і пристрій — у окремий список для розбору зауважень.

Ключові правила


- Загальний стан звіту** — найгірша з трьох оцінок (терміни, бюджет, ресурси): хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений. Стан проекту — за останнім звітом.
- Ключові показники** (статус, стан, тип, %, дати, витрати) змінюються лише статус-звітом; зміна статусу, типу чи дат вимагає причини.
- «Завершено»** у звіті → проект у «Архів», лише перегляд.
- Оцінка ризику** = ймовірність × вплив (1–25): 15–25 високий, 8–14 середній, 1–7 низький.
- Свіжість звіту**: до 8 днів — зелений, 8–14 — жовтий, понад 14 — червоний.
- Історія**: кожна зміна — «було → стало», хто, коли і чому.

Головна

Стан портфеля за видимими користувачу проектами: кільце за станом, динаміка за 12 тижнів (зріз кожні два тижні), далі — проблемні проекти, проекти без свіжого звіту, запити на рішення керівництва й відкриті ризики.

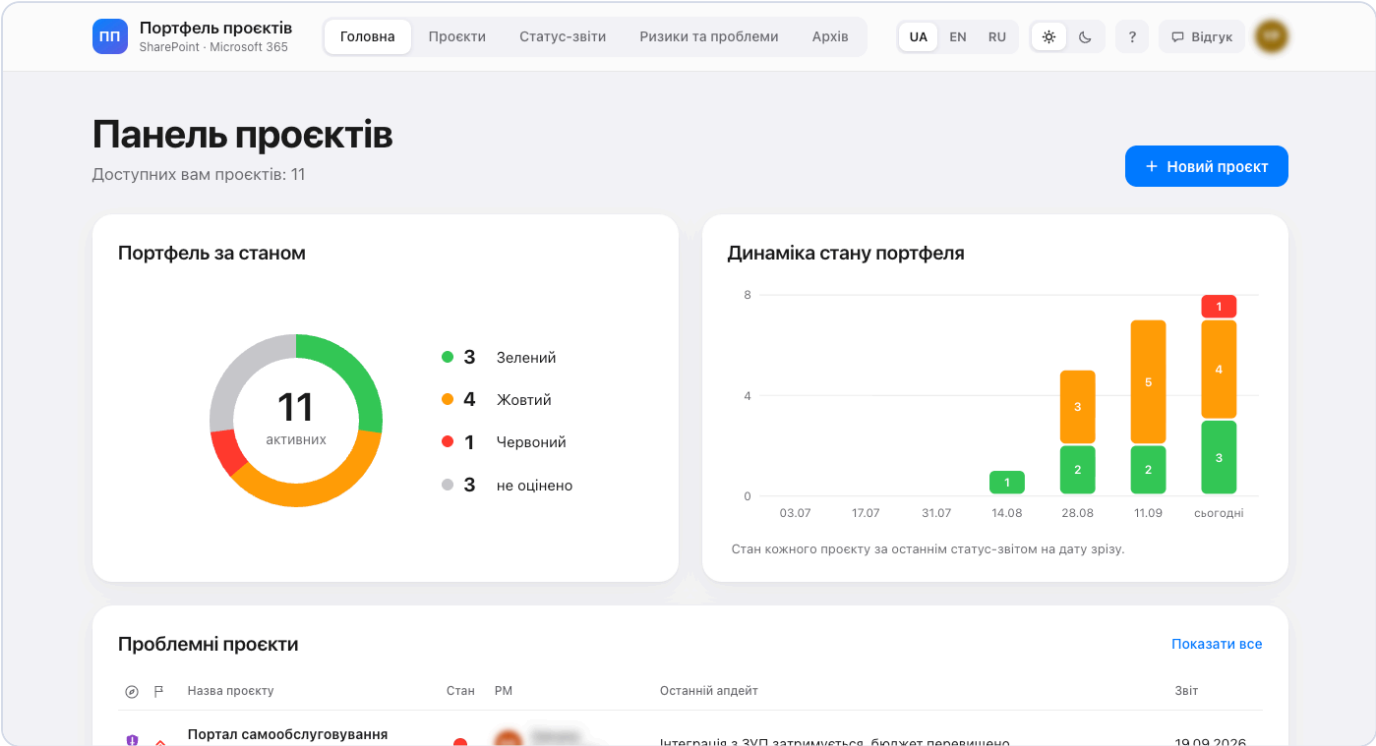

Портфель за станом і динаміка стану.

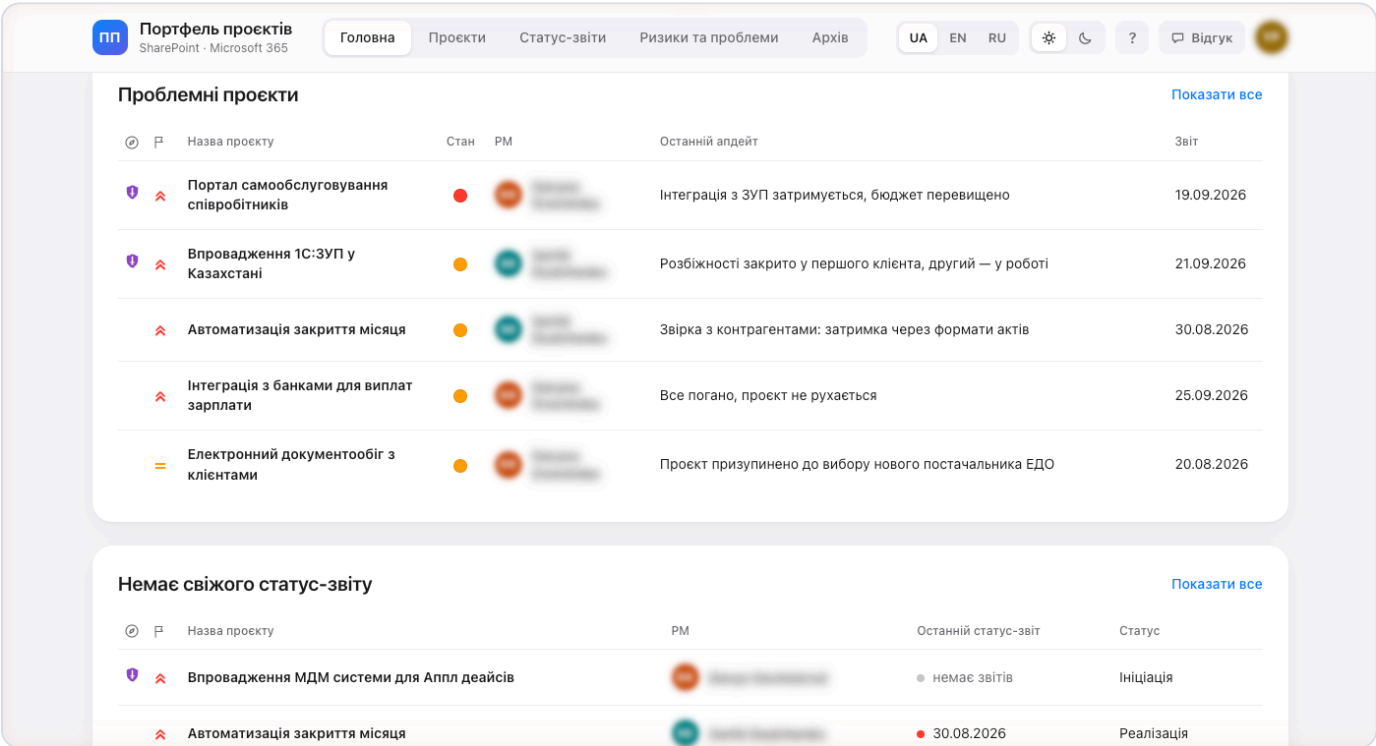

Блоки, що потребують уваги: «Проблемні проекти», «Немає свіжого статус-звіту». «Показати все» відкриває повний список.

Проекти

Плитки для швидкого огляду або таблиця з сортуванням, фільтрами за значеннями й вибором колонок. Подання: Усі проекти, Стратегічні, Проблемні, Мої проекти, Немає свіжого звіту. Нові записи — угорі.

Портфель проектів
SharePoint - Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхів

UAENRU

Відгук

Проекти

Доступних вам проектів: 11

+ Новий проект

СписокПлитки

ПоданняУсі проекти

PRJ-002

не оцінено

Впровадження МДМ системи для Аппл дейсів

Ініціація0%

Останній апдейт · немає звітів

PRJ-001

не оцінено

Перевірка форми нового проекту

Ініціація0%

Останній апдейт · немає звітів

TEST-07

не оцінено

Навчальна платформа для нових співробітників

Ініціація0%

Останній апдейт · немає звітів

TEST-04

Зелений

CRM для відділу продажів

Планування10%

Останній апдейт · немає звітів

TEST-09

Зелений

Звітність для клієнтів у Power BI

Реалізація70%

Останній апдейт · немає звітів

TEST-10

Жовтий

Інтеграція з банками для виплат зарплати

Реалізація48%

Останній апдейт · немає звітів

Плитки: код, стан, статус і % виконання, останній апдейт зі світлофором свіжості, РМ.

Портфель проектів
SharePoint - Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхів

UAENRU

Відгук

Проекти

Доступних вам проектів: 11

+ Новий проект

СписокПлитки

ПоданняУсі проекти

Показано 11 з 11

	Назва проекту	РМ	Статус	Стан	Звіт	% виконання	Завершення (план)	Останній апдейт
🔔	Впровадження МДМ системи для Аппл дейсів	🔴	Ініціація	●	немає звітів	0%	30.11.2026	—
⚖	Перевірка форми нового проекту	🟡	Ініціація	●	немає звітів	0%	—	—
⬇	Навчальна платформа для нових співробітників	🔴	Ініціація	●	немає звітів	0%	21.02.2027	—
🔔	CRM для відділу продажів	🟡	Планування	●	24.09.2026	10%	14.05.2027	Обрано CRM, запуск зсувається на травень
🔔	Звітність для клієнтів у Power BI	🟢	Реалізація	●	20.09.2026	70%	23.11.2026	Готова панель плинності кадрів

Таблиця: воронка — фільтр, шестерня — колонки, клік по заголовку — сортування.

Картка проекту

Усе про проєкт в одній панелі: учасники, терміни з відхиленням прогнозу, бюджет і виконання, історія змін, коментарі, історія станів, статус-звіти, ризики та «Доступ до картки». Посиланням на картку можна поділитися.

TEST-01 · список «Проекти»

Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані

Стратегічний Жовтий Реалізація 1 — Високий

Додати статус-звіт Редагувати

Перехід розрахунку зарплати казахстанських клієнтів на 1С:ЗУП КОРП: міграція даних, налаштування розрахунку, навчання розрахунковців.

Учасники

Власник Project Manager

Стейкхолдери

Терміни

Дата старту02.03.2026

Дата запуску (продакшн)16.11.2026

Дата завершення (план)18.12.2026

Прогноз завершення29.01.2027 +42 дн.

Бюджет і виконання

Бюджет і виконання

% виконання55%

Останній статус-звіт21.09.2026

Бюджет (план)

Витрати (факт)

НапрямокРозрахунок зарплати

Історія змін

21.09.2026 15:00

Оновлено статус-звітом

% виконання48% → 55%

Розбіжності закрито у першого клієнта, другий — у роботі

08.09.2026 15:00

Оновлено статус-звітом

% виконання40% → 48%

Прогноз завершення→ 29.01.2027

Розбіжності паралельного розрахунку потребують доопрацювання формул. · Пілотний паралельний розрахунок: розбіжності у 2 з 3 клієнтів

25.08.2026 15:00

Оновлено статус-звітом

Статус проєктуПланування → Реалізація

% виконання0% → 40%

Завершено міграцію довідників і кадрових даних

Шапка картки: тип, стан, статус, пріоритет; для РМ — «Додати статус-звіт» і «Редагувати».

Бюджет і виконання та історія змін: хто, коли, що змінив і причина.

Історія станів

	25.08	08.09	21.09
Загальний стан	Жовтий	Жовтий	Жовтий
Терміни	Зелений	Жовтий	Жовтий
Бюджет	Зелений	Зелений	Зелений
Ресурси	Жовтий	Жовтий	Зелений
% виконання	40	48	55

Статус-звіти (3)

21.09.2026 Жовтий

Розбіжності закрито у першого клієнта, другий — у роботі

Зроблено: Виправлено формули утримань; перший клієнт звірений без розбіжностей. Підключено другого консультанта.

План: Звірити другого клієнта, почати навчання розрахунковців.

Проблеми: Прогноз завершення — кінець січня.

08.09.2026 Жовтий

Пілотний паралельний розрахунок: розбіжності у 2 з 3 клієнтів

Зроблено: Проведено паралельний розрахунок для трьох клієнтів; у двох розбіжності в утриманнях.

План: Виправити формули утримань, повторити розрахунок.

Проблеми: Зсув запуску на 6 тижнів, якщо розбіжності не закриємо до кінця місяця.

25.08.2026 Жовтий

25.08.2026 Жовтий

Завершено міграцію довідників і кадрових даних

Зроблено: Перенесено довідники та кадрові дані 12 клієнтів. Налаштовано базові види нарахувань.

План: Паралельний розрахунок за вересень для трьох пілотних клієнтів.

Проблеми: Не вистачає одного консультанта з розрахунку.

Ризики та проблеми (2) + Додати ризик

12 Розбіжності розрахунку в пілотних клієнтах не буде закрито вчасно Ризик · В роботі

6 Звільнення ключового розрахунковця клієнта під час запуску Ризик · Відкрито

Доступ до картки

Права задаються автоматично за учасниками проєкту та їхніми керівниками з Entra ID. Змінювати проєкт може лише РМ, решта — перегляд і коментарі.

РМ

редагування

перегляд і коментарі

СІО

перегляд і коментарі

Власник

перегляд і коментарі

Стейкхолдери

перегляд і коментарі

Група «РМО — адміністратори»

перегляд усіх проєктів, нові проєкти

Історія станів за останніми звітами та самі статус-звіти.

«Доступ до картки»: РМ — редагування, керівники, власник і стейкхолдери — перегляд і коментарі.

Статус-звіт

РМ оцінює терміни, бюджет і ресурси — загальний стан рахується сам. Ключові показники вже заповнені поточними значеннями; змінюється лише те, що змінилося. Якщо змінено статус, тип або дату, з'являється обов'язкова «Причина зміни показників».

список «Статус-звіти»

Новий статус-звіт

Проект *
Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані

Дата звіту *
25.09.2026

Період
2 тижні

Терміни *
Зелений Жовтий Червоний

Бюджет *
Зелений Жовтий Червоний

Ресурси *
Зелений Жовтий Червоний

Загальний стан (розраховується) ● не оцінено
Найгірша з оцінок: хоча б одна червона → червоний; хоча б одна жовта → жовтий; усі зелені → зелений.

Ключові показники
Змінюються лише через статус-звіт. Кожна зміна потрапляє в історію.
Статус проекту
Реалізація
% виконання
55
Тип проекту
Стратегічний Звичайний
Дата старту
02.03.2026
Дата запуску (продакшн)
16.11.2026
Дата завершення (план)
29.01.2027
Прогноз завершення
29.01.2027
Причина зміни показників *
Наприклад: перенесення запуску через затримку інтеграції з 1С
Резюме одним рядком *
Наприклад: етап інтеграції завершено, відставань немає
Зроблено за період

Оцінки й розрахунок загального стану.

Ключові показники
Змінюються лише через статус-звіт. Кожна зміна потрапляє в історію.
Статус проекту
Реалізація
% виконання
55
Тип проекту
Стратегічний Звичайний
Дата старту
02.03.2026
Дата запуску (продакшн)
16.11.2026
Дата завершення (план)
29.01.2027
Прогноз завершення
29.01.2027
Причина зміни показників *
Наприклад: перенесення запуску через затримку інтеграції з 1С
Резюме одним рядком *
Наприклад: етап інтеграції завершено, відставань немає
Зроблено за період

Ключові показники: змінено дату — потрібна причина.

Що відбувається після збереження

- Одразу:** картка проекту на екрані показує новий стан, % виконання, дати й «Останній апдейт»; звіт з'являється у списку статус-звітів.
- Протягом 15 хвилин** синхронізація переносить ключові показники у список «Проекти» і записує в журнал кожну зміну: було → стало, автор, причина.
- Запит на рішення** (позначка «Потрібне рішення керівництва») — одразу в блоці на головній і в поданні «Потребують рішення».
- «Завершено»** — проект отримує статус «Архівний» і дату архівації, зникає з робочих списків і стає лише для перегляду.

Звіт може здати лише РМ проекту. Звіт від іншої людини синхронізація не застосує — це захист від випадкових змін у чужих проектах.

Ризики та проблеми

Реєстр ризиків і проблем усіх видимих проєктів з оцінкою, власником, статусом і терміном. Форма ризику рахує оцінку одразу й пояснює кожен бал шкали.

Портфель проєктів
SharePoint - Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхів

UAENRU

Відгук

Ризики та проблеми

Новий ризик

ПоданняУсі елементи

Показано 13 з 13

Проект	Ризик / проблема	Тип	Оцінка	Власник ризику	Статус	Термін
Впровадження МДМ системи для Аппл дейсів		Ризик	20		Відкрито	07.10.2026
Перевірка форми нового проєкту	Перевірка форми ризику	Ризик	20		Відкрито	
Інтеграція з банками для виплат зарплати	Зміна формату API банком без попередження	Ризик	8		Відкрито	08.11.2026
Інтеграція з банками для виплат зарплати	Другий банк не надає тестовий доступ до API	Проблема	20		Відкрито	29.09.2026
Звітність для клієнтів у Power BI	Клієнти побачать чужі дані через помилку RLS	Ризик	5		Відкрито	14.10.2026
Електронний документообіг з клієнтами	Постачальник ЕДО припиняє роботу	Проблема	25		Відкрито	24.10.2026
Автоматизація закриття місяця	Контрагенти надсилають акти	Проблема	8		В роботі	09.10.2026

Реєстр ризиків: оцінка кольором, власник, статус, термін.

список «Ризики та проблеми»

Новий ризик

Проект *

Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані

Ризик / проблема *

Затримка постачання ліцензій

Тип

РизикПроблема

Ймовірність

12345

4 — ймовірно (60–90%)

Вплив

12345

5 — критичний: зрив цілей проєкту

Оцінка 20 Високий (15+) = 4 × 5

Оцінка = ймовірність × вплив, кожне від 1 до 5. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Власник ризику

Статус

Відкрито

Новий ризик: ймовірність 4 × вплив 5 = 20, «Високий».

Як рахується оцінка

Ймовірність і вплив — від 1 до 5, кожен бал має опис (наприклад, 4 — «ймовірно, 60–90%», 5 — «критичний: зрив цілей проєкту»).

Оцінка = ймовірність × вплив. 15–25 — високий (червоний), 8–14 — середній (жовтий), 1–7 — низький (зелений).

Прострочений термін відкритого ризику виділяється червоним; закриті ризики зникають з подання «Відкриті».

Статус-звіти й архів

Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхів

UAENRU⚙️🌙?🗨 Відгук

Статус-звіти

+ Новий статус-звіт

ПоданняУсі звіти⚙️

Показано 20 з 20

🔍 ⌵ ⌵ ⌵	Проект ⌵	Дата звіту	Стан ⌵	Терміни ⌵	Бюджет ⌵	Ресурси ⌵	Резюме одним рядком	Автор ⌵	Потрібне рішення ⌵
⬆️	Інтеграція з банками для виплат зарплати	25.09.2026	🟡	🟡	🟡	🟡	Все погано, проєкт не рухається	👤	Так
⬆️	CRM для відділу продажів	24.09.2026	🟢	🟢	🟢	🟢	Обрано CRM, запуск зсувається на травень	👤	—
⬆️	Інтеграція з банками для виплат зарплати	23.09.2026	🔴	🔴	🟢	🟡	Другий банк не надає тестовий доступ, запуск під загрозою	👤	Так
⬆️	Міграція пошти та файлів у Microsoft 365	22.09.2026	🟢	🟢	🟢	🟢	Почато перенесення файлових серверів	👤	—
⬆️	Впровадження 1С:ЗУП у Казахстані	21.09.2026	🟡	🟡	🟢	🟢	Розбіжності закрито у першого клієнта, другий — у роботі	👤	—
⬆️	Звітність для клієнтів у Power BI	20.09.2026	🟢	🟢	🟢	🟢	Готова панель плинності кадрів	👤	—

Усі статус-звіти: оцінки, резюме, автор, «Потрібне рішення» (текст рішення — у підказці). Окреме подання — «Потребують рішення».

Портфель проєктів
SharePoint · Microsoft 365

ГоловнаПроектиСтатус-звітиРизики та проблемиАрхів

UAENRU⚙️🌙?🗨 Відгук

Архів

Завершені проєкти. Лише перегляд. · 1

Показано 1 з 1

⚙️

🔍 ⌵ ⌵ ⌵	Назва проєкту	PM ⌵	Власник ⌵	Дата архівації	Завершення (план)	Бюджет	Факт
⬆️	Оновлення мережевої інфраструктури офісу	👤	👤	28.08.2026	25.08.2026	👤	👤

Архів: завершені проєкти з датою архівації, лише перегляд.

Новий проект, довідка і відгуки

список «Проекти»

Новий проект

Основне

Назва проекту *

Код проекту

Напрям

Посилання на картку в Loop

Тип проекту

Учасники

РМ *

Власник

Стейкхолдери

Новий проект (PMO): назва й РМ обов'язкові, код призначається сам (PRJ-###).

список «Відгуки»

Відгук про портал

Що не так або що покращити? Опишіть, що ви робили і що очікували побачити. Екран, з якого ви відкрили відгук, і пристрій додаються самі.

Що не так або що покращити? *

Крок 2.4: після фільтра «Червоний» хотілося б бачити кількість проектів у заголовку.

Скриншоти (0/5)

Додати скриншот

Скриншот можна вставити з буфера: Ctrl+V (Windows) або Cmd+V (Mac).

Екран: #projects/all

Надіслати

Скасувати

«Відгук»: зауваження зі скриншотами (вставка з буфера або з галереї телефона); екран і пристрій додаються самі.

Портфель проектів

Довідка

Що це

Портал, де компанія веде всі проекти в одному місці:

у кожного проекту є **картка**: учасники, терміни, бюджет, стан, історія змін, коментарі, статус-звіти й ризики;

РМ регулярно здає **статус-звіт** — лише через нього змінюються ключові показники проекту (статус, стан, % виконання, дати, витрати);

ризики та проблеми проекту оцінюються як «ймовірність x вплив»;

головна показує стан портфеля: скільки проектів у якому стані, динаміку, проблемні проекти й запити на рішення.

Кожен бачить лише ті проекти, де він сам або його підлеглі мають роль.

Як відкрити

Комп'ютер: відкрийте в браузері <https://smarthrua.sharepoint.com/sites/pm-o-test> і увійдіть робочим обліковим записом Microsoft 365.

Телефон і планшет (iPhone, iPad, Android): та сама адреса в Safari або Chrome. Щоб відкривати, як застосунок: у Safari — «Поділитися» → «На екран „Додому“», у Chrome — меню : → «Додати на головний екран».

Застосунок SharePoint на телефоні може показувати портал не повністю — тоді відкривайте в браузері.

Ця інструкція завжди під кнопкою ? угорі portalу.

Хто що бачить і що може

Хто

Бачить

РМ проекту

свій проект

«Довідка» — інструкція в самому порталі, кнопка «?» , три мови.


Зворотний зв'язок під час тестування

Кожен учасник залишає відгук прямо з того екрана, де помітив проблему. До 5 скриншотів; на комп'ютері — вставка з буфера (Ctrl+V / Cmd+V).


Усі відгуки збираються в один список: РМО бачить відгуки всіх учасників, ставить статус розгляду й відповідь, вивантажує в Excel.

Телефон і планшет


Портал відкривається в браузері телефона й планшета без окремого застосунку: сторінки підлаштовуються під ширину, картка й форми — на весь екран, кнопка «Зберегти» завжди видна.

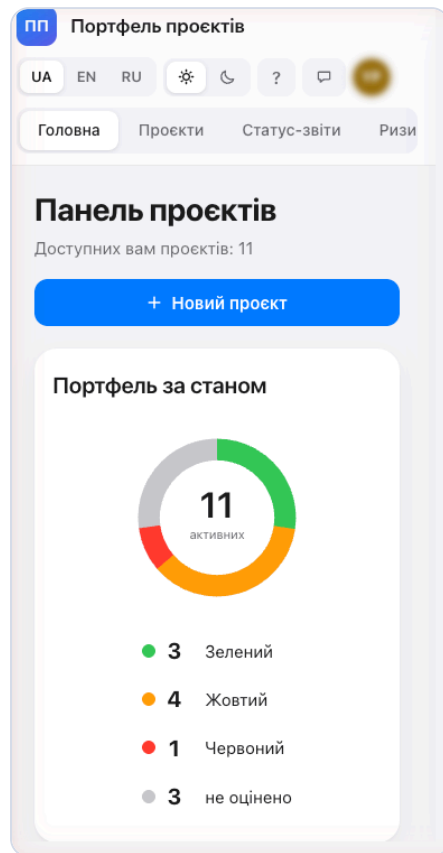

Головна.

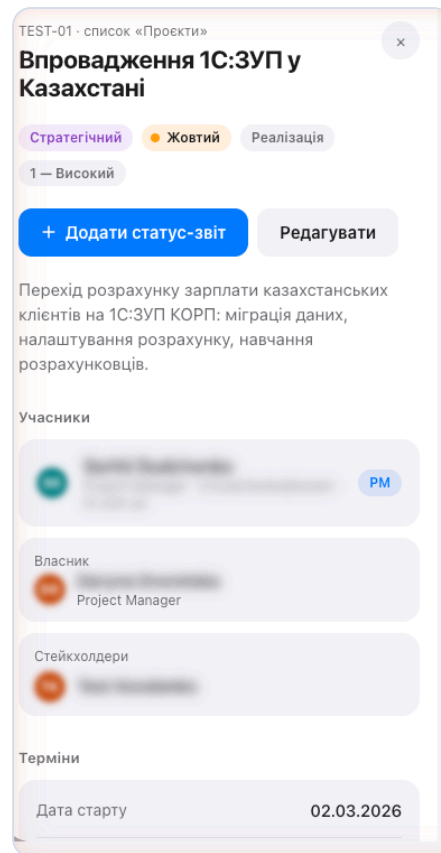

Картка проекту.

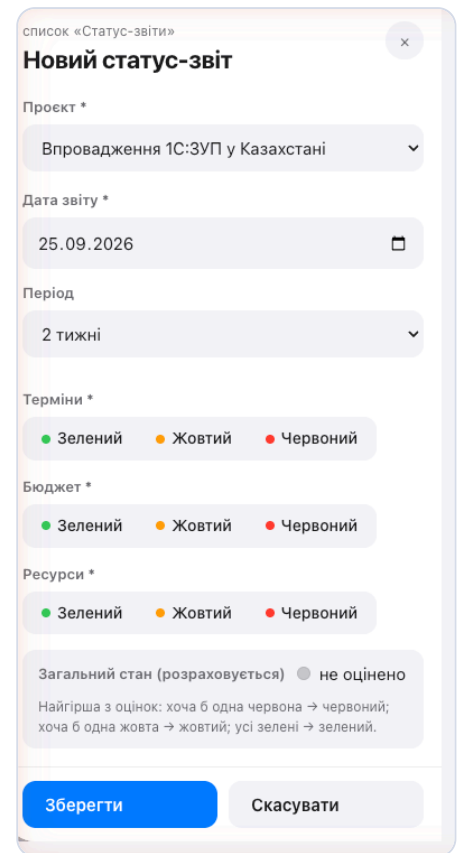

Статус-звіт.

Безпека та дані

- Дані — лише в SharePoint Online компанії; зовнішніх баз і сервісів немає.
- Застосунок працює від імені користувача: кожен бачить лише те, до чого має доступ.
- Права на кожен проект і його записи видає синхронізація за оргструктурою; змінювати може лише РМ, архів — лише перегляд.
- Синхронізація має доступ тільки до сайту порталу (Sites.Selected) і читає оргструктуру з Microsoft Entra ID.

Стан і наступні кроки

Етап	Стан
Списки, права, синхронізація	готово, тестовий сайт
Застосунок: головна, проекти, картка, форми, телефон	готово, тестовий сайт
Тестування з фокус-групою (PM, PMO)	триває
Синхронізація в хмарі (Azure Automation)	очікує підписку Azure
Microsoft Teams, запуск на всю компанію	після розбору відгуків

Документи

Документ	Для кого
Інструкція користувача (UA / EN / RU) — також «Довідка» в порталі	усі користувачі
Плани тестування — PM і PMO	учасники фокус-групи
Технічне завдання	PMO, IT
Розгортання й адміністрування	IT, адміністратори SharePoint

Усі документи ведуться в репозиторії проекту разом із кодом, тож оновлюються разом зі змінами системи.
